

민선8기 공약실천계획서

- 2024. 3. 31. 기준 -



도 봉 구

민선 8기 공약사업 목록

목표 1. 활력 넘치는 상생경제도시

1	공공시설 유휴공간 등을 활용한 창업 보육공간 및 테스트베드 구축	3
2	사전교육을 통한 경쟁력 있는 창업 지원(오픈주방, 마케팅 등)	5
3	(제조업) 스마트혁신지원단, 소상공인 매니저를 통한 애로사항 해결	7
4	씨드큐브 창동 조성	10
5	서울아레나 복합문화시설 건립	12
6	창동 복합환승센터 조성	14
7	도봉 청년 해외인턴십 지원사업	16
8	도봉구 공공기관 실무형 청년인턴십 운영	18
9	도봉구 기업 실무형 청년인턴십 운영	20
10	점심 및 저녁시간 주차 단속 유예	22

목표 2. 안전하고 건강한 행복도시

11	생애 전주기 자립 지원에 기반한 맞춤형 복지 지원	24
12	서울형 모아어린이집 확대	26
13	서울형 키즈카페 확대 조성	28
14	WHO 고령친화도시 사업 추진	31
15	여성 및 청소년을 위한 안심귀가 환경 조성	34
16	동북권 시민안전체험관 조성	37
17	신혼부부 및 청년 공공임대주택 확대	40
18	언덕길 열선 및 보행환경 개선	42
19	도봉산 둘레길 2.0 추진	46
20	무수골 생태치유 및 명상의 숲 조성	49
21	반려견 놀이터 확대	51

목표 3. 교통이 편리한 균형발전도시

22	재건축·재개발 등 활성화 적극 지원	53
23	고도지구 완화를 통한 지역균형 발전 도모	60
24	새로운 도시환경변화를 고려한 용도지역 상향 추진	63
25	화학부대 이전부지 활용방안 마련	66

26	성대야구장 주상복합단지 개발	68
27	GTX-C 도봉구 전구간 지하화 추진	70
28	1호선 지하화 및 지상부지 활용방안 마련	73
29	우이-방학선 연장 조기 착공 및 추진	75
32	방학역 환경개선 추진	78
33	녹천역 에스컬레이터 설치	80
34	창동역, 쌍문역, 도봉산역 대중교통체계 개편	82
35	출퇴근 전용버스 도입	84
36	지능형 교통체계 구축(보행자 중심 교통체계 실현)	86
37	자전거(따릉이)로 지하철역 연계 체계 구축	89
38	주차혼잡지역 공영주차장 확충	91
39	동부간선도로 진·출입로 개선	100

목표 4. 질 높은 교육문화도시

40	유치원 및 학교 환경개선사업 지원 확대	104
41	국립공원 도봉산 주차시설 확충	106
42	도봉산 관광활성화를 위한 중장기 발전계획 수립	110
43	도봉산 맑은 이미지를 활용한 수제 양조장(craft brewery) 추진	112
44	구민이 체감하고 즐길 수 있는 문화도시 구현	114
45	지역문화예술인 지원 확대	116
46	지역예술인이 참여하는 도시재생사업	118
47	다목적 체육시설 확충	120
48	청소년 복합 체육관 신설 추진	122
49	도봉구체육회 종목별 지원 확대	124

목표 5. 투명하고 혁신적인 청렴행정도시

50	체계적이고 지속적인 청소년 정책을 위한 청소년지원센터 설립	126
51	재건축·재개발 지원을 위한 전담부서 신설	129
52	청년정책 전담부서 신설	131
53	구 산하기관 유사기능 통폐합	133

1

공공시설 유휴공간 등을 활용한 창업 보육공간 및 테스트베드 구축

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●	●			●			●
주관부서	지역경제과장 김선주 ☎2091-2860 지역경제팀장 김미화 ☎2891 담당 정현정 ☎2897													

■ 현황

- 도봉구 중소기업창업보육센터 운영(1999. ~)
 - 제1창업보육센터: 마들로13길 61 씨드큐브 창동 5층, 8개실
 - 제2창업보육센터: 노해로63길 43 도봉구 행정지원센터 5층, 10개실

■ 사업목표

- 창업 보육효과 확대 및 창업 활성화
 - 새로운 창업 보육공간의 조성으로 쾌적하고 효율적인 업무 환경 제공
 - 창업단계별 전문 멘토링, 맞춤형 컨설팅 등 다양한 창업 지원을 통한 창업 성공률 제고

■ 사업개요

- 사업기간: 2023.~
- 사업대상: 예비 및 초기 창업자
- 사업내용: 창업 보육공간 확충 및 창업단계별 전문 멘토링, 맞춤형 컨설팅 지원
 - 제1창업보육센터: 신산업 창업분야 기업 우선 선정
[신산업 창업 분야에 관한 규정(중소벤처기업부고시제2022-45호)]
 - 제2창업보육센터: 업종 제한 없이 입주기업 선정
 - 지원내용
 - 시세 대비 저렴한 임대료의 창업 사무실 및 각종 요금, 시설유지관리 지원
 - 창업교육 지원: 창업단계별 전문 멘토링(기술 경영지도) 및 애로사항 상담·진단 등 맞춤형 컨설팅(재무, 회계, 세무, 법률, 마케팅)
- 총사업비: 193백만원 ※ 2024년 예산
 - 사용료(임대료·관리비): 175백만원
 - 창업교육 개최: 3백만원 / 시설 및 입주자 관리 등: 15백만원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
· 타지역 창업지원센터 현장 조사																
· 씨드큐브 창동 사용 관련 협의																
· 창업 멘토링 인력풀 조성(유관기관 협의)																
· 씨드큐브창동 내 창업보육센터 조성																
· 입주기업 모집 및 선발																
· 창업보육센터 운영																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,932	-	1,932	39	1,300	193	200	200	-
구비	1,932	-	1,932	39	1,300	193	200	200	-

※ 2024.~: 보증금 및 인테리어 비용 제외

※ 2023. SH공사 측 기본 인테리어 제공으로 소요예산 절감 (시설비 불용률 93%)

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
창업보육센터 입주율	%	목표	100	100	100	100	100	100	100
		실적	100	100	100	100			

■ 추진실적

- 2022. 8.: 씨드큐브 창동 업무시설(오피스) 임차의향서 제출(SH)
- 2022. 10. ~ 2023. 6.: 씨드큐브 창동 업무시설 사용 및 계약 관련 협의
- 2023. 8.: SH공사-도봉구 간 임대차계약 체결
- 2023. 12.: 씨드큐브 창동 내 신규 창업보육센터 조성
- 2024. 1. ~ 2.: 창업기업 모집 · 선발 및 입주

■ 향후 계획

- 임대료 부과 및 입주 · 졸업 · 연장 처리 등 입주자 관리
- 공실 발생 시 수시 신규 입주자 모집
- 창업 교육 개최 (7. 4. ~ 5.)

2

사전교육을 통한 경쟁력 있는 창업 지원 (오픈주방, 마케팅 등)

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●	●			●			●
주관부서	지역경제과장 김선주 ☎2091-2860 지역경제팀장 김미화 ☎2891 담당 이소이 ☎2895													

■ 현황

- 소상공인 창업교육 실시
 - 연 1~2회 서울신용보증재단과 공동주최
 - 2023. 7. 18. ~ 7. 19. 창업교육 실시(38명 수료)
- 동주민센터, 마을 커뮤니티 공간, 덕성여대 등 관내 공유부엌 운영
 - 동주민센터 공유부엌 현황: 8개(방1, 방2, 방3, 쌍1, 창1, 창5, 도봉1, 도봉2)
 - 마을 커뮤니티 공간 공유부엌 현황: 1개[꿈빛는 마을 방아골(방2)]
 - 덕성여대 캠퍼스타운 - 서울시50플러스 북부캠퍼스 지하 1층, 모두의 부엌

■ 사업목표

- 실습 위주의 요식업 전문 창업교육 지원을 통한 창업 경쟁력 강화
 - 실전 레시피 개발 중심의 실습과정과 창업 기본 이론과정을 동시에 진행하여 효과적이고 전문적인 요식업 창업교육 지원
 - 관내 공유부엌을 교육생 대상 개별 훈련 공간으로 제공하여 교육 효과 확대

■ 사업개요

- 사업기간: 2023.~
- 사업대상: 요식업 예비 창업자
- 사업내용: 요식업 예비 창업자 대상 요식업 창업 교육 및 훈련 공간 지원
 - 운영계획
 - 서울시50플러스 북부캠퍼스 상·하반기 요식업 창업교육 프로그램 진행
 - 도봉역 하부 ‘달그락’, 방학1동주민센터 공유부엌: 교육생 대상 개별 훈련 공간으로 제공
 - 체계적이고 효과적인 진행을 위해 멘토링은 소규모(10명 내외)로 실시
 - 요식업 창업 인큐베이팅 랩 모집 시 상권혁신교육 수료생 가점 부여
- 총사업비: 46백만원(연간)
 - 프로그램 운영비: 40백만원 / 홍보비, 집기류 구입비 등: 6백만원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
· 관내 공유부엌 현장조사																
· 도봉구-서울시50플러스 북부캠퍼스 간 업무협약 체결 및 용역업체 선정																
· 요식업 창업지원 추진계획 수립 및 홍보																
· 요식업 창업교육 프로그램 운영																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉡+㉢	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉢	
			소계 ㉡	2022	2023	2024	2025		2026
계	196.7	-	196.7	2.7	46	46	50	52	-
구비	196.7	-	196.7	2.7	46	46	50	52	-

※ 2022년 예산: 소상공인 창업교육 교재·홍보비

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
요식업 창업교육 프로그램 운영 횟수	회	목표	14	-	2	4	4	4	14.3
		실적	2	-	2				

■ 추진실적

- 2022. 10.~: 도봉구-서울시50플러스재단 간 업무 협의 진행
 - 장소 이용 협조 및 교육 대상, 교육내용 등 운영 방법 협의
- 2023. 2. : 사업계획 수립 및 도봉구-서울시50플러스재단 간 업무협약 체결
- 2023. 3. : 상권혁신교육 제1기 교육생 모집(22명 접수) 및 선발(10명)
- 2023. 6. : 상권혁신교육 제1기 품평회 및 수료식 개최(10명 수료)
- 2023. 8.
 - 도봉구-서울신용보증재단 간 업무협약 체결
 - 상권혁신교육 제2기 교육생 모집(13명 접수) 및 선발(10명)
- 2023. 9.~11.: 하반기 상권혁신교육(2기) 운영(9명 수료)
- 2024. 2.~ : 2024 사업 운영계획 수립

■ 향후 계획

- 2024년 교육 시작: 2024. 5월

3

(제조업) 스마트혁신지원단, 소상공인 매니저를 통한 애로사항 해결

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●		●		●			●
주관부서	지역경제과장 김선주 ☎2091-2860 지역경제팀장 김미화 ☎2891 담당 현명혜 ☎2894													

■ 현황

- 코로나19 상황과 고금리, 고물가, 인건비, 임대료 상승 등으로 고정비가 증가하여 중소기업·소상공인 경영난을 겪는 등 경제활동에 많은 애로사항 발생

■ 사업목표

- 현장 애로사항 파악 및 해결을 통해 중소기업·소상공인의 경영문제를 해결하고 자생력을 강화하여 실질적인 경영활동 지원

■ 사업개요

- 소상공인·중소기업을 위한 스마트혁신지원단 지원 및 운영
 - 사업기간: 2022년 ~ [※ 시범운영(1단계)·확대운영(2단계) 단계적 운영]
 - 구 성: 경영지도사, 노무사, 세무사 등 전문가 총 18명
(온라인 홍보, 매장연출, 메뉴개발, 세무회계, 노무, 신용관리, 사업정리)
 - 사업내용
 - 1) 기술 보급 및 경영활동에 대한 중소기업·소상공인 맞춤형 컨설팅 지원
 - 2) 경영애로해소위원회 등을 통해 중소기업의 건의사항 및 애로사항을 확인 후 스마트혁신지원단과 연계하여 분야별 전문가를 매칭하여 현장 애로사항 해결
 - 세부 추진 사항
 - 1) 스마트혁신지원단 시범운영(1단계)
 - 사업기간: 2022년 ~ 2023년 6월
 - 운영계획
 - 가. 도봉구-서울신용보증재단 MOU 체결2022. 12. 16.
 - 나. 인력풀(전문 컨설턴트) 활용 맞춤 컨설팅 진행.....2023년
 - 운영내용: 유관기관(서울신용보증재단 등)과의 업무협약을 통해 해당기관 인력풀을 활용하여 분야별 컨설팅 진행

- 2) 도봉구 스마트혁신지원단 확대운영(2단계)
- 사업기간: 2023년 8월 ~
 - 운영계획
 - 가. 스마트혁신지원단 위촉·구성: 2023. 8. 14.
 - 나. 컨설팅 개별 신청 접수
 - 다. 예비(자가)진단 및 애로사항 파악
 - 라. 분야별 맞춤형 컨설팅 진행 및 사후관리(※도봉구 및 협약기관 인력풀 병행하여 활용)
 - 운영내용: 유관기관 인력풀을 활용한 시범운영(1단계)을 통해 인적자원 등 데이터를 확보하여 스마트혁신지원단 자체 구축 후 확대운영(2단계) 실시
- 총사업비: 32,000천원(2024년 기준)

○ 소상공인 매니저제도

- 사업기간: 2022년 10월 ~
 - 활동인원: 5명(총괄 1명, 권역별 4명) ※ 2022년 시범운영 1명, 2023년 4명, 2024년 5명
 - 사업내용
 - 1) 매니저 1인이 일정 수 소상공인(점포)을 전담하여 건의사항 수렴 및 해결
 - 2) 각종 소상공인 지원사업의 필요성·적합성 검토 후 지원사업 신청 안내
 - 3) 필요시 세부 분야별 전문가(스마트혁신지원단) 연계하여 전문 컨설팅 지원
 - 세부 추진 사항
 - 1) 운영계획
 - 가. 소상공인 매니저 선발.....2022. 10.
 - 나. 소상공인 매니저제도 시범운영(1개 권역) 및 사업 안내.....2022. 10. ~ 12.
 - 다. 소상공인 매니저제도 확대운영(4개 권역).....2023. ~
 - 2) 운영내용
 - 가. 시범운영: 1개 권역 내 소상공인 점포를 방문하여 애로사항 상담* 진행과 동시에 ‘소상공인 매니저제도’에 대한 홍보 실시
 - 나. 확대운영: 4개 권역(방학동,쌍문동,창동,도봉동)으로 확대하여 권역별 소상공인 점포를 방문 후 애로사항 상담, 총괄매니저 1명
- ※ 애로사항 상담 내용: 소상공인 지원사업 안내, 전문 컨설팅 연계 등
- 총사업비: 91,424천원(2024년 기준)

■ 추진일정

세부 추진사항		2022		2023				2024				2025				2026	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
스마트혁신 지원단	스마트혁신지원단 운영																
	운영계획 수립																
	스마트혁신지원단 전문가 위촉구성																
	분야별 맞춤형컨설팅 및 사후관리																
소상공인 매니저제도	운영계획 수립																
	소상공인 매니저 시범운영																
	소상공인 매니저 확대운영																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	627.5	-	627.5	3.5	151	123	170	180	-
구비	627.5	-	627.5	3.5	151	123	170	180	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
소상공인(점포) 상담 건수	건	목표	1,190	30	200	240	320	400	1,022
		실적	12,173	10	11,876	287			

■ 추진실적

- 2022년 소상공인 매니저 시범 운영 사업 실시.....2022. 10. 31. ~ 12. 16.
- 도봉구-서울신용보증재단 업무협약 체결.....2022. 12. 16.
- 소상공인 경영지원 컨설팅 실시.....2022. 12. 21.
- 시범 운영 사업 성과 평가회 추진.....2022. 12. 22.
- 2023년 소상공인매니저 방문 실적.....2023. 3. ~ 12.

권역	쌍문권역	방학권역	창동권역	도봉권역	총계
업체개소수	2,347	2,721	2,946	2,776	10,790
방문건수	3,244	2,649	2,679	3,304	11,876
방문율(%)	138	97	91	119	110

- 2023년 스마트혁신지원단 자문 실적..... 2023. 8. ~ 12.

총계	온라인 홍보	매장 연출	메뉴 개발	세무 회계	노무	신용 관리	사업 정리
95	45	15	5	9	3	4	14

- 2023년 소상공인매니저·스마트혁신지원단 운영성과평가회 실시(4회)···2023. 4 ~ 12.
- 2024년 소상공인매니저·스마트혁신지원단 제도 운영.....2024. 3. ~ 12.

■ 향후 계획

- 2024년 소상공인매니저·스마트혁신지원단 분기별 운영성과평가회 실시: 2024.4~12.

4

씨드큐브 창동 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
완료	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●		●		●			●		●	
주관부서	청년미래과장 변상숙 ☎2091-3800 청년전략산업팀장 하치권 ☎3821 담당 안성우☎3822													

현황

- '17. 9.: 도시개발구역 지정 및 개발계획 고시
- '18. 11.: 도시개발사업 실시계획인가
- '19. 11.: 창업 및 문화산업단지 착공
- '23. 7.: 씨드큐브 창동 준공
- '23. 10.: '서울창업허브 창동' 입주/졸업 기업 '씨드큐브 창동 오피스' 공간 이전 (3, 6층, 청년미래과-SBA 협업)
- '23.12.: 도봉구 청년취업사관학교 설치·운영[5층, 서울시(청년미래과 유치)]
- '24. 1.: 중소기업창업보육센터 확장 이전(5층, 지역경제과)
- '24. 2.: '서울창업허브 창동' 입주/졸업 기업 '씨드큐브 창동 오피스 공간' 입주자 모집공고 진행(3, 6층, 청년미래과-SBA-SH협업)

사업목표

- 창동 동북권중심지 랜드마크 건축물 건립
- 서울아레나와 연계한 산업거점 및 단지 내 미래산업 창업생태계 조성
- 창동역복합환승센터-씨드큐브 창동-하나로유통센터로 이어지는 산업벨트 선도시설 조성

사업개요

- 사업기간: 2017. 9. ~ 2023. 7.
- 건립개요
 - 위 치: 도봉구 마들로11길 74 (창동역 환승주차장 부지 내)
 - 규 모: 지하7층 ~ 지상49층, 16층(오피스)
 - 연면적: 143,533㎡
 - 건립비: 3,610억원
- 도입기능(안): 청년창업오피스, 청년취업사관학교, 스튜디오 등 지원시설, 문화산업오피스, 문화집객시설, 오피스텔

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
공사 정상진행 및 준공																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	361,000	228,443	132,557	93,110	39,447	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	361,000	228,443	132,557	93,110	39,447	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
씨드큐브 창동 조성 건립공사 진행	진행률 (%)	목표	100	85	100	-	-	-	100
		실적	100	93	100				

■ 향후 계획

- '24. 4.: 도봉구 청년창업센터 설치·운영(4층, 청년미래과)

5

서울아레나 복합문화시설 건립

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진		●		●		●				●	●			●
주관부서	청년미래과장 변상숙 ☎2091-3800 청년전략산업팀장 하치권 ☎3821 담당 정진욱 ☎3825													

■ 현황

- 민간투자방식(BTO)으로 추진되는 ‘창동 동북권역 중심도시’ 조성의 핵심사업
- 아레나 완공 전 산업기반 구축을 위한 창작자 유입과 소비자 육성이 필요

■ 사업목표

- 일자리 확충 및 지역경제 활성화를 위한 초대형 인프라 구축
- 창동을 음악산업의 허브로 육성하기 위한 다양한 지원사업 시행

■ 사업개요

- 서울시 ‘서울아레나 복합문화시설 민간투자사업’
 - 시 행 사: (주)서울아레나
 - 위 치: 도봉구 창동 1-23, 1-24 일대
 - 규 모: 50,149㎡ (연면적 119,097㎡ / 지상 6층, 지하 2층)
 - 주요시설: 아레나 공연장(18.3천석), 중형공연장(2천석), 영화관, 대중음악지원시설
 - 사업기간: ‘23년 ~ ‘27년(건설 40개월), ‘27년 ~ ‘57년(운영 30년)
 - 사업방식: 수익형 민간투자사업(BTO)
 - 총사업비: 3,120억원
- 도봉구 ‘창동 음악산업 육성사업’
 - 목 표: 음악산업 육성을 통한 지역경제 활성화 및 지역 내 청년활동 중심지 조성
 - 추진방법
 - ① 생산기반 확보: 창작 인력 유입 및 지원체계 구축
 - 청년 음악창작 거점시설 운영: 이음, 공음, 오픈창동
 - 송캠프·세미나: 협력창작 및 전문가 노하우 전수 등 음악 생산기지 브랜딩 및 공공성 확보를 위한 도봉구만의 특화프로그램 운영
 - 창작자 네트워킹: 독립창작자 대상 창작음원 홍보·교류 기회 제공

② 유통지원: 창작물 홍보 및 마케팅 지원

- 아티스트 영상 제작: 프로그램 참여자 영상 제작 및 유통지원
- 음악 비즈니스 마켓: 도봉구 특화 음악이벤트 「OPCD DAYS」 개최 시 아티스트와 음악기업간 현장미팅 주선

③ 소비시장 확대

- 지역에서 생산된 콘텐츠가 소개, 소비될 수 있는 대규모 이벤트 추진
- 지역주민의 문화 소비능력 향상을 위한 열린 문화시설 운영 및 전문 음악시설 대관 확대

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
실시설계VE, 안전관리계획 검토 등																
서울아레나 복합문화시설 공사																
창동 음악산업 육성사업 추진																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	364,262	-	364,262	38,087	72,341	108,204	144,832	798	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비 (음악산업 지원)	4,120	-	4,120	928	798	798	798	798	-
기타 (아레나 건립)	360,142	-	360,142	37,159	71,543	107,406	144,034	-	-

※아레나 건립 총투자비: 3,601억원(사업비 3,120억원 / 이자 및 물가변동비 포함)

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
서울아레나 복합문화시설 건립	공정률 (%)	목표	95	0	5	30	30	30	5.3
		실적	5	0	5				

■ 향후 계획

- 2023.~2027.: 서울아레나 복합문화시설 건립공사
- 2022.~2026.: 창동 음악산업 육성 지원

6

창동역 복합환승센터 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
		●	●			●				●	●			●
주관부서	도시활성화추진반 정미라 ☎2091-2930 도시활성화추진팀장 장영주 ☎2931 담당 신다은 ☎2932													

현황

- '21. 6. 17. GTX-C 민간투자사업 우선협상대상자 선정 (현대건설)
 - 현대건설에서는 민간투자사업의 부대사업으로 창동역 복합환승센터 건립을 제안
- '22. 4. ~ 10. 공익감사 청구(도봉구,노원구)에 따른 감사
- '22. 7. 현대 컨소시엄과 국토부간 GTX-C노선 사업 협상 진행중
- '22. 11. 10. 감사결과 통보(총 5건의 위법·부당사항 확인)
- '23. 9. 서울시·국토부 등 유관기관 간「복합환승센터 협의체」 구성·운영 중
- '23. 11. 사업화 기본구상 용역(서울주택도시공사)
- '23. 12. 창동역 복합환승센터 국제설계공모 진행
- '24. 4. 1. 당선작발표((주)디엔비파트너스건축사사무소)

사업목표

- GTX-C노선 사업추진계획에 맞춰 광역교통의 중심지로서 접근성 개선 및 지역 위상 강화를 위한 창동역 복합환승센터 건립 추진
- 창동역 복합환승센터를 환승센터-씨드큐브 창동-하나로유통센터로 이어지는 산업벨트의 한 영역으로 조성

사업개요

- 위 치: 도봉구 창동 1-9 일대 (창동 도시개발구역 2지구)
- 규 모: 12,894㎡(부지면적)
- 도입시설: 환승시설, 환승지원시설, 업무공간, 상업공간, 주거공간
- 사업시행자: 서울도시주택공사 (사업방식: 도시개발사업)
- 사업기간: '24. ~ '28.
 - ※ GTX-C 대합실은 GTX-C 개통일정에 맞추어 개관('28. 하반기 예정)
- 총사업비: 4,406억원(예정)

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
사업추진방안 결정																
세부추진계획 수립																
사업 시행(건립공사)																

■ 소요예산

: 4,406억원(예정)

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
건립공사 공사 착공 및 진행	진행률 (%)	목표	40	-	-	-	20	40	0
		실적	0	-	-				

■ 향후 계획

- '24. 설계용역 진행, 세부추진계획 수립(서울주택도시공사)
- '25. ~ '29. 건립공사 시행

7

도봉 청년 해외인턴십 지원사업

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●		●		●			●
주관부서	청년미래과장 변상숙 ☎2091-3800 청년지원팀장 이남숙 ☎3811 담당 임홍우 ☎3814													

현황

- 저성장시대 돌입에 따른 기업의 공채 축소 등 고용 감소
 - 산업 성장 둔화 추세에 따라 국내 신규일자리 창출 역시 부진한 상황 지속
- 경력직 선호 현상에 따른 청년들의 사회진입 어려움 심화
 - 해외일자리 경험을 통해 전문을 넓히고, 경쟁력 있는 인재로의 도약 지원 필요

사업목표

- 도봉구 청년 대상의 해외인턴십 경력 및 전문을 넓히는 기회 제공
- 인턴경험을 통한 취업역량 강화 및 청년의 사회진입 활성화

사업개요

- 기 간: 2023년 1월 ~ 계속
- 대상 및 인원: 도봉구 청년(19 ~ 45세), 12명
 - ※ 2023년: 5명 / 2024년: 7명(일반선발 6명 + 저소득 대상 우선선발 1명)
- 내 용
 - 해외인턴십 희망 청년 모집 및 선발 (서류, 면접심사)
 - 선발 청년에 대한 기업 연계 및 해외인턴십 실행
 - 출국 및 체류에 필요한 비자발급 및 항공료 등 지원
 - 체류 간 소통 수시 진행
 - 인턴십 참여 청년 대상 간담회 개최
 - 참여 청년들 간 경험 공유를 통해 시너지 효과 도모
 - 사업성과 확인 및 다음 연도 사업 추진 위한 보완점 도출 등
 - 인턴십 참여 청년의 성공 사례집 발간 검토
- 운영방법: 해외 인턴십 연계 및 운영 역량 보유 기관과의 협업 추진
 - 도 봉 구: 사업참여 청년 선발 및 간담회 개최 등 사업총괄
 - 수행기관: 인턴십 채용기업 알선 및 청년 매칭, 인턴십 기간 모니터링 수행 등
- 총사업비: 157,000천원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
타 지자체 유사사업 검토 통한 사업구체화																
해외인턴십 연계를 위한 협업기관 발굴																
도봉 청년 해외인턴십 운영																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	157	-	157	-	28	39	45	45	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	157	-	157	-	28	39	45	45	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
인턴십 수료 청년 수	명	목표	24	-	5	5	7	7	0
		실적	0	-	0	0			

■ 추진실적

- 2023. 1. ~ 3.: 해외인턴십 실행 협업기관 발굴 위한 협의 진행
 - 재외동포재단, 덕성여대 등 역량 보유 기관 접촉 및 관련 논의 진행
- 2023. 4.: 2023년 해외인턴십 운영 계획 수립
- 2023. 5. ~ 6.: 사업 참여자 모집 및 선발 완료
 - (1차) 서류심사: 20명 접수 / 16명 서류 합격
 - ※ 사업설명회 개최(2023. 6. 2.): 사업에 대한 유의사항 등 이해도 증진
 - (2차) 면접심사: 11명 응시 / 5명 최종 선발
- 2023. 6. ~ 8.: 해외인턴십 일자리 매칭 전 참여자 대상 역량강화교육 진행
 - 해외기업과의 면접 매칭 위한 영문이력서 작성 교육 등 실시
- 2023. 11. ~ 12: 참여자 해외인턴십 일자리 매칭 진행 (참여자 3명 매칭 완료)
 - 3명 출국 완료(출국일:11/13, 12/13, 01/02), 2명 연내 출국 예정
 - 매칭 참여자는 근로계약에 따른 근로기간 동안 현지 인턴근무 진행
- 2024. 1. ~ 2.: 『직업안정법』 등 법률검토 및 사전업무협의
- 2024. 3. ~: 2024년도 운영계획 수립 및 사업참여자 모집(7명)
 - 일반선발 6명, 우선선발(저소득) 1명

■ 향후 계획

- 2024. 5. ~ 8.: 참여자 선발 및 역량강화교육, 비자발급 수속 진행
- 2024. 8. ~: 2024년도 사업 참여자 출국 및 해외인턴 근무 시작

8

도봉구 공공기관 실무형 청년인턴십 운영

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●		●		●			●
주관부서	청년미래과장 변상숙 ☎2091-3800 청년지원팀장 이남숙 ☎3811 담당 권용성 ☎3812													

현황

- 산업 성장 둔화 추세에 따라 국내 신규일자리 창출 역시 부진한 상황 지속
- 일자리 문제로 청년의 자립이 지체됨에 따라 다양한 일자리 지원정책 필요

사업목표

- 공직을 준비하는 청년들에게 실무경력을 쌓을 수 있는 기회 제공
- 공공기관 사업 중 일반 취업과 연계되는 사업을 발굴하고 경험 기회를 제공하여 취업역량 강화에 기여

사업개요

- 기 간: 2023년 1월 ~ 계속
- 대상 및 인원: 도봉구 청년(19~45세), 14명
※ 2023년: 5명 6개월 / 2024년: 2명 9개월 + 7명 6개월
- 내 용
 - 공공기관 내 청년 인턴십 직무 발굴
 - 공직이나 일반 취업 준비 시 실무경력으로 인정받을 수 있는 직무 발굴
 - 구청 부서 및 산하기관 대상 수요조사 후 심사를 통해 사업장 선정
 - ※ 단순 행정업무 보조 성격의 사업은 제외
 - 인턴십 참여 청년 모집·채용 및 근무 진행(근무기간: 약 6개월)
 - 인턴십 종료 후 경력증명서 발급, 취업 컨설팅 등 관리
- 총사업비: 171,320천원

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
공공기관 대상 인턴직무 (추가)발굴																
인턴십 참여 청년 모집 및 선발																
도봉구 공공기관 실무형 청년인턴십 운영																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	661	-	661	-	86	171	202	202	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	661	-	661	-	86	171	202	202	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
인턴십 수료 청년 수	명	목표	55	-	5	10	20	20	9
		실적	5	-	5	0	-	-	

■ 추진실적

- 2023. 1.: 사업장 선정 심사 실시 (5개 사업장 선정)
- 2023. 2. ~ 3.: 모집공고 및 서류·면접심사
- 2023. 4. ~ 9.: 청년인턴 사업장 배치 및 근무(5명)
- 2023. 10. ~ 11.: 청년인턴 맞춤형 취업컨설팅 운영 및 수료증 발급
- 2024. 1.: 사업장 모집 및 선정 심사 (11개 사업장 중 8개 선정)
- 2024. 2. ~ 3.: 모집공고 및 서류·면접심사
- 2024. 4. ~ 9.: 청년인턴 사업장 배치 및 근무(9명)

■ 향후 계획

- 2024. 4. ~ 2024. 12.: 인턴 직무배치 및 업무수행
- 2024. 5.: 청년인턴 근무지 현장 점검
- 2024. 6.: 구청장과 함께하는 도봉구 청년인턴 간담회 개최
- 2024. 10.: 취업컨설팅, 수료증 수여 등 관리
- 2024. 11. ~ 12.: 운영성과 분석 및 확대추진 검토

9

도봉구 기업 실무형 청년인턴십 운영

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●		●		●			●

주관부서	청년미래과장 변상숙 ☎2091-3800 청년지원팀장 이남숙 ☎3811 담당 이은원 ☎3813
------	---

■ 현황

- 국내 경제 상황 악화에 따른 민간 기업의 공채 축소 등 고용 감소
 - 산업 성장 둔화 추세에 따라 국내 신규일자리 창출 역시 부진한 상황 지속
- 기업이 경력직 채용을 선호함에 따라 일자리 경험에 대한 청년들의 수요 증가

■ 사업목표

- 청년들에게 인턴십 경험 제공을 통해 취업시장에서의 경쟁력 강화
- 관내 중소기업 등과 연계된 인턴십 운영을 통해 구정 참여 및 기업 일자리 경험 기회 부여

■ 사업개요

- 사업기간: 2023년 1월 ~ 계속
- 대 상: 도봉구 청년 3명
 - 도봉구상공회·서울산업진흥원과 협업을 통해 관내 중소기업·서울창업허브 창동 입주기업 중 신규 채용계획이 있는 기업 발굴
- 사업내용
 - 인턴십 운영이 가능한 기업 발굴: 업무, 기간, 계약금액 등 적정성 평가하여 기업 선정
 - 기업별 청년인턴 배치 및 근무
 - 인턴십 운영 세부방안 수립: 인턴채용 약정 체결(도봉구 ↔ 참여기업 ↔ 청년인턴)
 - 인턴십 수행 중간점검 및 간담회 개최
 - 인턴 종료 후 만족도 조사를 통한 사업평가
- 총사업비: 51,977천원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
인턴십 운영 가능 기업 발굴(관계기관 협의)																
기업 실무형 청년인턴십 운영																
사업평가																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	273	-	273	-	51	52	85	85	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	273	-	273	-	51	52	85	85	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
인턴십 수료 청년 수	명	목표	25	-	3	5	7	10	12
		실적	3	-	3	0			

■ 추진실적

- 2023. 3.: 참여기업 모집 및 선정
- 2023. 4.: 참여기업별 청년인턴 모집 및 선발, 근로계약 등 체결
- 2023. 5. ~ 10.: 청년인턴 배치·운영(2명)
- 2023. 5.: 구청장과 함께하는 도봉구 청년인턴 참여자 간담회 개최
- 2023. 8.: 공약사업 조정 검토 (구발주기업 삭제, 관내기업으로 한정)
- 2023. 9.: 2023년 주민배심원단 심사(공약조정)
- 2023. 9.: 구 발주기업 연계 청년인턴 모집 및 선발, 근로계약 등 체결
- 2023. 9. ~ 12.: 청년인턴 배치·운영(구 발주기업 1개소/1명)
- 2023. 9.: 구청장과 함께하는 도봉구 청년인턴 간담회 개최
- 2023. 11. ~ 12.: 청년인턴 맞춤형 취업컨설팅 운영 및 수료증 발급
- 2024. 1. ~ 2.: 참여기업 수요조사(구청 전 부서, 도봉구상공회, 서울창업허브 창동)
- 2024. 3.: 참여기업 6개소 모집 및 3개소 선정
- 2024. 3.: 참여기업별 인턴 모집 및 선정
- 2024. 4.: 청년인턴 근로계약 체결 및 근무 배치

■ 향후 계획

- 2024. 4. ~ 9.: 인턴 직무배치 및 업무수행
- 2024. 5.: 청년인턴 근무지 현장 점검
- 2024. 6.: 구청장과 함께하는 도봉구 청년인턴 간담회 개최
- 2024. 10.: 취업컨설팅, 수료증 수여 등 관리
- 2024. 11. ~ 12.: 운영성과 분석 및 확대추진 검토

10

점심 및 저녁시간 주차 단속 유예

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●	●				●		●
주관부서	교통지도과장 조미숙 ☎2091-4200 주차단속팀장 이점임 ☎4201 담당 성연철 ☎4248													

■ 현황

○ 단속근무조 운영

- 인력 및 시간: 단속원 23명(주간 4개조, 야간 1개조) / 1년 365일, 24시간 단속체계
- 단속방법: 표지 및 주행형(차량)CCTV 단속

○ 민원다발구역 무인단속 CCTV 운영

- 단속장비: 고정식CCTV 120대
- 단속방법: 단속시작 후 10분 초과시 단속 완료

○ 선택과 집중전략에 따른 불법 주정차 단속 실시

- 집중단속: 절대 주정차 금지구역 및 교통혼잡지역 내 선제적 단속
- 탄력단속: 점심시간대 음식점 주변, 생계형 차량 등 계도 위주 단속

■ 사업목표

- 주정차 단속유예를 확대하여 침체된 지역 상권을 살리고 경제 활성화에 기여하여 활력 넘치는 상생경제도시 도봉 구현

■ 사업개요

○ 음식점 주변 저녁시간 단속유예 추진

- 대 상: 6차선 미만 도로변에 위치한 소규모 음식점 인근
- 유예시간: 18:00 ~ 21:00 (저녁시간대 3시간)
- 주요내용: 무인단속 CCTV(100)대 단속유예 및 계도 위주 단속
※ 점심시간(11:00 ~ 14:30) 단속유예 운영 중

○ 무인단속 CCTV 운영 시간 단축 시행

- 대 상: 무인단속 CCTV 76대
- 주요내용: 무인단속 CCTV 운영시간 단축

현 행	변 경
평일 07:00~22:00 운영	평일 07:00~21:00 운영 (1시간 단축)

※ 관내 불법 주정차 무인단속 CCTV 현황

총계(대)	서울시 (간선)	일반 구역	혼용 구역	어린이 보호구역	비 고
120	9	46	30	35	- 지역여건(음식점 유무)에 따라 도봉구 관할 11대 단속유예 미적용 - 혼용구역=일반+어린이보호구역 일부

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
주정차 단속유예 확대 계획 (완료)																
주정차 단속 유예시간 확대 운영 행정예고																
단속유예 추진 등 관련 홍보																

■ 소요예산 : 비예산

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
저녁시간 주차단속 유예	추진율 (%)	목표	100	100	100	100	100	100	100
		실적	100	100	100				

■ 추진실적

- 2022년도 대비 2023년 단속건수 비교
 - 총단속 건수: 8.9%감소, 무인단속 CCTV 단속건수: 25.2% 감소
- 침체된 상권회복으로 영세 소상공인 등 서민가게 안정지원
- 주민들의 큰 호응으로 체감 행정 구현 실천

■ 향후 계획

- 주정차 단속유예 추진 등 관련 주민 홍보(도봉뉴스, IPTV, DID 등) 실시

11

생애 전주기 자립 지원에 기반한 맞춤형 복지 지원

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
완료	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●		●		●			●

주관부서
 복지정책과장 고금숙 ☎2091-3000 복지자원관리팀장 이유신 ☎3021 담당 이승희 ☎3023

현황

- 공공 · 민간 영역의 다양한 복지 정보를 한 눈에 찾아보고 연계할 수 있는 통합적인 맞춤형 복지자원 시스템 전무
- 수요자의 복지 욕구를 파악할 수 있는 통계나 빅데이터 부족으로 균형있는 복지 자원 공유 시스템 필요

사업목표

- 도봉형 통합복지자원 정보체계를 구축하여 구민의 복지 정보 접근성 강화
- 수요자 중심으로 다양한 복지서비스를 쉽고 정확하게 제공하여 구민의 편의를 도모하고 복지사각지대 해소에 기여
- 복지자원 공유플랫폼 이용자의 연령, 수요별, 동별 등 객관적인 통계자료를 통해 복지자원을 조사 및 매뉴얼화하여 맞춤형 통합복지 정보 지원 체계 구축

사업개요

- 사업 기간: 2022년 ~ 계속
- 사업 내용: 도봉형 통합복지자원 공유 플랫폼 구축
 - 복지 · 보건 · 고용 · 교육 · 보육 등 종합적인 복지정보와 자원을 이용자 입장에서 지원 가능한 복지정보와 소식을 하나로 통합하는 도봉형 통합복지자원 공유플랫폼 구축
- 사업 대상: 구민 누구나 이용 가능
- 사업 추진 절차 및 내용
 - (1단계) 추진계획 수립 및 시스템 구축 운영 기반조성
 - (2단계) 지역주민이 활용할 수 있는 지역사회 가용 자원의 총량 파악
 - (3단계) 공공·민간 복지자원 영역, 대상자, 사업별 분류를 통한 매뉴얼화
 - (4단계) 공유플랫폼 구축
 - (5단계) 지속 활용을 위한 시스템 관리

■ 추진일정

세부 추진사항		2022		2023				2024				2025				2026	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
복지 플랫폼	복지플랫폼 추진계획 수립 예산 확보																
	시스템 구축 및 운영을 위한 기반 조성																
	복지자원 총조사 매뉴얼화 및 복지플랫폼 구축																
	시스템 관리 운영																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	143	-	143	-	100	6	18	19	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	143	-	143	-	100	6	18	19	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
복지플랫폼 구축 및 운영	개	목표	1	-	1	1	1	1	100
		실적	1	-	1				

■ 추진실적

- 2022. 9. ~ 12.: 복지자원 공유플랫폼 현황 조사 및 시스템 구축 운영 기반
조성에 따른 기본 계획 수립
- 2023. 1. ~ 3.: 복지플랫폼 홈페이지 제작 업체 용역 계약 및 발주
- 2023. 3. ~ 6.: 지역사회 가용 자원의 총량 파악 및 공공민간 복지자원 영역,
대상자, 사업별 분류를 통한 매뉴얼화
- 2023. 6. 14.: 도봉복지자원 통합플랫폼 중간보고회(제327회 도봉구의회 정례회)
- 2023. 7. 7.: 도봉복지자원 통합플랫폼 구축완료
- 2023. 9. 11.: 도봉복지자원 통합플랫폼 구축 완료보고회
- 2023. 9. 25. ~ 12.: 도봉복지자원 통합플랫폼 오픈 및 운영

■ 향후 계획

- 2023. 9. ~ 12. : 공유플랫폼 유지보수 및 지속 활용을 위한 시스템 관리

12

서울형 모아어린이집 확대

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●		●			●		●			●

주관부서	가족정책과장 김미영 ☎2091-3100 보육정책팀장 원호연 ☎3111 담당 김건희 ☎3116
------	---

현황

- 인근의 국공립·민간·가정어린이집 3~5개가 모여서 공동으로 보육 프로그램을 개발하고 운영하여 어린이집 간 상생 협력 및 보육의 질 향상을 통해 국공립어린이집 쏠림 현상 완화

사업목표

- 서울형 모아어린이집 5개 공동체 운영
 - 서울형 모아어린이집을 확대 운영하여 매년 1개 공동체를 추가 구성하여 총 5개의 공동체 운영 목표

사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 계속
- 사업대상 : 관내 어린이집 중 참여 희망 어린이집으로 구성된 5개 공동체
 - 공동체별(국공립·민간·가정어린이집) 3~5개로 구성
- 사업내용 : 국공립·민간·가정어린이집 3~5개가 한데 모여 어린이집 공동체를 형성하여 원장·교사 교육 및 정기모임을 통해 공유프로그램 개발 및 실행(교사·공간 공유, 공동운영, 공동구매, 차량공유 등)
- 총사업비 : 389백만원

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
모아어린이집 1개 공동체 운영																
모아어린이집 2개 공동체 운영																
모아어린이집 3개 공동체 운영																
모아어린이집 4개 공동체 운영																
모아어린이집 5개 공동체 운영																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉡+㉢	기투자 ㉠	임 기 내						장기 ㉢
			소계 ㉡	2022	2023	2024	2025	2026	
계	349	-	349	55	37	53	94	110	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	320		320	26	37	53	94	110	-
구비	29		29	29	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
모아어린이집 운영 공동체 수	개	목표	5	1	1	1	1	1	60%
		실적	3	1	1	1			

■ 추진실적

○ 서울형 모아어린이집 3개 공동체 운영

구분	공동체명	대상어린이집	비고
기존	우아미 공동체	창문, 사랑나무, 상상, 창2동엘리트	2개소 변경
	모들 공동체	삼익영재, 햇살마루, 쌍문2동소라, 한그루, 늘사랑	
신규	효자동 공동체	쌍문1동, 로댐아이, 아이숲, 꾸러기	2024년 3월 신규

■ 향후 계획

○ 서울형 모아어린이집 운영 공동체 확대

- 현재 3개 공동체로 운영 중인 모아어린이집을 확대하여 매년 권역별로 1개 공동체를 추가 구성하여 2026년까지 총 5개의 공동체 운영을 목표로 하고 있음

○ 서울시 서울형 모아어린이집 확대 운영 정책 연계 추진

- 25개 자치구에 매년 20개 공동체 확대 운영 계획

13

서울형 키즈카페 확대 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●			●			●		●			●
주관부서	아동청소년과장 김동현 ☎2091-3850 아동청소년친화팀장 박세정 ☎3851 담당 손경은 ☎3852													

■ 현황

- 미세먼지 및 폭염 등 기후변화로 외부 놀이시설 이용의 어려움
- 공공놀이시설 타구 대비 부족하여 시설 확충 필요

■ 사업목표

- 외부환경 및 동네에 상관없이 즐길 수 있는 아동의 놀 권리 보장
- 폐원어린이집 등 구 소유 유휴공간 활용으로 예산 절감

■ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 사업대상: 0~만9세 및 부모 등 보호자(※ 설치지역에 따라 상이하게 조성)
- 사업내용: 구 소유 유휴공간(폐원어린이집 등)을 활용하여 서울형키즈카페로 조성
 - 권역별(도봉, 창동, 쌍문, 방학) 1개소씩 총 4개소 설치
- 총사업비: 7,475백만원 (※ 확보 공간에 따라 사업비 변경 가능)
 - 서울형키즈카페 설치비: 7.475백만원(8개소)

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
도봉권역 서울형키즈카페 조성																
창동권역 서울형키즈카페 조성																
쌍문권역 서울형키즈카페 조성																
방학권역 서울형키즈카페 조성																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣	
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025		2026
계	7,475	0	7,475	20	1,590	4,965	900	0	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	6,305	-	6,305	20	1,158	4,227	900	-	-
구비	1,170	-	1,170	-	432	738	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
도봉구 서울형키즈카페 조성	개소	목표	4	-	2	2	-	-	75%
		실적	3	-	1	2			

■ 추진실적

- 2023. 1. 2023년 서울형 키즈카페(창3동점, 쌍문1동점) 공간 선정
- 2023. 3. 서울형 키즈카페 도봉2동점 리모델링 공사 착공
- 2023. 3. 서울형 키즈카페 확대 조성 계획 수립
- 2023. 5. 2023년 제1차 서울형 키즈카페 공간선정심의 결과 5개소 추가 선정
- 신규: 도봉2동2호점, 쌍문2동점, 방학1동2호점, 전환: 방학1동점, 창1동점,
- 2023. 10. 서울형 키즈카페 창3동점 놀이공간 조성 용역 착수
- 2023. 11. 도봉2동점 공사 준공 및 방학1동점·창1동점 리모델링 공사
- 2023. 12. 서울형 키즈카페 도봉2동점 개소
- 2024. 1. 서울형 키즈카페 방학1동점·창1동점 개소
- 2024. 3. 서울형 키즈카페 도봉2동2호점 놀이공간 조성 용역 착수

※ 서울형 키즈카페 조성 추진 현황

행정동	지점명	소재지 주소	면적	개관(예정)일	비고
도봉권역	도봉2동점	마들로 668	274m ²	'23. 12.	신규
	도봉2동2호점	도봉로180나길 19	232m ²	'24. 10.	신규
창동권역	창1동점	해등로4길 38	131m ²	'24. 1.	전환
	창3동점	우이천로4길 24-5	240m ²	'24. 10.	신규
쌍문권역	쌍문2동점	노해로 227	475m ²	'24. 12.	신규
	쌍문1동점	쌍문동 산79	400m ²	'25. 1.	신규(공원형)
방학권역	방학1동점	마들로 656	231m ²	'24. 1.	전환
	방학1동2호점	도봉로 666	600m ²	'28. 12.	신규

■ 향후 계획

- 2024. 4. 서울형 키즈카페 쌍문2동점 놀이공간 조성 용역 착수
- 2024. 4. ~ 창3동점, 도봉2동2호점, 쌍문2동점 리모델링 및 놀이공간 조성공사 시행
- 2024. 10. ~ 12. 창3동점, 도봉2동2호점, 쌍문2동점 개관 및 운영
- 2025. ~ 쌍문1동점 및 방학1동2호점 개관 예정
- 총 10개소 이상 설치 목표로 2개소 추가 공간발굴 및 조성 추진

14

WHO 고령친화도시 사업 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●		●		●			●
주관부서	어르신장애인과장 유두현 ☎2091-3050 어르신복지팀장 이복희 ☎3051 담당 최민영 ☎3054													

현황

- 구 전체 인구수 306,542명 중 65세이상 인구 71,098명(23.19%)
- WHO 고령친화도시 인증획득(2018. 12. 14.), 2기 인증획득(2022. 01. 07.)
 - 2018. 12.: WHO 고령친화도시 네트워크 가입인증, 조례 제정
 - 2019. 01. ~ 2021. 12.: 제1기 고령친화도시 조성 이행계획 수립, 실행
 - 2019년(8대 분야, 58개 사업), 2020년(8대 분야, 67개 사업), 2021년(8대 분야, 76개 사업)
 - 2019. 09.: 도봉구 고령친화도시 조성 위원회 구성 및 개최
 - 2020. 08.: 매니페스토 우수사례 경진대회 1차 선정(초고령 대응분야)
 - 2022. 01.: 제2기 고령친화도시 국제네트워크 재가입 승인
 - 2022. 12.: 제2기 도봉구 고령친화도시 5개년 기본계획 수립
 - 2022. 07.~ 2026. 06.: 제2기 고령친화도시 조성 이행계획 수립, 실행
 - 2022년(8대분야 73개 사업), 2023년(8대분야 72개 사업)

사업목표

- 은퇴세대부터 고령세대까지 연령에 상관없이 누구나 살기좋은 도시 조성
- 어르신들의 사회활동력을 높이고 스스로 건강한 삶을 지속할 수 있는 정책 마련

사업개요

- 고령친화도시 개념
 - 고령자들이 연령에 따른 환경변화에 불편함 없이 살 수 있도록 각종 정책 및 서비스를 제공하고 환경을 조성하여, 고령자들이 지역사회에 능동적으로 참여할 수 있게 하는 도시
- 가입기준
 - WHO에서 제시하는 8대 영역의 가이드라인에 따른 분야별 지표작성 및 지자체 여건을 고려한 실행계획 수립 등 요건 충족

도봉구 고령친화도시 8대 영역

① 존경과 사회통합 ② 시민참여 ③ 야외공간 및 건물 ④ 교통 ⑤ 주거 및 주거환경 ⑥ 사회참여 ⑦ 의사소통과 정보제공 ⑧ 지역사회지원과 건강서비스

○ 사업기간: 2022. 07. ~ 2026. 06.(5년)

○ 사업대상: WHO(세계보건기구) 고령친화도시 8대 영역별 세부사업

○ 사업내용: 제2기 도봉구 고령친화도시 5개년 실행계획 수립·이행

- 민선8기 공약, 도봉구청 4개년 정책과 정합성을 도모하여 제2기 계획 수립
- 제1기 이행평가 결과를 토대로 영역별 균형성을 맞추고 체계적인 평가체제 마련

○ 추진체계

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
제1기 실행계획 (3개년 계획)	계획 실행	계획 실행	실행 평가					
제2기 실행계획 (5개년 계획)				계획 수립	계획 실행	실행 평가	계획 실행	실행 평가

- 제1기(3개년) 실행완료 후 제2기(5개년) 계획 수립과 실행, 평가의 반복
- 제2기 실행계획은 (1)계획 (2)실시 (3)평가의 3단계를 5년 사이클로 실시, 개선

○ 총사업비: 25,700천원

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
고령친화도시 이행계획 수립·실행																
고령친화도시 이행계획 실행·평가																

소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	25.7	-	25.7	0.7	7	6	6	6	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	25.7	-	25.7	0.7	7	6	6	6	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
고령친화도시 이행계획 수립·실행	건	목표	5	1	1	1	1	1	40
		실적	2	1	1				

■ 추진실적

- 2022. 12.: 제2기 도봉구 고령친화도시 5개년 기본계획 수립
- 2023. 2.: 2023년 도봉구 고령친화도시 이행계획 수립
- 2023. 3.: 고령친화도시 사업 모니터링 실시(어르신 무료급식 및 일자리 사업)
- 2023. 4.: 고령친화도시 모니터링단을 통한 의견 제안(고령친화도시 모니터링 추진방법 관련)
- 2023. 6.: 고령친화도시 사업 모니터링 실시(어르신 인식개선사업 및 장수사진, 위생용품 지원 사업)
- 2023. 6.: 고령친화도시 모니터링단을 통한 의견 제안(어르신 문화공간 관련)
- 2023. 7~8.: 고령친화도시 신규사업 추진상황 점검 및 사업활성화 방안 제안
(그때 그 시절 청춘극장)
- 2023. 12.: 2023년 19개 부서 8대 분야 72개 사업 추진 완료
- 2024. 2. ~ 현재: 2024년 도봉구 고령친화도시 이행계획 수립
(19개 부서 8대 분야 77개 사업 추진 중)

■ 향후 계획

- 2024. 1. ~ 12.: 2024년 도봉구 고령친화도시 사업 계획수립 및 사업지속 추진

15

여성 및 청소년을 위한 안심귀가 환경 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●		●	●	●			●			●
주관부서	가족정책과장 김미영 ☎2091-3100 양성평등팀장 이인숙 ☎3101 담당 전수정 ☎3104													

현황

- 이상동기 범죄 발생 등으로 인한 구민 불안 가중
- 여성 등 범죄 취약계층의 안심귀가 위해 안심귀갓길 총 8개 노선 조성 운영

조성시기	조성위치
2017년	도봉여성센터 주변(방학로12가길, 도당로9길, 방학로10길)
2018년	우이천로42길
2019년	신도봉중학교 후문(도봉로117길), 우이천로44길~우이천로46가길
2020년	창림초등학교 주변(덕릉로63길 20-13), 도봉구보건소 주변(도봉로135길)
2023년	창3동 골목길(우이천로4다길 81~우이천로4길 31), 도봉역 골목길(도봉로170길 8~도봉로168길 11)

사업목표

- 빅데이터를 활용한 우범지역 안전 귀가 지원 및 순찰을 통해 모두가 안전한 여성친화도시 구현에 기여
- 민·관 협력을 통하여 안전한 골목길 환경 개선 및 조성

사업개요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.(매년 시행)
- 사업대상: 여성 및 청소년 등 범죄 취약계층
- 사업내용
 - 안심스카우트 운영 (시비)
 - 운영시간: 월 ~ 금, 1일 3시간(22시 ~ 익일 1시, 월요일은 24시까지)
 - 규모/내용: 인원 총 7명, 3개 거점 운영/안심귀가 지원, 위험환경 순찰, 서울시 안심이앱 연계 운영
 - 여성이 안심하는 골목길 조성 사업 (구비)
 - 골목길 모니터링단을 구성하여 현장모니터링을 실시하고 여성안심귀갓길 정비 및 확대

- 안심이앱 운영 (시비 50%, 구비 50%)
 - 설치방법: 구글이나, 앱스토어에서 ‘서울시 안심이’ 검색
 - 안심이앱 제공서비스: 긴급신고, 귀가모니터링, 안심귀가스카우트 신청, 내주변 안심시설물 검색(안심택배함, CCTV, 지구대) 등
 - 안심지킴이집: 심야시간 위기상황 시 긴급대피 및 즉시신고 가능한 관내 편의점 25곳 선정·운영
- 총사업비: 225,859천원 (시비: 142,561천원, 구비: 83,298천원)
- 안심스카우트: 104,883천원 (전액 시비)
 - 안심이앱: 71,836천원 (시비 50%, 구비 50%)
 - 안심귀갓길 정비 및 확대: 47,500천원 (전액 구비)
 - 안심지킴이집 운영: 1,760천원 (전액 시비)

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
여성 및 청소년 심야 귀갓길 지원 및 우범지역 순찰																
안심이앱 및 안심지킴이집 운영																
여성안심귀갓길 정비 및 확대 (골목길 모니터링단 운영)																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ④
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	977	-	977	179	225	191	191	191	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	710	-	710	142	142	142	142	142	-
구비	267	-	267	37	83	49	49	49	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
골목길 모니터링단 운영횟수	회	목표	12	-	3	3	3	3	33.3
		실적	4	-	4				
안심귀가 지원 건수	건	목표	12,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	51.4
		실적	6,431	3,503	2,522	406			

■ 추진실적

- 2022. 9. 13. : 도봉구청-도봉경찰서 안전한 귀갓길 조성을 위한 업무협약 체결
- 2022. 9. 30. : 도봉구청-도봉경찰서 안심귀갓길 합동 순찰 실시
- 2023. 2. ~ 3. : 기 조성 안심귀갓길(6개 노선) 현장 점검
- 2023. 3. ~ 3. : 2023년도 안심스카우트 채용 및 배치
- 2023. 3. ~ 3. : 골목길 모니터링단 모집 및 구성
- 2023. 4. ~ 3. : 안심귀갓길 조성을 위한 현장실사 및 신규 조성 장소 선정
- 2023. 5. ~ 8. : 안심귀갓길 2개소 신규 조성
- 2023. 9. ~ 3. : 기 조성 안심귀갓길(8개 노선) 현장 점검
- 2023. 11. 27. : 2023년 여성폭력 추방주간 기념 캠페인 실시
- 2024. 2. ~ 3. : 2024년도 안심스카우트 채용 및 배치
- 2024. 3. ~ 3. : 기 조성 안심귀갓길(8개 노선) 및 안심거울 설치 지하철역(3개소) 현장 점검

■ 향후 계획

- 이상동기 범죄 발생 등 대응 위한 안심귀갓길 추가 조성(2개소 이내) 실시
- 안심스카우트 운영, 안심지킴이집 등 사업 지속 추진
- 신규 조성 안심귀갓길 모니터링 및 홍보
- 민간 및 경찰과 유기적 업무체계 유지: 위기상황 시 대처방안 마련

16

동북권 시민안전체험관 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
		●		●		●				●	●			●
주관부서	재난안전과장 박득원 ☎ 2091-4250 생활안전팀장 조창민 ☎ 4281 담당 강태훈 ☎ 4282													

현황

- 공유재산관리계획 수립 후 타당성 조사 용역(건설기술진흥법) 완료('21.12.)
- 도입시설 재검토(신규 도입시설 발굴)를 통한 사업계획 변경
- 신규 도입시설에 대한 사전 행정절차 등 이행

사업목표

- 시민안전체험관을 건립하여 시민 안전의식 제고 및 학생들에게 체험학습 기회 제공
 - 다양한 재난·재해에 대해 시민들의 대응 요령을 학습할 수 있는 종합안전체험관을 건립하여 유사시 시민의 재난 대처 능력 향상

사업개요

- 사업기간 : 2017. 7. ~ 2028. 12.
- 사업위치 : 도봉구 방학동 708 (소방학교 이전부지 내)
- 건립규모 : 연면적 9,600㎡ (지하2층/ 지상4층)
- 총사업비 : 74,336백만원

구 분	총 수	연 면 적	용 도	소관부서
소방체험시설	지하2/지상4	9,600㎡	소방안전체험관	서울시 소방재난본부
		2,400㎡	통합정비센터	

추진일정

세부 추진사항	2023				2024				2025				2026~27				2028			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공유재산 재심의, 공유재산 관리계획 수립																				
설계공모, 기본·실시설계																				
기본·실시설계, 중앙투자심사, 인허가																				
공사발주 및 착공, 공사진행																				
준공 및 개관																				

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내				임 기 후		장기 ③
			소계 ②	2024	2025	2026	2027	2028	
계	74,336	-	74,336	2,790	3,492	25,639	24,738	17,677	-
국비	10,000	-	10,000	-	-	4,000	6,000	-	-
시비	64,336	-	64,336	2,790	3,492	21,639	18,738	17,677	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	이행률 (%)
시민안전체험관 조성	추진율 (%)	목표	100	10	30	40	50	70	90	100	30
		실적	30	10	30						


■ 추진실적

- 2020. 6. 공유재산관리계획 수립(원안의결)
- 2021. 11. 타당성조사용역 최종보고 및 자문회의(변경계획(안) 수립)
- 2022. 1. 소방재난본부(안전지원과) 협의(사업추진관련 의견조회)
- 2023. 7. 조성사업 변경 추진계획(행정2부시장 방침)
- 2023. 8. 서울시 공유재산심의회(변경안) 심의(조건부 적정)
- 2023. 9. 공유재산관리계획안(변경안) 서울시의회 원안 가결(조건부 적정)
- 2024. 3. 도봉소방학교 이전부지 개발사업 관련 회의
 - 예산담당관 및 LIMAC(지방투자사업관리센터) 의견에 따라 변경된 시설에 대하여 타당성 조사 의뢰 및 투자심사 진행


■ 향후 계획

- '24. 4. (LIMAC)2차 타당성 조사의뢰(일부 용도변경 반영)
- '24. 7. (행정안전부) 중앙투자심사 의뢰
- '24. 하반기: 설계공모 사전절차 및 설계공모 추진

□ 위치도(안)

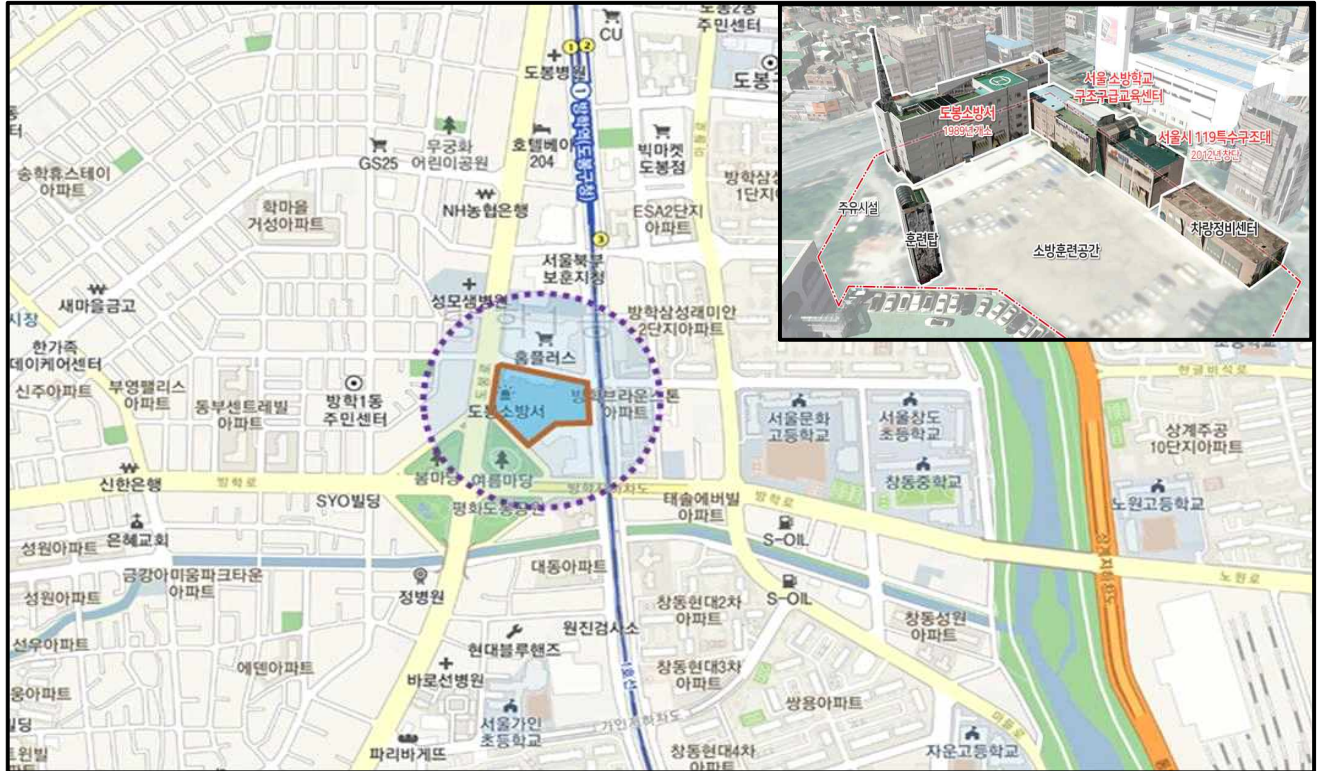

□ 조감도(안)

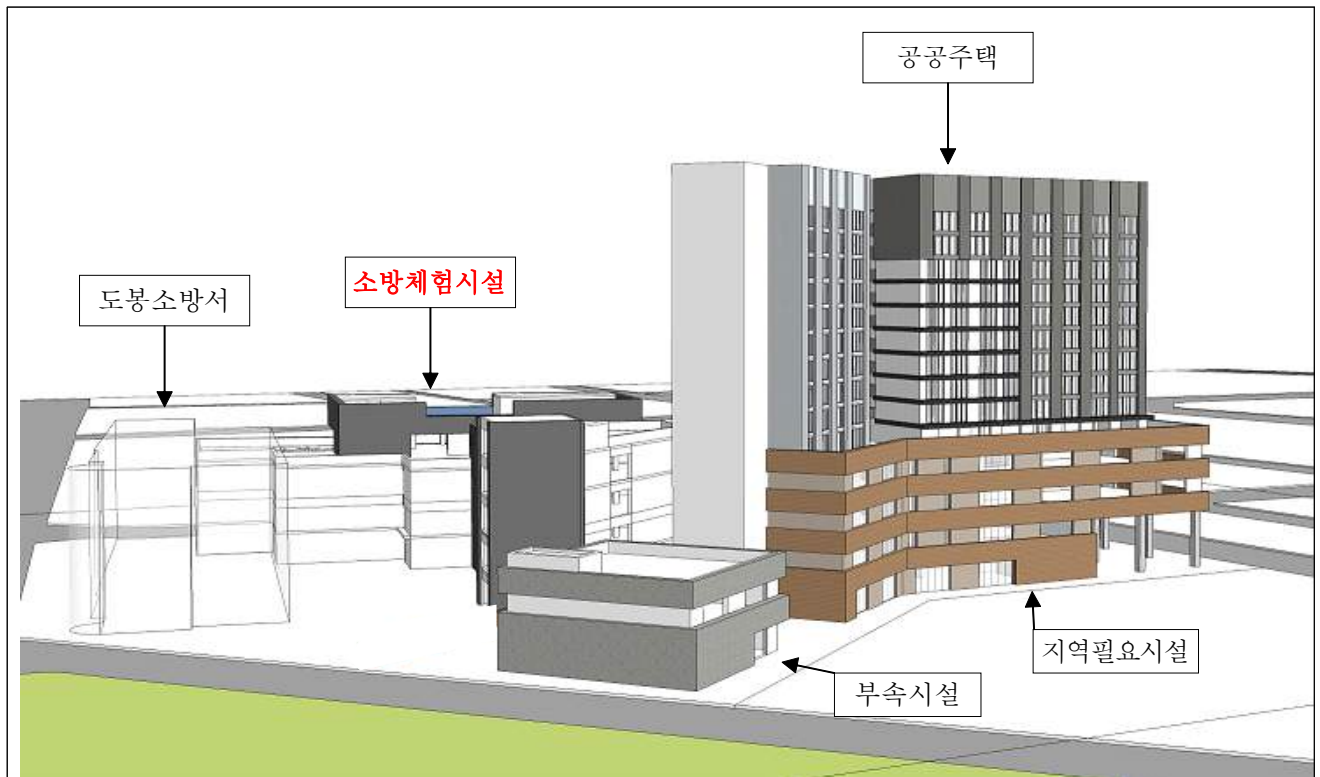

17

신혼부부 및 청년 공공임대주택 확대

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
일부추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●		●	●		●			●		●
주관부서	주택과장 박효진 ☎2091-3500 임대주택관리팀장 김선진 ☎3511 주무관 노원기 ☎3512													

현황

- 수요자 맞춤형 공공임대주택인 문화예술인 마을 7개소(80세대), 신혼부부 2개소(56세대), 청년창업인을 위한 도전숙 1개소(11세대) 총 10개소(147세대)를 운영

사업목표

- 우리구 지역 특성과 지역 주민의 입주 수요 반영을 통해 수요자 맞춤형 공공임대주택을 공급하여 지역 주민의 주거 안정에 기여

사업개요

- 사업내용: SH 매입임대주택 공급물량의 30% 범위에서 지역 특성 및 수요 등을 감안하여, 자치구에서 입주자를 별도로 선정하여 공공임대주택 공급
- 입주유형: 문화예술인, 청년창업인, 신혼부부 등
- 입주대상: 전년도 도시근로자 월평균소득 100% 이하인 무주택 세대구성원
- 임대조건: 시세 30%~50%, 임대기간 2년, 재계약 9회 가능
- 추진방법: SH 공공임대주택 매입시 추진

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
SH 매입공고																
민간사업자 사전협의																
공공임대주택 공급																

■ 소요예산 : 비예산

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
청년 및 신혼부부 공공임대주택 공급	호	목표	60	-	15	15	15	15	0
		실적	-	-	-	불가	불가	-	

※ 기존 수요자 맞춤형 공공임대주택의 모집 현황, 공가 현황, 유형별 수요 등을 고려하여 목표량 결정

■ 추진실적

- 2024.1.~3.: 도전숙 및 문화예술인 마을 재계약대상자 자격요건 심사(19명)
문화예술인 마을 공가 발생 세대에 예비합격자 계약 안내(1명)

■ 추진상 문제점

- 반지하주택 매입 우선 추진에 따라 서울시에서 2023년, 2024년 관련 예산을 미편성하여 2025년까지 수요자맞춤형 공공임대주택 공급물량이 없으며
- 구 자체사업(호당 최대 4억 소요 ※ SH공사 기준)으로 추진은 예산 확보, 사업 효과성 등에 검토가 필요

■ 향후 계획

- 서울시 정책 변화에 공약 추진이 어려워짐에 따라, 도봉구 주민배심원단 회의를 통해 일반시책사업으로 변경하여 추진

18

언덕길 열선 및 보행환경 개선

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●	●			●			●
주관부서	도로과장 강우영 ☎2091-4050 도로관리팀장 여경환 ☎4061 담당 이재덕 ☎4062													

현황

- 열선설치사업은 2019년부터 시작하고 있으며, 특히 관내 경사가 가장 심한 쌍문동 꽃동네 주변으로 열선설치 사업 진행 중
- 사업 추진현황

구분	총합계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 ~2026년
계	36개소	3개소	6개소	5개소	6개소	16개소

- 관내 103km의 보도가 설치되어 있는 상황으로 노후되고 불편한 보도를 정비해 달라는 민원이 지속적으로 발생되고 있어 보행환경개선을 위한 보도정비 필요

사업목표

- 관내 제설 취약구간 중 급경사로에 열선설치를 통해 신속한 제설과 주민 낙상 등 안전사고를 미연에 예방하여 안전하고 쾌적한 보행환경 개선
- 도시 미관 및 보행환경을 개선하고 시민의 안전 확보와 불편 해소

사업개요

[언덕길 열선설치 사업]

- 사업기간 : 2022. 7 ~ 2026. 12. (매년 시행)
- 사업대상 : 관내 제설취약구간(급경사로 등)
- 사업내용 :
 - 강설시 신속한 제설작업이 어려워 주민 불편사항이 발생되고 있는 관내 제설취약구간(급경사로 등)에 열선을 설치하여 강설로 인한 불편사항 해소 및 안전사고 예방
- 총사업비 : 3,862백만원(년 772백만원)

[견고 싶은 보행환경 조성]

- 사업기간 : 2022. 7 ~ 2026. 12. (매년 시행)
- 사업대상 : 관내 노후·불량 보도
- 사업내용 :
 - 안전하고 쾌적한 보행환경 조성을 위한 보도블록 정비 및 유모차, 휠체어, 전동차 등 보행약자가 통행가능토록 횡단보도 턱낮춤 병행시행
 - 노후 보도 정비시 언덕길은 어르신 보행환경 개선을 위해 난간 설치
 - 노후 및 파손된 인도 관련 시설물 긴급보수 및 지속적 유지관리
- 총사업비 : 5,300백만원(년 1,060백만원)

■ 추진일정

[언덕길 열선설치 사업]

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
열선설치																

[견고 싶은 보행환경 조성]

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
노후·불량 보도 정비																
언덕길 난간설치																

■ 소요예산

[언덕길 열선설치 사업]

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,862	-	3,862	1,280	1,082	500	500	500	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,382	-	1,382	650	732	-	-	-	-
구비	2,480	-	2,480	630	350	500	500	500	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[견고 싶은 보행환경 조성]

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣	
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025		2026
계	5,300	-	5,300	500	1,200	1,200	1,200	1,200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	800	-	800	-	200	200	200	200	-
구비	4,500	-	4,500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

[언덕길 열선설치 사업]

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
열선설치	m	목표	2,715	1,115	400	400	400	400	75.3
		실적	2,045	1,115	930				

[견고 싶은 보행환경 조성]

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
노후·불량 보도 정비	a	목표	430	30	100	100	100	100	33.0%
		실적	142	30	112				
언덕길 난간설치	m	목표	450	50	100	100	100	100	38.0%
		실적	171	50	121				

■ 추진실적

[언덕길 열선설치 사업]

- 2023. 2.: 2023년 열선설치 추진계획 수립(우이천로38나길 등 6개소, L=930m)
- 2023. 4.: 2023년 열선설치공사 발주
- 2023.11.: 2023년 열선설치공사 완료(우이천로38나길 등 6개소, L=930m)

[견고 싶은 보행환경 조성]

- 2023. 2.: 2023년 보행환경 개선공사 발주
- 2023. 3.: 2023년 보행환경 개선공사 착공
- 2023.12.: 2023년 보행환경 개선공사 준공(보도 정비 112a, 난간설치 121m)
- 2024. 2.: 2024년 보행환경 개선공사 발주
- 2024. 3.: 2024년 보행환경 개선공사 착공

■ 향후 계획

[언덕길 열선설치 사업]

- 2024년 ~ 2026년 : 연간 제설취약구간 열선설치

[건고 싶은 보행환경 조성]

- 2024년 ~ 2026년 : 연간 노후·불량 보도 정비 및 난간설치

19

도봉산 둘레길 2.0 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●			●	●		●		●			●
주관부서	공원여과과장 이성일 ☎2091-3750 자연생태팀장 박지영 ☎3761 담당 신은지 ☎3762													

현황

- 서울 둘레길 157km중 도봉구간은 8코스 7.8km구간으로, 북한산국립공원 둘레길과 접치는 구간임
- 서울 둘레길 주변 여가·체험시설은 무수골 녹색복지센터 건립, 연산군묘 주변 역사문화쉼터 조성임

사업목표

- 숲이 주는 치유의 기능을 활용하여 둘레길 주변 산림체험시설 확대 조성을 통해 주민 건강 증진에 기여

사업개요

□ 서울 둘레길 확대 추진

- 서울시 둘레길 확대 기본계획 용역<서울시 시행> 완료(2023. 12월)

□ 둘레길 주변 여가·체험시설 확대 추진

- 무수골 생태치유 및 명상의숲 조성
 - 위치 : 도봉동 467-3번지 일대(서울 둘레길 8구간 무수골 인접)
 - 사업내용 : 녹색복지센터 건립(2023.11.준공) 및 명상의 숲 조성(2024.5.준공 예정)
(규모 7,334㎡, 건축 2개동 <1층> 827㎡, 그 외 조경 6,507㎡)
 - 사업비 : 5,850백만원(국비 900 / 시특교 1,000 / 구비 3,950)
- 연산군묘 주변 역사문화쉼터 조성(2023.10.준공)
 - 위치 : 방학동 465-4번지 일대(서울 둘레길 8구간 연산군묘 인접)
 - 사업내용 : 역사문화쉼터 조성(규모 480㎡)
 - 사업비 : 2,757백만원(구비)

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
서울둘레길 확대																
서울둘레길 여가 체험시설 조성																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,607	-	8,607	7,092	1,015	500	-	-	-
국비	900	-	900	900	-	-	-	-	-
시비	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-
구비	6,707	-	6,707	5,192	1,015	500	-	-	-
기타	-	-	-				-	-	-

※ 서울둘레길 확대 : 서울시 용역 및 국립공원 협의 등 확대 반영 완료

※ 여가체험시설 조성 : 연산군묘 주변 역사문화쉼터(2,757백만원), 무수골 생태치유공원(5,850백만원)

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
서울둘레길 확대 및 여가 체험시설 조성	조성률 (%)	목표	100	30	100	100	-	-	80
		실적	80	30	80	-			

■ 추진실적

- 2022. 7. ~ 2023. 12. : 서울 둘레길 확대 기본계획 용역 시행(서울시)
- 2022. 8. ~ 9. : 서울시 주관부서 정보공유 및 사업 협의
- 2022. 9. : 도봉 둘레길 확대 우리구(안) 반영 요청(서울시)
- 2022. 10. : 둘레길 확대 우리구(안) 협의 및 반영 요청(국립공원공단)
- 2022. 11. : 서울시 주관부서 - 행정2부시장 보고
- 2022. 12. : 서울시 행정2부시장 - 국립공원공단이사장 협의
- 2023. 1. : 서울시·국립공원공단·도봉구 면담
- 2023. 2. : 서울둘레길2.0 추진 사업설명회 도봉구 사업의견 제출
- 2023. 4. : 현장중심의 환경규제 개선과제 건의(우리구→환경부)
- 2023. 5. : 국립공원 둘레길 ~ 쌍문공원·초안산 연결노선(안) 반영
- 2023. 6. : 2023년 상반기 국립공원 협치위원회 안건 건의
- 2023. 7. ~ 12. : 서울 둘레길 확대 기본계획 및 안내체계개선 용역 완료(서울시)
 - 2024년 1월 둘레길 2.0 코스 확대(우리구 둘레길 확대 요청 사항 반영)
- ※ 둘레길 ~ 테마산책로 연결노선 및 연계 문화·여가시설 홈페이지 등 반영

- 2023. 1. ~ 11. : 무수골 녹색복지센터 건립 시행(완료)
- 2023. 7. ~ 11. : 연산군묘 주변 역사문화쉼터 조성 시행(완료)
- 2023. 8. ~ 12. : 명상의숲 조성사업 설계 용역 시행(완료)

※ 사업추진 완료사진



【 기타사항 】

- 2024년 둘레길 CCTV 설치 공사 시행 예정(1,020백만원 특교 확보)

■ 향후 계획

- 2024. 1. ~ 4. : 서울둘레길2.0 안내체계 개선사업 추진(안내판 교체)
- 2024. 1. ~ 5. : 명상의 숲 조성사업 공사 시행
- 2024. 1. ~ 7. : 둘레길 주변 CCTV 설치 공사 시행
- 2024. 1. ~ : 초안산 및 쌍문공원 무장애숲길 조성사업 추진

20

무수골 생태치유 및 명상의 숲 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●		●		●		●	
주관부서	공원여가과장 이성일 ☎2091-3750 자연생태팀장 박지영 ☎3761 담당 신은지 ☎3762													

현황

- 무수골은 환경적, 생태적, 경관적으로 우수하게 보전된 청정구역
- 북한산국립공원 해제(2011.1.10.)로 무분별한 개발행위 및 환경오염 등 자연 환경 훼손 우려

사업목표

- 무수골의 자연환경과 조화를 이루는 생태치유공간 및 명상의 숲을 조성하여 주민에게 휴식과 생태치유 체험기회를 제공하고 청정한 자연환경 보전

사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2024. 5.
- 사업위치 : 도봉동 467-3번지 일대
- 사업규모 : 7,334㎡(건축 2개동 <1층> 827㎡, 그 외 조경 6,507㎡)
- 사업내용 : 녹색복지센터 건립 및 명상의숲 조성 추진
- 총사업비 : 5,850백만원(국900, 시1,000, 구3,950)
 - 토지매입비 : 1,700백만원
 - 녹색복지센터 건립 및 명상의 숲 조성 : 4,150백만원

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
녹색복지센터 건립 토지매입																
녹색복지센터 건립																
명상의 숲 조성																
시설 운영																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ④
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026
계	5,850	-	5,850	5,100	250	500	-	-
국비	900	-	900	900	-	-	-	-
시비	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-
구비	3,950	-	3,950	3,200	250	500	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
생태치유 및 명상의 숲 조성	조성률 (%)	목표	100	50	100	100	-	-	80
		실적	80	50	80	-	-	-	

■ 추진실적

- 2020. 4. : 토지주(성신학원)와 토지(2,128㎡) 매각 협의 완료
- 2020. 9. ~ 2021. 10. : 녹색복지센터 건립 설계용역 완료
- 2021. 3. ~ 2022. 8. : 토지수용절차 진행
 - ※ 토지주(성신학원)와 토지 무단점유자간의 명도소송 시행(1심·2심 승소)
- 2022. 9. ~ 11. : 토지매입 및 녹색복지센터 건립공사 발주
- 2023. 1. ~ 11. : 녹색복지센터 건립공사 시행 및 준공
- 2023. 8. ~ 12. : 명상의 숲 조성공사(조경) 설계용역 준공, 조경공사 발주

■ 향후 계획

- 2024. 1. ~ 5. : 명상의 숲 조성공사(조경) 공사 시행
- 2024. 6. : 시범운영 및 개관행사
- 2024. 7. : 녹색복지센터 및 명상의 숲 프로그램 운영

※ 명상의 숲 조성 위치도 및 조감도



21

반려견 놀이터 확대

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●		●		●		●	
주관부서	보건정책과장 최승렬 ☎2091-4400 동물복지팀장 정기명 ☎4471 담당 임성태 ☎4472													

■ 현황

- 반려견 양육 가구가 증가함에 따라 공공 놀이터 확대 필요
 - 국내 반려동물 양육가구수 : 313만 가구(2020년 통계청 자료)
 - 양육 가구 비율(농식품부 자료) : (2010년) 17.4% → (2015년) 21.8% → (2020년) 27.7%
 - 도봉구 등록 반려동물(2024.3.31.기준) : 22,737마리
 - 서울 소재 반려견 놀이터 : 11개소
 - 서울시(4) : 월드컵공원(마포), 보라매공원(동작), 어린이대공원(광진), 매현시민의숲(서초)
 - 자치구(8) : 도봉, 동대문, 구로, 영등포, 마포, 송파, 강북, 성동 각 1개소
- 주변 입지 조건 등의 제약으로 적정 부지 발굴이 중요
 - 입지 조건 : 10만㎡ 이상의 근린공원, 하천변 등
 - 부지 규모 : 충분한 놀이공간 확보 등을 위해 최소 400㎡ 이상 필요
 - 주요 민원 : 비반려인 또는 배변으로 인한 악취, 소음 등으로 인한 민원

■ 사업목표

- 반려견 놀이터 조성 및 운영 : 3개소(기존 1개소, 신규 2개소)

■ 사업개요

- 반려견 놀이터 신규 조성 : 2개소('24년 1개소, '26년 1개소)
 - 부지발굴 : 관내 근린공원, 나대지, 하천변 등 유휴공간 조사
 - 민원해소 : 설문조사 등 여론수렴
 - 소요예산 : 300백만원/개소
 - 운영방안 : 기간제근로자 또는 자원봉사자 활용 탄력 운영

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
반려견 놀이터 조성																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉡+㉢	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉢	
			소계 ㉡	2022	2023	2024	2025		2026
계	1,117	-	1,117	60	65	372	140	480	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	450	-	450	-	-	300	-	150	-
구비	667	-	667	60	65	72	140	330	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
반려견 놀이터 조성	개소	목표	2	0	0	1	0	1	0
		실적	0	0	0				

■ 추진실적

- 2023. 1. ~ 5.: 신규 조성 대상 부지 물색
- 2023. 5. : 반려견 놀이터 조성사업 기본계획(안) 수립
- 2023. 8. : 반려견 놀이터 조성 보조금 신청(도봉구 → 서울시)
- 2023. 8. : 반려견 놀이터 조성 시비보조금(3억원) 교부(서울시 → 도봉구)
- 2023. 11.~12.: 반려견 놀이터 부지관련 주민 설문조사 실시(2개소 인근 주민)
(쌍문근린공원 방학동 산90-14 및 쌍문동 산83-19)
- 2024. 1. ~ 4.: 대상 부지 검토 및 관련 부서(기관) 협의

■ 향후 계획

- 2024. 5. ~ 6.: 설계용역(하천점용허가 등 포함)
- 2024. 7. ~ 9.: 공사 시행(1개소)
- 2024. 10. ~ : 반려견 놀이터 개장
- 2025. 1. ~ 12.: (추가 1개소) 부지 선정 및 기본계획 수립, 서울시 공모사업 신청
- 2026. 상반기 : 설계 및 공사완료 후 개장

22

재건축·재개발 등 활성화 적극 지원

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●	●	●	●		●		●		●	
주관부서	재건축재개발과 나현천 ☎2091-3400 재건축팀장 노동웅 ☎3401 담당 임석현 ☎3403 재개발팀장 황재훈 ☎3411 담당 장병관 ☎3412 소규모정비팀 최상진 ☎3421 담당 엄준형 ☎3422													

■ 현황

○ 재건축정비사업 . . . 15개소

- 정비계획 수립 : 6개소(창동상아1차, 쌍문한양1차, 방학신동아1단지, 삼환도봉, 창동주공18단지, 창동주공19단지)
- 안전진단 용역 진행 : 3개소(창동동아, 창동주공4단지, 창동주공17단지)
- 현지조사 통과 : 6개소(창동주공3단지 외 5)

○ 재개발정비사업 . . . 5개소

- 공사 착공 : 1개소(도봉제2주택재개발정비사업)
- 정비구역 지정: 1개소(쌍문3구역 주택정비형재개발사업)
- 정비계획 수립: 3개소(방학1동 685번지 일대 신속통합기획 공모 선정지)
(쌍문2·4동 81번지 일대 신속통합기획 공모 선정지)
(창3동 470번지 일대 공공재개발 후보지)

○ 소규모주택정비사업 . . . 54개소

- 건축심의 통과 : 2개소(창동대신빌라 외 1)
- 조합설립 : 3개소(도봉동 625-80번지 일대 외 2)
- 조합설립동의서 징구: 44개소(청호빌라2차 외 43)
- 모아타운 용역 진행 : 4개소(쌍문1동 청한빌라 일대 외 3)
- 모아타운 대상지 선정 : 1개소(창3동 501-13 일대)

○ 도심공공주택복합사업 . . . 5개소

- 복합사업계획 승인: 2개소(방학역, 쌍문역 동측)
- 복합지구 지정 : 1개소(쌍문역 서측)
- 사업성 검토 : 2개소(창2동주민센터 인근, 창동 674번지 일대)

○ 주택건설사업 . . . 2개소

- 공사중단: 1개소(쌍문4동 137번지 지역주택조합)
- 사업계획승인: 1개소(쌍문2동 716-36번지)

■ 사업목표

- 주택재건축·재개발사업 등에 대한 적극적인 행정지원을 통하여 주거환경 개선 및 주택공급 활성화

■ 사업개요

- 정비사업 주민지원
 - 반기별 주민교육 : 재건축·재개발 등 정비사업 추진 구역 주민 대상
 - 교육시기 : 매년 4회(분기별 1회 이상)
 - 교육내용 : 정비사업 추진 구역 내 주민들을 위한 교육 실시
- 재건축정비사업
 - 정비구역 지정 : 1개소【'26년 상반기 목표】
 - 정비구역 지정 후 추진위원회 및 조합설립 등 사업 지속 추진
- 재개발정비사업
 - 준공인가 : 1개소(도봉제2주택재개발정비사업)【'26년 상반기 목표】
 - 조합설립 인가 : 1개소(쌍문3구역)【'25년 상반기 목표】
 - 정비구역 지정 : 3개소(방학1동 685번지 일대)【'25년 상반기 목표】
(쌍문2·4동 81번지 일대)【'25년 하반기 목표】
(창3동 470번지 일대)【'26년 상반기 목표】
 - 정비구역 지정 후 조합설립 등 사업 지속 추진
- 소규모주택정비사업
 - 모아타운 지정 : 5개소(청한빌라 및 우이빌라 일대)【'24년 상반기 목표】
(방학동 618 및 쌍문동 460 일대)【'24년 하반기 목표】
(창동 501-13 일대)【'25년 상반기 목표】
 - 모아타운 지정 후 조합설립 등 사업 지속 추진
- 도심 공공주택 복합사업
 - 복합사업계획 승인: 1개소(쌍문역 서측)【'24년 하반기 목표】
 - 복합사업계획 승인 후 보상협의, 이주, 착공 등 사업 지속 추진
 - 복합사업 공사착공: 2개소(방학역, 쌍문역 동측)【'26년 상반기 목표】

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
● 정비사업 주민지원																
· 정비사업 관련 주민 교육 실시																
● 재건축정비사업																
· 재건축사업 정비구역 지정																
● 재개발정비사업																
· 도봉제2주택재개발정비사업 준공인가																
· 쌍문동 724 일대 정비구역 지정																
· 방학동 685 일대 정비구역 지정																
● 소규모주택정비사업																
· 모이타운 소규모주택정비관리계획 승인																
● 도심 공공주택 복합사업																
· 방학역 등 3개소 복합사업계획승인																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,165	-	4,165	291	307	2,997	285	285	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,884	-	1,884	183	152	1,549	-	-	-
구비	2,281	-	2,281	108	155	1,448	285	285	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 도봉구 정비사업 주민학교 운영비(전액 구비)
 - '23년 4백만원 중 4백만원 집행 (※ 매년 약 7백만원 예상)
- 찾아가는 재건축사업 주민설명회 운영비(전액 구비)
 - '23년 5백만원 중 5백만원 집행 (※ 매년 약 4백만원 예상)
- 찾아가는 정비사업 주민상담실 운영비(전액 구비) (※ 매년 약 2백만원 예상)
- 도봉구 정비사업 카톡채널 운영비(전액 구비) (※ 매년 약 4백만원 예상)
- 도봉구 정비사업 신속지원단 자문 수당(전액 구비)
 - '23년 11백만원 중 11백만원 집행 (※ 매년 약 8백만원 예상)
- 재건축 안전진단 비용 융자지원(전액 구비)
 - '23년 253백만원(전액 구비) (※ 매년 약 250백만원 예상)
 - '23년 미집행 금액 253백만원 '24년 명시이월
- 찾아가는 재개발사업 주민설명회 운영비(전액 구비)
 - '23년 3백만원 중 3백만원 집행 (※ 매년 약 5백만원 예상)

- 찾아가는 모아타운 주민설명회 운영비(전액 구비)
 - '23년 4백만원 중 4백만원 집행 (※ 매년 약 5백만원 예상)
- 쌍문3구역 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역
 - '22년 153백만원(시비 77백만원 + 구비 77백만원) (시 : 구 = 5 : 5)
 - '22년 집행(시·구비 각 38백만원), 잔여금액 '23년 명시이월, 잔여금액 '24년 사고이월
- 쌍문3구역 조합직접설립 공공지원 용역
 - '24년 174백만원(시비 104백만원 + 구비 70백만원) (시 : 구 = 6 : 4)
- 방학동 685번지 일대 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역
 - '23년 438백만원(시비 219백만원 + 구비 219백만원) (시 : 구 = 5 : 5)
 - '23년 집행(시·구비 각 109백만원), 잔여금액 '24년 명시이월
- 쌍문동 81번지 일대 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역
 - '24년 484백만원(시비 242백만원 + 구비 242백만원) (시 : 구 = 5 : 5)
- 청한빌라 및 우이빌라 일대 모아타운 지정 용역
 - 436백만원(시비 305백만원 + 구비 131백만원) (시 : 구 = 7 : 3)
 - '22년 집행(시 145백만원, 구 62백만원), '23년 집행(시 42백만원, 구 18백만원)
잔여금액 '24년 사고이월
- 방학동 618 및 쌍문동 460 일대 모아타운 지정 용역
 - 980백만원(시비 686백만원 + 구비 294백만원) (시 : 구 = 7 : 3)
 - '24년 전액 명시이월(시비 686백만원 + 구비 294백만원)
- 창동 501-13 일대 모아타운 지정 용역
 - '24년 380백만원(시비 266백만원 + 구비 114백만원) (시 : 구 = 7 : 3)

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
재건축·재개발 등 관련 7개의 세부 추진사항 목표 달성	개	목표	7	-	-	3	1	3	14
		실적	1	-	-	1	-	-	

■ 추진실적

- 정비사업 주민지원
 - '23. 03월 : 신속통합기획 선정 후보지 주민대표 간담회 개최(2023. 3. 6.)
정비사업 주민상담실 조성 및 운영
제1기 정비사업 주민학교 개최(2023. 3. 30.)
 - '23. 04월 : 도봉구 정비사업 주민설명회 개최(2023. 4. 7.)
 - '23. 05월 : 창동주공19단지 찾아가는 주민설명회(2023. 5. 10.)
 - '23. 06월 : 제2기 정비사업 주민학교 개최(2023. 6. 1.)

- 유원도봉아파트 찾아가는 주민설명회(2023. 6. 12.)
- 방학2동 618번지 일대 모아타운 주민설명회(2023. 6. 15.)
- '23. 07월 : 창동주공1단지 찾아가는 주민설명회(2023. 7. 18.)
- 북한산 고도지구 완화 및 모아타운 주민설명회(2023. 7. 25.)
- '23. 09월 : 방학2동 318-2번지 일대 모아타운 주민설명회(2023. 9. 4.)
- 제3기 정비사업 주민학교 개최(2023. 9. 15.)
- 창동주공17단지 찾아가는 주민설명회(2023. 9. 16.)
- 창동주공18단지 찾아가는 주민설명회(2023. 9. 21.)
- '23. 10월 : 창동주공19단지 찾아가는 주민설명회(2023. 10. 05.)
- 창동주공3단지 찾아가는 주민설명회(2023. 10. 21.)
- 창동주공4단지 찾아가는 주민설명회(2023. 10. 28.)
- '23. 11월 : 제4기 정비사업 주민학교 개최(2023. 11. 8.)
- 방학신동아1단지 찾아가는 주민설명회(2023. 11. 18.)
- '23. 11월 : 창동상아1차아파트 정비계획 자문회의(신속지원단)
- '23. 12월 : 쌍문한양1차아파트 정비계획 자문회의(신속지원단)
- '24. 01월 : 방학신동아1단지아파트 정비계획 자문회의(신속지원단)
- '24. 01월 : 창동주공3단지 찾아가는 주민설명회(2024. 1. 20.)
- '24. 01월 : 삼환도봉아파트 정비계획 자문회의(신속지원단)
- '24. 02월 : 쌍문동 81번지 일대 재개발 찾아가는 주민설명회(2024. 2. 1.)

○ 재건축정비사업

- '23. 02월 : 방학신동아1단지아파트 재건축 안전진단 통과
- '23. 03월 : 창동상아1차 · 쌍문한양1차아파트 재건축 안전진단 통과
- '23. 06월 : 준공업지역 용적률 완화 법률 개정에 따라 삼환도봉아파트 사업 재개
- '23. 08월 : 창동주공18단지아파트 재건축 안전진단 통과
- '23. 09월 : 창동주공19단지아파트 재건축 안전진단 통과
- '23. 10월 : 창동동아아파트 재건축 안전진단 비용 용자지원 결정
- '23. 12월 : 방학신동아1단지아파트 신속통합기획 자문사업 신청(주민→구)
- '23. 12월 : 창동동아 · 창동주공4단지 재건축 안전진단 용역 착수
- '24. 02월 : 창동상아1차아파트 신속통합기획 자문회의(서울시)
- '24. 03월 : 쌍문한양1차아파트 신속통합기획 자문회의(서울시)
- '24. 03월 : 창동주공17단지 재건축 안전진단 용역 계약

○ 재개발정비사업

- '23. 01월 : 쌍문3구역 신속통합기획안 주민설명회 개최
- '23. 02월 : 방학동 685번지 일대 재개발사업 정비계획 수립을 위한 용역 시행
- '23. 03월 : 쌍문3구역 재개발사업 신속통합기획 확정

- '23. 05월 : 쌍문3구역 재개발사업 주민 공람공고 및 주민설명회 개최
- '23. 07월 : 쌍문3구역 재개발사업 구의회 의견청취
- '23. 09월 : 도봉제2구역 주택재개발정비사업 공사 착공
- '23. 10월 : 쌍문3구역 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정 요청
- '23. 11월 : 쌍문동 81번지 일대 신속통합기획 수시 공모 신청
- '23. 12월 : 쌍문3구역 서울시 도시계획위원회 심의(수정가결)
- '24. 02월 : 쌍문3구역 주택정비형 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시
- '24. 02월 : 방학동 685번지 일대 신속통합기획안 주민설명회 개최
- '24. 02월 : 방학동 685번지 일대 재개발사업 신속통합기획 확정
- '24. 03월 : 쌍문동 81번지 일대 재개발사업 신속통합기획 후보지 선정

○ 소규모주택정비사업

- '22. 11월: 청한빌라 및 우이빌라 일대 모아타운 지정 용역 착수
- '23. 03월: 청한빌라 및 우이빌라 일대 SH참여 모아타운 공공관리 시범사업 선정
- '23. 05월: 청한빌라 및 우이빌라 일대 주민설명회 개최
- '23. 09월: 방학동 618 및 쌍문동 460 일대 모아타운 대상지 선정
- '23. 11월: 청한빌라 및 우이빌라 일대 모아타운 선 지정
- '23. 12월: 방학동 618 및 쌍문동 460 일대 모아타운 지정 용역 착수
- '24. 01월: 창동 501-13 일대 모아타운 대상지 선정

○ 도심 공공주택 복합사업

- '23. 01월 : 방학역·쌍문역 동측·쌍문역 서측 설계공모 시행
- '23. 03월 : 방학역·쌍문역 동측·쌍문역 서측 설계공모 당선작 발표
- '23. 07월 : 방학역·쌍문역 동측 복합사업계획승인 신청
- '23. 10월 : 방학역·쌍문역 동측 공공주택통합심의위원회 ‘조건부가결’
- '23. 12월 : 창2동 주민센터 인근 도심복합사업 주민설명회 개최
- '23. 12월 : 쌍문역 서측 복합사업계획승인 신청
- '23. 12월 : 방학역·쌍문역 동측 복합사업계획승인

■ 향후 계획

○ 정비사업 주민지원

- '24. 01월~ : 찾아가는 정비사업 주민상담실 운영
- '24. 01월~ : 찾아가는 재건축사업 주민설명회 운영
- '24. 04월~ : 정비사업 주민학교 운영
- '24. 01월~ : 정비사업 카카오톡 채널 운영
- '24. 01월~ : 찾아가는 (재개발·모아타운) 주민설명회 운영 ‘정비사업 무엇이든 물어보세요’

○ 재건축정비사업

- '24. 04월 : 방학신동아1단지아파트 신속통합기획 자문회의(서울시)
- '24. 04월 : 삼환도봉아파트 신속통합기획 자문회의(서울시)
- '24. 04월 : 창동동아·창동주공4단지아파트 재건축 안전진단 용역 준공
- '24. 06월 : 창동상아1차·쌍문한양1차아파트 정비계획 입안제안(주민→구)
- '24. 06월 : 창동주공18단지·창동주공19단지 신속통합기획 자문사업 신청(주민→구)
- '24. 06월 : 창동주공17단지아파트 재건축 안전진단 용역 준공

○ 재개발정비사업

- '24. 04월 : 쌍문3구역 주택정비형재개발사업 조합직접설립을 위한 공공지원 용역
- '25. 04월 : 방학동 685번지 일대 재개발사업 정비구역 지정
- '25. 12월 : 도봉제2구역주택재개발정비사업 준공
쌍문동 81번지 일대 재개발사업 정비구역 지정

○ 소규모주택정비사업

- '24. 05월 : 청한빌라 및 우이빌라 일대 모아타운 지정 요청
- '24. 05월 : 방학동 618 및 쌍문동 460 일대 주민설명회 개최
- '24. 06월 : 청한빌라 및 우이빌라 일대 모아타운 지정
- '24. 10월 : 방학동 618 및 쌍문동 460 일대 모아타운 지정 요청
- '24. 12월 : 방학동 618 및 쌍문동 460 일대 모아타운 지정
- '25. 03월 : 창동 501-13 일대 모아타운 지정 요청
- '25. 05월 : 창동 501-13 일대 모아타운 지정

○ 도심 공공주택 복합사업

- '24. 12월 : 방학역·쌍문역 동측 보상협의 및 주민 이주 개시
- '24. 12월 : 쌍문역 서측 사업계획 승인

23

고도지구 완화를 통한 지역균형 발전 도모

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●			●	●		●		●			●
주관부서	도시계획과장 조한철 ☎2091-3550 도시계획상임기획팀장 이상범 ☎3591 담당 박경희 ☎3593													

현황

- 고도지구는 1990년 북한산 국립공원 주변에 지형여건을 고려하지 않고 일률적으로 지정되어 주거환경 낙후 및 지역간 불균형을 초래하고 있어, 노후된 주거환경 개선 및 균형발전을 위해 고도지구 완화가 필요한 실정임.

사업목표

- 고도지구의 합리적 조정을 통해 노후 주거지 환경개선 및 주택 공급 확대
- 간선도로인 도봉로를 축으로 하는 지역발전을 도모하고 지역간 불균형 해소

사업개요

- 고도지구 지정개요
 - 위치 : 북한산 주변 고도지구(도봉1동, 방학2·3동, 쌍문1동 일대)
 - 면적 : 1.163km² (전체 3.557km², 강북구 2.394km²)
 - 결정고시 : 1990. 12. 10. (서울시고시 제404호)
 - 규제사항 : 20m 이하
- 추진기간 : 2021. 11. ~ 2024. 12.
- 주요내용
 - 고도지구 지정 목적에 부합하는 범위 및 높이 재설정 등을 위한 우리구 완화(조정)방안 마련
 - 우리구 완화(조정)방안을 서울시와 적극적 건의 또는 협의
 - 고도지구 완화(조정) 방안에 대한 도시관리계획 변경 절차 이행

<도봉구 용역 현황>

- 용역명 : 북한산 주변 용도지구(고도지구) 관리방안 수립 용역
- 용역기간 : 2021.11.~2022.11. (12개월간)
- 과업내용 : 고도지구 실태조사 및 문제점 분석을 통한 고도지구의 합리적 관리방안 마련

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
고도지구 완화(조정)방안 마련																
고도지구 완화(조정) 방안의 서울시 건의 또는 협의																
고도지구 완화(조정) 방안에 대한 도시관리계획 변경 절차 이행																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025	
계	100	100	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	100	100	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
고도지구 완화(조정)방안 서울시 건의 및 도시관리계획 변경	진행률 (%)	목표	100	30	60	100	-	-	95
		실적	95	50	90	95			

■ 추진실적

- 2022. 8. ~ 9.: 고도지구완화 관련 실무협의 (2회)
 - (시) 도시계획과 ↔ (구) 도봉·강북구 실무회의 개최 (2022. 8. 31.)
 - (시) 도시계획과장 ↔ (구) 도시관리국장 협의 개최 (2022. 9. 15.)
- 2022. 9.: 고도지구 완화 건의 (3회)
 - 서울시장 ↔ 당·정 협의회 고도지구 완화 건의 (2022. 9. 5.)
 - (시) 정책특보 ↔ (구) 부구청장 고도지구 완화 관련 건의 (2022. 9. 20.)
 - 「북한산 고도지구(도봉구) 완화」 건의 공문 제출 (구→시) (2022. 9. 23.)
- 2022. 10. : 「북한산 주변 고도지구 관련 시·구 간담회」 참석
- 2022. 11. : 시장 - 구청장 면담

- 2022. 11. : 고도지구 해제 청원 서명서 서울시 제출(39,474명)
- 2023. 03. : 서울시장 ↔ 당·정 협의회 건의 (고도지구경계 합리적 조정요청)
- 2023. 06. 30. : 서울시장 도봉구 현장방문 (고도지구 현장설명 및 건의)
신(新) 고도지구 구상(안) 발표 (서울시)
- 2023. 07. 06. ~ 20. : 도시관리계획(고도지구) 결정(변경)(안) 등 열람공고
- 2023. 07. 21. : 도시관리계획(고도지구) 열람의견서 제출
[주민 1,929명(사안별 8건), 도봉구 2개부서(사안별 2건)]
- 2023. 07. 25. : 고도지구 완화에 따른 주민설명회 개최 (도봉구)
- 2023. 09. 07. : 서울시의회 의견청취 (결과 : 보류)
 - 사유 : 추가 의견 수렴을 거쳐 재상정
- 2023. 11. 21.: 서울시의회 도시계획균형위원회 고도지구 현장방문
 - 장 소 : 덕성여대 차리미사기념관 옥상
 - 참 석 자 : 도시계획균형위원회 위원 9명 등 40여명
 - 방문목적 : 현장방문 및 주민의견 수렴
- 2023. 11. 29.: 서울시의회 의견청취 (결과: 원안동의)
- 2024. 01. 17.: 서울시 도시계획위원회 심의 (수정가결)
 - 주요내용 : 제1종일반주거지역 고도지구 해제 및 용도지역으로 관리
개별건축물 건축시 최고높이 : 20 → 28m이하
재건축·재개발 등 주택정비사업시 최고높이 45m까지 허용
- 2024. 03. 01.: 도시관리계획 (고도지구) 결정(변경) 재열람공고
- 2024. 03. 14.: 도시관리계획(고도지구) 재열람의견서 제출
 - 제출의견 : 고도지구 높이 및 역세권 조건 완화 등
[주민 440명(1건), 도봉구 2개부서(3건)]

■ 향후 계획

- 2024. 5월 : 서울시 도시계획위원회 재심의
 - 재심의 사유 : 국회의사당 주변 고도지구 관계기관 재협의
- 2024. 6월 : 도시관리계획 재열람공고 및 결정고시

24

새로운 도시환경변화를 고려한 용도지역 상향 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●		●	●		●		●			●
주관부서	도시계획과장 조한철 ☎2091-3550 도시관리팀장 남원오 ☎3561 담당 박서연 ☎3563 도시계획상임기획팀장 이상범 ☎3591 담당 이성인 ☎3594													

현황

○ 용도지역 현황

(단위 : km² / %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비 고
도 봉 구	20.84 (100)	8.71 (41.8)	0.27 (1.3)	1.47 (7.1)	10.39 (49.8)	GB : 10.2
서 울 시	605.6 (100)	325.97 (53.8)	25.59 (4.2)	19.98 (3.3)	234.06 (38.7)	GB : 149.13

- 도봉구 상업지역은 구 전체 면적의 1.3%로서 서울시 평균(4.2%)에 못 미치는 상황이며, 주거지역 또한 서울시 평균(53.8%)보다 낮은 41.8%를 차지하고 있음.

사업목표

- 지구단위계획 수립(변경) 또는 각종 정비사업 시행 시 용도지역 상향을 통한 지역 활성화 도모 및 역세권 기능 강화

사업개요

- 지구단위계획을 통한 용도지역 상향(상업지역 약 24,000m², 주거지역 약 20,000m²)
 - 방학역세권 지구단위계획 내 용도지역 조건부 상향 가능지 지정(근린상업지역 상향)
 - 쌍문생활권중심 지구단위계획 재정비 용역 추진(준주거지역 상향)
(창동·상계 신경제중심지 개발사업 효과 연계를 위한 용도지역 종상향 검토 중)
 - 도봉역세권 지구단위계획 재정비 추진(제3종일반주거지역 상향)
(도원초 부지 개발 방안 마련 및 용도지역 종상향 검토 중)
- 개발사업을 통한 용도지역 상향(상업지역 약 3,000m², 주거지역 약 74,000m²)
 - 도봉동 622-8번지 일대 역세권 활성화사업(근린상업지역 상향)
 - 도심 공공주택 복합사업(준주거지역 상향)
(역세권 3개소 사업계획승인 추진, 재건축재개발과 소관)
 - 쌍문동 724번지 신속통합기획 주택재개발사업(제2종(7층), 제3종 → 제2종, 제3종일반주거상향)
(정비계획 수립 용역 시행 중, 재건축재개발과 소관)

■ 추진일정

○ 지구단위계획을 통한 용도지역 상향

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
방학역세권 지구단위계획 결정																
쌍문생활권중심 지구단위계획 결정																
도봉역세권 지구단위계획 결정																

○ 개발사업을 통한 용도지역 상향

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
도봉동 622-8번지 역세권 활성화사업 결정																
도심 공공주택 복합사업 사업계획 승인																
쌍문동 724 신속통합기획 정비계획 수립 등																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,774	834	940	540	200	200	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	886	424	462	262	100	100	-	-	-
구비	888	410	478	278	100	100	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
용도지역 상향 추진	추진율 (%)	목표	100	20	30	50	90	100	40
		실적	40	30	40				

■ 추진실적

- 2022. 9. 29. : 방학역세권 지구단위계획 결정(변경) 고시
 - 용도지역 조건부 상향가능지 지정(제3종일반주거 → 근린상업, 약 24,000㎡)
- 2022. 12. 2. : 쌍문생활권중심 지구단위계획 재정비 용역 중간보고
- 2023. 3. 17. : 쌍문동 724 신속통합기획 확정(시)
- 2023. 5.18.~6.19. : 쌍문동 724 정비계획 수립 및 정비구역 지정을 위한 주민 공람공고
- 2023. 7. 19. : 쌍문동 724 정비계획안 구의회 의견청취(구)
- 2023. 7. 24. : 도봉역세권 지구단위계획 재정비 용역 계약 및 착수
- 2023. 8. 4. : 도심공공주택 복합사업계획 승인 접수에 따른 관련부서 협의(쌍문역 동측 및 방학역)
- 2023. 7.~11. : 쌍문생활권중심 지구단위계획 재정비(안) 시구합동보고회(총2회)
- 2023. 11. : 도봉역세권 지구단위계획 재정비 교통영향평가 및 소규모 환경영향평가 용역 계약 및 착수
- 2023. 12. 29. : 도심공공주택 복합사업계획 승인(쌍문역 동측 및 방학역)
 - 제2종일반주거지역 → 준주거지역(약 24,000㎡)
- 2023. 12. 28. : 쌍문동 724 서울시 도시계획위원회(수권소위)심의 (수정가결)
- 2024. 2. 22. : 쌍문동 724(쌍문3구역) 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시

■ 향후 계획

- 2024. 5. : 쌍문생활권중심 지구단위계획 재정비(안) 시구합동보고회(재자문)
- 2024. 5.~12. : 쌍문3구역 조합 직접설립 공공지원 업무(용역) 수행
- 2024. 하반기 : 도심공공주택 복합사업계획 사공사 선정, 보상협의(쌍문역동측 및 방학역)
- 2024. 하반기 : 도심공공주택 복합사업계획 승인(쌍문역 서측)
 - 제2종일반주거지역 → 준주거지역(약 41,000㎡)
- 2024. 하반기 : 도봉동 622-8번지 일대 역세권 활성화사업 결정 고시
 - 제2종일반주거지역 → 근린상업지역(약 3,000㎡)
- 2024. 하반기 : 쌍문생활권중심 지구단위계획 결정(변경) 고시
 - 제2종·제3종일반주거지역 → 준주거지역(약 15,000㎡)
- 2024. 하반기 : 도봉역세권 지구단위계획 재정비(안) 수립

25

화학부대 이전부지 활용방안 마련

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●			●	●		●		●		●	
주관부서	도시계획과장 조한철 ☎2091-3550 도시계획상임기획팀장 이상범 ☎3591 담당 김원규 ☎3592													

현황

- 2016년 이후 방치되고 있는 도봉동 화학부대 이전부지에 대해 중장기적 활용방안 마련 및 주민필요시설 조성을 통해 지역활성화가 필요한 실정임

사업목표

- 도봉산(북한산국립공원)의 자연환경을 활용한 체험형(생태문화, 힐링문화, 테마야영장) 가족테마파크 조성 등 화학부대 이전부지 활용방안 마련
- 지역주민 누구나 언제든지 이용 가능한 문화체육 레저시설 기능 도입

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~
- 부지현황
 - 사업위치 : 도봉구 도봉동 438번지 일원
 - 부지면적 : 71,302㎡(주둔지 35,443㎡, 훈련장 35,859㎡)
 - 도시계획사항 : 개발제한구역, 국립공원, 자연녹지지역
- 주요사업내용
 - 부지개발 방향 설정(서울시 등 관계기관 협의)
 - 기본계획수립 및 타당성조사 용역 시행
- 총사업비 : 114,400백만원(시비 109,600, 구비 4,800)

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
관계기관 협의를 통한 추진방향 설정																
기본계획수립 및 타당성조사 용역 시행																
예산확보 절차이행(중기지방재정계획, 지방투자사업관리센터 타당성조사 및 투자심사 등)																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣	
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025		2026
계	114,400	-	300	-	300	-	-	-	114,100
시비	109,600	-	300	-	300	-	-	-	109,300
구비	4,800	-	-	-	-	-	-	-	4,800

※ 개발사업비는 서울시 등 협의과정에서 확정

- 추정사업비 : 토지매입비(62,500백만원), 공사비(48,600백만원), 기본계획수립·설계 등 용역(3,300백만원)

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
지방투자사업관리센터 타당성 조사까지의 사업진행단계	진행률 (%)	목표	100	5	15	30	60	100	19
		실적	19	5	15	19			

■ 추진실적

- 2022.08.: 동북권 균형발전 및 상생협력 사업발굴 회의
 - <우리구 의견> 동북권 자치구 협력사업의 우선사업으로 선정 요청
- 2022.11.: 시장-구청장 면담(서울시 주도의 개발방안 추진 요청)
- 2022.12.: 2023년도 서울시 예산 확보(기본계획수립 용역비 3억원)
- '23.04. ~ '24.10.: 이전부지 개발 기본계획수립 및 타당성조사 용역 시행(시 동북권사업과)
- 2023.05. ~ 10.: 서울시 용역 보고회 및 협의(5회)
 - 주둔지 및 훈련장 활용방안 논의(국기원, 한옥마을 등)
- 2023.09.06.: <훈련장> 서울시 한옥마을조성 공모사업 선정
 - '23.12. ~ '25.06.: 개발제한구역해제 및 도시개발구역 지정 용역 시행(시 한옥정책과)
- 2024.04.01.: <주둔지> GB 관련 지침 개정 의견 제출(구→시 도시계획과)
 - 제출의견 : 20만㎡ 미만 GB 해제 가능지에 군이적지 포함
- 2024.04.23.: 국기원 이전 관련 관계기관 합동회의(예정)
 - 참석기관 : 문화체육관광부, 서울시, 도봉구, 국기원

■ 향후 계획

주둔지 (국기원)	○ 2024. : 부지개발 방향 설정 및 도시관리계획 변경 추진 ○ 2025. : 타당성조사(지방투자사업관리센터)
훈련장 (한옥 마을)	○ 2024. : 도시개발사업 계획(안) 수립 및 도시관리계획 변경 추진, 한옥마을조성 사업타당성 분석 용역 추진(SH공사) ○ 2025. : 도시개발사업 실시계획인가

26

성대야구장 주상복합단지 개발

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			민간		●			●		●
주관부서	도시계획과장 조한철 ☎2091-3550 도시계획상임기획팀장 이상범 ☎3591 담당 이성인 ☎3594													

현황


- 도봉동 성대야구장은 오랜기간 대규모 나대지로 방치되어 도시환경 저해 및 주민들의 민원이 상존하는 지역으로 서울시 도시계획변경 사전협상을 추진하여 주상복합단지 개발 등 지역경제 활성화가 필요함

사업목표

- 성대야구장 부지를 주거·상업·업무공간으로 개발하여 지역경제 활성화 및 고용창출 도모

사업개요

- 사업기간 : 2014 ~
- 부지현황
 - 위치 및 면적 : 도봉구 도봉로168길 30 / 48,055.8㎡(성대야구장 부지)
 - 도시계획사항 : 제2종일반주거지역, 자연녹지지역
- 주요개발계획(안)
 - 도시계획변경: 용도지역 변경(제2종일반주거·자연녹지→준주거지역), 도시계획시설(학교) 폐지
 - 건축계획: 공동주택, 업무시설, 판매시설 등
 - 공공기여: 도로, 문화예술교육센터, 주민센터, 공공임대주택(300세대), 공공기여금
- 주요사업내용
 - 성대, 서울시 협의를 통한 개발계획(안) 작성 및 제안서 서울시 제출
 - 도시건축공동위원회 자문, 협상정책회의 등 협상이행을 통한 개발계획(안) 확정
- 총사업비 : 652,800백만원(민간재원)
- 주요추진절차(서울시 도시계획변경 사전협상 절차)



■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
성대, 서울시 협의를 통한 개발계획(안) 작성																
관계부서 협의 및 제안서 제출(성대→시)																
도시건축공동위원회 자문, 협상정책회의 등 협상이행 및 개발계획(안) 확정																

※ 현재 성대와 시행사간 분쟁이 지속되고 있어 사업이 지연될 수 있음

■ 소요예산 : 비예산

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
개발계획(안) 확정까지의 사업진행단계	진행률 (%)	목표	100	0	10	30	50	80	3
		실적	3	0	3	3			

■ 추진실적

- 2022.10.27. : 학교-시행사간 채무부존재확인 소송
- 판 결 : 원고(학교) 승소
- 2022.12.06. : 실무 회의 개최(1차)
- 2023.03.10. : 구청장-성균관대학교 총장 면담(조속한 사업 재개 촉구)
- 2023.04.19. : 실무 회의 개최(2차)
- 2023.06.09. : 관학협력TF 구성
- 2023.07.24. : 도봉역세권 지구단위계획 재정비용역 계약 및 착수
- 2023.10.10. : 관학협력TF 회의 개최(1차)
- 2024.01.25. : 관학협력TF 회의 개최(2차)

■ 향후 계획

- 2024.01. ~ 12. : 성대부지 개발방안 검토(도봉역세권 지구단위계획 수립)
- 2024. : 사업재개를 위한 관계기관 지속 협의 추진(서울시, 도봉구, 성대)
- 2025. : 성대, 서울시 협의를 통한 개발계획(안) 작성
- 2027.상반기 : 성대, 서울시 협상 절차 이행 및 개발계획 확정
- 2027.하반기 ~ : 지구단위계획(안) 결정, 건축인허가 및 착공

27

GTX-C 도봉구 전구간 지하화 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●	●					●	●		●	
주관부서	교통행정과장 정은경 ☎2091-4150 미래교통추진팀장 최병연 ☎4191 담당 황지혜 ☎4158													

현황

- GTX-C 도봉구 전구간 지하화 건설 확정 발표(국토부 장관 내방, 2023.5.10.)
- 국토부, 현대건설컨소시엄 실시협약 체결(2023.8.22.)
 - 수도권광역급행철도(GTX) C노선의 2023년 착공, 2028년 개통 발표
- GTX-C 실시설계(구조물 계획) 수립(수도권광역급행철도씨노선주식회사)

사업목표

- 수도권광역급행철도(GTX) C노선의 정상개통을 위한 후속절차 추진 및 공사에 따른 주민 민원 처리 등 행정지원

- GTX-C노선은 지난 국토교통부의 『C노선 재기획 용역』(2015.12.), 『예비타당성 조사』(2018.12.), 『타당성조사 및 기본계획』(2020.10.) 등 수십억의 예산이 투입된 전문용역에서 도봉구간 지하건설 타당성이 검증된 바,
- 도봉구간 지상건설계획을 철회하고 원안인 지하건설로 국가정책에 반영 및 C노선 정상 개통 추진

사업개요

- 사업목적: 도봉구간 지상건설계획 철회 및 C노선 정상개통 추진
- 사업구간(GTX-C): 수원~삼성~청량리~광운대~창동~의정부~양주(84.6km)
 - 도봉구간(지상): 창동~방학~도봉~도봉산(5.4km)
- 사업비: 43,857억원(국비, 민자)

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
서울시 및 국토교통부, 국회 협의 방문 등																

■ 소요예산

(단위: 억원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ④	
			소계 ②	2022	2023	2024	2025		2026
계	43,857	-	26,310	-	-	8,770	8,770	8,770	17,547
국비	21,928	-	13,155	-	-	4,385	4,385	4,385	8,773
기타	21,929	-	13,155	-	-	4,385	4,385	4,385	8,774

※ 산출근거: 수도권광역급행철도 C노선 시설사업기본계획(RFP)[2020. 12. 22.(국토교통부)]

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
서울시 및 국토교통부, 국회 협의 방문 등	회	목표	10	2	2	2	2	2	130
		실적	13	7	6				
GTX-C 도봉구 전구간 지하화 계획 반영	%	목표	100	20	80	-	-	-	100
		실적	100	20	80				

■ 추진 실적

- 2022.01.10.~30.: GTX-C 도봉 구간 지상화 결사반대 주민서명운동 (도봉구)
- 2022.01.25.: GTX-C노선 사업 경원선 공용구간 무단 확장 관련 감사원 공익 감사청구
- 2022.07.22.: 국토교통부장관(원희룡) 면담실시(구청장)
- 2022.08.17.: 국토교통부 방문 협의(국토부, 도봉구)
- 2022.10.17.: 대통령실 시민사회수석 면담(구청장)
- 2022.10.19.: 국토교통부장관(원희룡) 면담실시(구청장)
- 2022.11.02.: 서울시장 면담(구청장)
- 2022.11.10.: 공익감사 결과 발표(감사원)
- 2022.11.18.: 서울시 교통기획관 면담(부구청장)
- 2023.01.12.: 국토부(수도권광역급행철도과) 방문 협의
- 2023.02.08.: GTX-C 도봉구간 지하화 민자적격성조사 통과(적격)
- 2023.02.24.: 국토부(수도권광역급행철도과) 방문 협의
- 2023.05.10.: GTX-C 도봉구 전구간 지하화 확정 및 주민간담회(국토부장관 내방)
- 2023.07.06.: GTX-C 창동역 환승체계 및 개발계획 주민간담회 개최
- 2023.08.16.: GTX-C 환경영향평가 주민설명회 실시
- 2023.08.22.: GTX-C 구조물계획 관련 협의(도봉구, 현대건설컨소시엄)
- 2023.08.28.~09.12.: 구조물계획 관련 지자체 의견조회
- 2023.09.19.: 구조물 설계 관련 주요부서 대책회의
- 2023.11.08.~22.: GTX-C 실시계획 관련 이해관계자 의견청취 공고(도봉구)
- 2023.11.08.~22.: 실시계획 의제 협의(현대건설, 관련부서)

- 2023.11.23.: 이해관계자 의견 회신(區→국토부)
- 2023.12.01.: 구조물계획 의견 조치계획 및 추가 협의(도봉구, 현대건설)
- 2023.12.01.~08.: GTX-C 실시계획 관련 지자체 본협의(도봉구, 국토교통부)
- 2023.12.27.: 실시계획 승인
- 2024.01.25.: 착공식 개최

■ 향후 계획

- 2024년: 보상계획 열람공고 및 국공유지 무상사용 협의 등(재무과, 교통행정과)
- 2024년~2028년: 착공 및 준공

28

1호선 지하화 및 지상부지 활용방안 마련

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
		●		●	●					●	●		●	
주관부서	교통행정과장 정은경 ☎2091-4150 미래교통추진팀장 최병연 ☎4191 담당 권지수 ☎4160													

■ 현황

- 제20대 대통령 공약인 “수도권 도심 철도 지하화”에 경원선(청량리~도봉산) 구간이 포함되어있어 1호선 지하화 실현의 정책적 기반 확보
- 2023 국토교통부 업무계획(2023.01.03.)
 - 철도 지하화 본격화 추진(특별법 마련) 및 법정 종합계획 수립(대상 노선별 사업화 검토)
 - 지상철도 지하화에 따른 유흥지는 생활 중심으로 개발(주거, 상업, 문화 등)
- 2040 서울시 도시기본계획 확정 공고(2023.01.05.)
 - 지상철도 지하화 및 상부공간 데크 활용(지역 간 연결성 확보 등)
- 국토교통부, 「철도 지하화 특별법」 국회 본회의 통과(2024.01.09.)
 - 지상철도 지하화 및 상부 개발사업 통합추진 근거 마련
- 교통분야 「민생토론회」 개최(2024.01.25.)
 - 철도지하화 등 교통정책 추진 선포

■ 사업목표

- 철도지하화 종합계획(국토부) 및 선도 사업지구에 ‘경원선 지하화’ 반영
- 경원선 지하화 관계기관 협의체 구성 및 운영(필요시)(동대문, 성북, 노원 등)
- 철도지하화 상부공간 활용방안 마련

■ 사업개요

- 사업구간(경원선 지하화): 청량리~광운대~창동~도봉산(13.5km)
 - 도봉구간: 녹천~도봉산(5.2km, 5개역)
- 사업비: 미정
- 도봉구간 철도부지 면적: 약 206,000㎡
- 사업내용: 경원선 지하화 및 지상부지 활용

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
서울시 및 국토교통부 협의 방문 등																
협의체 구성 및 대응(필요시, 인근 지자체)																

■ 소요예산

(단위: 억원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	-	-	-	-	-	-	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
서울시 및 국토교통부 협의 방문 등	회	목표	8	-	2	2	2	2	62.5
		실적	5	3	2				
지상부지 활용방안 마련(협의체 공동)	%	목표	100	-	-	20	30	50	0
		실적	0	-	-				

■ 추진 실적

- 2022.10.19.: 국토교통부장관(원희룡) 면담실시(구청장)
- 2022.10.17.: 대통령실 시민사회수석 면담(구청장)
- 2022.11.02.: 서울시장 면담(구청장)
- 2023.08.03.: 국무총리 내방 시 건의
- 2023.12.15.: 제5차 국가철도망 구축계획(안) 반영 건의 (도봉구→서울시)

■ 향후 계획

- 2024. 6. ~ 12.: 「지하화 희망 노선」 지자체 공모 예정(국토부)
 - 지자체 가이드 라인 배포('24.6.), 「지하화 희망노선」 공모 접수('24.9.)
 - 계획성 높은 노선 선도사업지구 선정('24.12.)
- 2024. ~ 2025 : 철도지하화 종합계획 수립(국토부)
 - 철도지하화 노선 최종선정
- 2026. ~ 2027 : 철도지하화 기본계획 수립(서울시)
 - 노선별 세부 추진계획 수립

29

우이~방학선 연장 조기착공 및 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
		●		●	●	●				●	●		●	
주관부서	교통행정과장 정은경 ☎2091-4150 미래교통추진팀장 최병연 ☎4191 담당 황지혜 ☎4158													

현황

- 2020.11.17.: 서울시 제2차 도시철도망구축계획 국토교통부 승인고시
- 우이~신설연장선(우이~방학 경전철) 서울시 재정사업으로 확정 고시
- 2021.03.~2024.02.06.: 우이신설연장선 도시철도 기본계획(안) 수립 및 승인
- 2024.03.19.: 입찰방법 심의 완료(턴키방식 추진 확정)

사업목표

- “우이~방학” 경전철 연장선 서울시 공공투자사업(재정사업)으로 2024년 내 착공
※ 사업방식에 따른 착공 예상 시기: ① 턴키방식 적용 시 → 2024년 말
② 기본 및 실시설계 후 발주 시 → 2026년 하반기

사업개요

- 규 모 : 솔밭공원역~해동로~도당로~방학역(3.94km)
- 사 업 비 : 4,340억원(국·시비)
- 사업방식 : 재정사업(국비40%, 시비60%)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2029년

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
관계기관 협의 방문																
시의원 간담회 개최 등																

■ 소요예산

(단위: 억원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내						장기 ㉣
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,340	-	2,666	-	155	837	837	837	1,674
국비	1,737	-	1,067	-	62	335	335	335	670
시비	2,603	-	1,599	-	93	502	502	502	1,004

※ 산출근거: 우이신설연장선 도시철도 기본계획(안), 서울시

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
관계기관 협의·방문 등	회	목표	10	2	2	2	2	2	100
		실적	10	4	5	1			
우이신설연장선 착공 절차 진척도 (법정계획 수립 및 착공)	%	목표	100	-	20	30	50	-	40
		실적	40	-	19	21			

■ 추진 실적

- 2020.11.17.: 제2차 도시철도망 구축계획 수립
- 2021.03.~: 우이신설연장선 도시철도 기본계획 용역 추진
- 2022.07.11.: 수요예측제조사 실시 확정(기획재정부→서울시)
- 2022.11.02.: 서울시장 면담(구청장)
- 2022.11.18.: 서울시 교통기획관 면담(부구청장)
- 2022.12.22.: 전략환경영향평가서 반려(환경부→서울시)
- 2023.05.04.: 수요예측제조사 통과(예비타당성조사 대비 34.14% 수요 증가)
- 2023.06.14.: 전략환경영향평가 관련 환경부장관 면담(구청장)
- 2023.06.30.: 전략환경영향평가 통과(환경부)
- 2022.06.30.: 서울시장 면담(구청장)
- 2023.07.24.: 2024년도 서울시 본예산 반영 요구사업 자료 제출
- 2023.08.03.: 국무총리 내방 시 건의
- 2023.09.20.: 市, 제2차 도시철도망 구축계획(변경) 자치구 설명회 참석 및 건의
 - ※ 제2차 도시철도망 구축계획(변경) 내 우이신설연장선 정상추진 요청
- 2023.10.13.: 환승편의성 실무위원회 개최(대도시권광역교통위원회)
- 2023.11.10.: 설계적정성 검토 실사단 현장방문(기재부, 서울시, 도봉구)
- 2023.12.04.: 환승편의성 검토 심의 의결(대도시권광역교통위원회)

- 2023.12.27.: 설계적정성 검토 완료(기재부, PIMAC)
- 2024.01.30.: 총사업비 협의 완료(기재부, 총사업비재정심의위원회)
- 2024.02.06.: 우이신설연장선 도시철도 기본계획 승인(국토부)
- 2024.02.27.: 서울시 도시기반시설본부 방문 협의(도봉구)
- 2024.03.19.: 입찰방법 심의 완료(턴키방식 확정)

■ 향후 계획

- 2023.09. ~ 12.: 서울시 주관부서(도시기반시설본부 도시철도부, 교통정책과) 주기적 협의 방문
- 2023.09. ~ 12.: 지역구 국회의원 및 시의원 면담 등을 통한 협조체계구축
- 2024.03. ~ 05.: 행정안전부 『중앙투자심사』 의뢰 및 통과
- 2024.05. ~ 06.: 서울시 추경 반영
- 2024.07.: 입찰공고(턴키)
- 2025년 상반기: 공사 착공
- 착공 후 60개월: 준공

32

방학역 환경개선 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
		●		●			●		●		●		●	
주관부서	교통행정과장 정은경 ☎2091-4150 미래교통추진팀장 최병연 ☎4191 담당 장은경 ☎4158													

■ 방학역사 현황

- 구 조: 선하역사(남·북부역사)
- 승강설비: 에스컬레이터(E/S) 0개소, 엘리베이터(E/V) 4개소
- 승하차인원: 19,534인/일(2023년 11월 기준)
- 신축년도: 1987.06.

■ 사업목표

- 노후역사 개량으로 주변환경 개선 및 구민 역사 이용 편리 도모
- 방학역 환경개선 사업(안) 확정 후 조기 착공 실시

■ 사업개요

- 사 업 명: 방학역 노후역사 개량사업
- 사업주체: 한국철도공사
- 사 업 비: 254억원(국비40%, 한국철도공사60%)
 - ※ 방학역 환경개선 사업(안)에 따라 변동 가능
 - ※ 우리구 사업예산 18.5억원 확보(위탁사업비)
- 추진방향: 남부역사 신축
 - 북부역사 1,2번 출구 존치(에스컬레이터 설치)
 - 남부역사 신축(4번 출구 신설)
- 주요내용
 - 노후된 방학역사 신축을 통한 도시미관 정비 및 이용환경 개선
 - 지역구민 역사 이용 편의를 위한 사업 조기 착공 실시

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
관련기관 협의 및 방문																

■ 소요예산

(단위: 억원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 방학역 환경개선 사업계획 결정에 따른 소요예산 확정 시 작성 예정

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
관계기관 협의 및 방문	회	목표	10	2	2	2	2	2	90
		실적	9	4	4	1			
방학역 노후역사 개량사업 착공	%	목표	100	10	20	70	-	-	40
		실적	40	10	20	10			

■ 추진 실적

○ 2023.03.~05. : 국토부 주관 연석회의(총2회, 국토부·區·한국철도공사)

※ 방학역 신축 방향 협의 완료

○ 2023.09.07. : 투자심의(한국철도공사)

○ 2023.09.21. : 이사회 의 결(한국철도공사)

○ 2023.12.13. : 설계공모(한국철도공사)

○ 2024.03.26. : 설계공모 작품심사 결과 발표[당선:(주)종합건축사사무소 근정]

■ 향후 계획

○ 2024.04. ~ : 설계용역 실시(한국철도공사)

○ 설계 완료 후 36개월 : 노후역사 개량 공사 시행

33

녹천역 에스컬레이터 설치

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●	●			●			●
주관부서	교통행정과장 정은경 ☎2091-4150 미래교통추진팀장 최병연 ☎4191 담당 황지혜 ☎4158													

■ 녹천역사 현황

- 정차노선: 1호선(경원선)
- 구 조: 선상역사(남·북부역사)
- 북부역사 승강설비: 에스컬레이터(E/S) 0개소, 엘리베이터(E/V) 4개소
- 승하차인원: 6,639인/일
- 신축년도: 남부역사(1985), 북부역사(1998)

■ 사업목표

- 교통약자의 녹천역 접근성 향상 및 이동권 보장
 - 에스컬레이터 설치로 인근 대단지 아파트 노약자 및 교통약자의 지하철 접근성 제고

■ 사업개요

- 위 치: 녹천역(경원선)
- 규 모: 에스컬레이터 1기(1번출구), 에스컬레이터 2기(3번출구)
- 사업주체: 한국철도공사
- 사업기간: 2021.09. ~ 2024.12.
- 소요예산: 2,140백만원(구비50%, 한국철도공사 50%)

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
에스컬레이터 인·허가 협조																
관련기관 협의(한국철도공사 등)																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣	
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025		2026
계	1,999	27	1,972	-	1,972	-	-	-	-
구비	1,099.5	13.5	1,086	-	1,086	-	-	-	-
기타	899.5	13.5	886	-	886	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
관련기관 협의(한국철도공사 등)	회	목표	6	2	4	-	-	-	116
		실적	7	2	4	1			
녹천역 에스컬레이터 준공	%	목표	100	40	60	-	-	-	95
		실적	95	40	50	5			

■ 추진실적

- 2021.07.21.: 협약체결(도봉구, 한국철도공사)
- 2021.09.~12.: 실시설계 용역 시행 및 준공(실시설계 합동 회의)
- 2022.07.14.: 도시계획변경 입안신청(한국철도공사→도시계획과)
- 2022.08.02.: 도시관리계획 결정 협의(물관리과→도시계획과)
- 2022.08.11.: 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2022.09.~11.: 하수박스관련 현장조사 실시(물관리과, 한국철도공사)
- 2022.11.07.: 녹천역 에스컬레이터 설치사업 일정변경 공문(공사→구)
- 2022.12.14.: 설계변경(안) 협의 요청(구→한국철도공사)
- 2023.01.~04.: 관련기관 및 부서 의견조회 및 설계변경(안) 확정
- 2023.04.24.: 사업 협약내용 변경 의견조회(한국철도공사→구)
- 2023.05.04.: 협약내용 변경관련 의견 회신(구→한국철도공사)
- 2023.07.~10.: 1번출구 에스컬레이터 공사 시행 업체 계약
- 2023.09.~12.: 3번출구 실시설계 완료
- 2023.11.21.: 사업비 지급 및 공사 착공(구→한국철도공사)

■ 향후 계획

- 2024.05.: 1번출구 공사 준공 및 운행 개시
- 2024.12.: 3번출구 공사 준공 및 운행 개시

34

창동역,쌍문역,도봉산역 대중교통체계 개편

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●			●	●		●		●			●
주관부서	교통행정과장 정은경 ☎2091-4150 미래교통추진팀장 최병연 ☎4191 담당 장은경 ☎4159													

현황

- 관내 지하철역은 주요 간선도로변에 위치하고 있어 접근성은 양호하나 대중교통 소외지역 거주민(특히 교통약자)의 환승(버스↔지하철)은 어려운 실정임
- 관내 대중교통(버스·지하철) 운행현황

총계	버 스						지하철
	소계	직행	간선	지선	시외	마을	
66	63	5	19	14	12	13	3

- 주요 지하철역 버스정차 노선 현황

지하철역명	총계	직행	간선	지선	시외	마을
창동역(1,4호선)	12	-	-	5	-	7
쌍문역(4호선)	20	-	11	2	4	3
도봉산역(1,7호선)	16	2	6	-	7	1

사업목표

- 대중교통 소외지역의 대중교통 이용편의를 도모하고 편리한 대중교통 환승(버스↔지하철)체계 구축을 위한 시내버스 노선조정·신규노선 발굴 및 운행 실시

사업개요

- 용역명: 도봉구 시내버스 노선체계 개편 용역
- 과업내용
 - 대중교통 취약지역의 교통복지 실현 위한 버스노선 조정 및 신규노선 발굴
 - 시내버스 ↔ 지하철간 접근성 강화를 위한 신규노선 발굴
 - 출·퇴근시간대 대중교통 이용불편 해소 목적의 다람쥐버스 노선 발굴
 - 도봉구 ↔ 중계동간 이동편의 목적의 버스 신규노선 발굴 등
- 과업기간: 2022.11. ~ 2023.12.
- 총사업비: 53,500천원(구비)
 - ※ 도봉구 시내버스 노선체계 개편 용역 수행으로 공약 35번과 동시 과업 수행

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
시내버스 노선조정·신규노선 발굴																
노선조정 협의(市, 운수업체 등)																
시내버스 조정·신규노선 승인(市) 및 운행																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 (a)+(b)+(c)	기투자 (a)	임 기 내						장기 (c)
			소계 (b)	2022	2023	2024	2025	2026	
계	53	-	53	-	53	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	53	-	53	-	53	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
시내버스 조정·신규노선 발굴(용역) 및 운행	%	목표	100	20	30	20	20	10	60
		실적	60	20	30	10			

■ 향후 계획

- 2024.01. ~: 시내버스 노선조정 지속 협의(市, 운수업체 등)
- 2024.04. ~: 정기·수시 시내버스 조정·신규노선 승인(市) 및 운행 실시

35

출퇴근 전용버스 도입

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●			●	●		●		●			●
주관부서	교통행정과장 정은경 ☎2091-4150 미래교통추진팀장 최병연 ☎4191 담당 장은경 ☎4159													

현황

- 출퇴근 시간대 버스 차내 혼잡이 극심한 일부 노선의 교통환경 개선이 필요한 실정임
- 공약사항 이행완료 현황: 출근 전용버스 신규운행(2023.01.이후)

노선번호	가·종점	첫차/막차시간 (배차간격)	비 고
8146 (새벽 맞춤버스)	7단지영업소 ~강남역	3:50/4:00 (5분)	· 운행개시일: 2023.01.16. · 주요경유지: 북부지방법원, 도봉구청 ※ 평일만 운행
8101 (출근 맞춤버스)	도봉보건소(중) ~서소문	7:30/8:05 (7분)	· 운행개시일: 2023.02.01. · 주요경유지: 도봉구민회관, 쌍문역 ※ 첫차시간은 도봉보건소 출발기준 ※ 평일만 운행

사업목표

- 서울시의 “출퇴근 시간대 반복운행 버스노선(다람쥐버스)” 우리 구 도입(노선 신설)으로 대중교통 이용불편 완화 지속추진

□ 다람쥐버스(서울시)

- 목적: 버스 차내 혼잡이 극심한 구간에 대하여 출퇴근 시간대 반복운행 버스 노선 신설로 대중교통 이용불편 완화
- 노선 선정조건
 - ① 차내 혼잡정도: 재차인원 60명 이상
 - ② 혼잡구간 길이: 왕복 10km 이내의 단거리
 - ③ 혼잡 지속시간: 1시간 내외

■ 사업개요

○ 용역명: 도봉구 시내버스 노선체계 개편 용역

○ 과업내용

- 대중교통 취약지역의 교통복지 실현 위한 버스노선 조정 및 신규노선 발굴
- 시내버스 ↔ 지하철간 접근성 강화를 위한 신규노선 발굴
- 출·퇴근시간대 대중교통 이용불편 해소 목적의 다람쥐버스 노선 발굴
- 도봉구 ↔ 중계동간 이동편의 목적의 버스 신규노선 발굴 등

○ 과업기간: 2022.11. ~ 2023.12.

※ 도봉구 시내버스 노선체계 개편 용역 수행으로 공약 34번과 동시 과업 수행

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
다람쥐버스 노선 발굴																
노선신설 협의(市, 운수업체 등) 및 승인(市)																
다람쥐버스 신규노선 운행																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 (a)+(b)+(c)	기투자 (a)	임 기 내						장기 (c)
			소계 (b)	2022	2023	2024	2025	2026	
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 공약 34번 예산 활용하여 동시과업 수행(용역)

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
시내버스 조정·신규노선 발굴(용역) 및 운행	%	목표	100	20	30	20	20	10	50
		실적	50	20	30				

■ 향후 계획

○ 2024.04. ~ : 지역간 연계성 강화, 장래 개발사업을 고려한 순환 노선 등 구민의 요구 발생시 출퇴근전용버스 노선신설 승인 협의(市)

36

지능형 교통체계 구축 (보행자 중심 교통체계 실현)

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●			●	●		●		●		●	

주관부서	교통행정과장 정은경 ☎2091-4150 교통시설팀장 김권수 ☎4161 담당 김은주 ☎4164
------	---

■ 현황

- 신호운영 횡단보도 현황 : 364개소
- 보행자 중심 교통안전시설 현황
 - LED 바닥신호등 : 횡단보도 65개소
 - 무인교통단속장비 : 20개소
 - 보행신호 음성안내 보조장치 : 횡단보도 7개소

■ 사업목표

- 보행자 중심 교통환경 조성을 위한 횡단보도 운영방안 개선
- 안전하고 편리한 보행체계 구축을 위한 지능형 교통안전시설 확충

■ 사업개요

- 추진기간 : 2022년~2026년
- 사업대상 : 관내 신호운영 횡단보도

구 분	현황	사업목표	비 고
LED 바닥신호등	65개소	32개소	주요간선도로, 보호구역 대상
무인교통단속장비	20개소	16개소	어린이보호구역 내 설치
보행신호 음성안내 보조장치	7개소	10개소	

- 추진내용
 - 보행신호 및 운영방안 개선 필요지점 현황조사
 - 개선 필요지점 서울시(경찰청) 건의
 - 차량 및 보행안전을 위한 지능형 교통안전시설 도입 설치
 - 어린이보호구역 내 안전한 통학로 확보를 위한 무인교통단속장비 설치
- 총사업비 : 1,810백만원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
현황 및 시설개선 대상지점 조사 및 계획수립																
어린이보호구역 주통학로 보행신호등 교통안전시설 개선																
어린이보호구역 무인교통단속장비 설치																
주요 간선도로 보행신호등 교통안전시설 개선																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,810	-	1,810	380	460	530	440	-	-
국비	905	-	905	190	230	265	220	-	-
시비	905	-	905	190	230	265	220	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
LED 바닥신호등	개	목표	32	8	8	8	8	-	203
		실적	65	15	50				
무인교통단속장비	개	목표	16	4	4	4	4	-	125
		실적	20	13	7				

■ 추진실적

- 2023.3. : 보행자 중심 교통체계 실현을 위한 어린이보호구역 정비계획 수립
 - 추진일정 : 2023.1.~12.
 - 추진내용 : 2023년 지능형 교통안전시설 설치계획, 보호구역 보행신호 정비계획 등
- 2023.12. : 보행자 중심 교통체계 실현을 위한 신호운영 정비계획 수립
 - 추진일정 : 2023.7.~2024.12.
 - 추진내용 : 어린이보호구역 내 횡단보도 등 24개소 횡단보도 보행시간 조정
- 2023.3.~12. : 지능형 교통안전시설 설치 추진
 - 바닥형보행신호등 신설 : 도봉구청 앞 횡단보도 등 50개소 설치 완료
 - 보행음성안내장치 : 동북초교 앞 등 7개소 설치 완료
 - 무인교통단속장비 : 창도초교 등 7개소 설치 완료

- 2024.3. : 보행자 중심 교통체계 실현을 위한 어린이보호구역 정비계획 수립
 - 추진일정 : 2024.1.~12.
 - 추진내용 : 2024년 지능형 교통안전시설 설치계획, 보호구역 보행신호 정비계획 등

■ 향후 계획

- 2024.4.~12. : 횡단보도 보행신호 조정 협의 및 정비
- 2024.4.~12. : 보행자 중심 교통체계 구축을 위한 보행자 횡단 안전시설 등 지능형 교통안전시설 확충

37

자전거(따릉이)로 지하철역 연계 체계 구축

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●			●	●			●
주관부서	교통행정과장 정은경 ☎2091-4150 교통시설팀장 김권수 ☎4161 담당 이영진 ☎4163													

■ 현황

○ 자전거 편의시설 및 자전거도로

- 자전거보관대 : 195개소 4,394(지하철역 761대)
- 공기주입기 : 69개소 72대(지하철역 8대)
- 공공자전거 : 77개소 873대(지하철역 인근 193대)
- 자전거도로 : 11.54km(도봉로 및 방학로)

■ 사업목표

○ 거주지와 지하철역 연계성 확대

- 인구 밀집 거주지인 공동주택에 자전거 편의시설 지원
- 자전거 도로 연계성 및 편리성 향상

■ 사업개요

○ 사업대상 : 자전거 편의시설 지원 및 자전거도로의 연계성과 편리성 향상

○ 사업내용

- 공동주택 자전거 편의시설 지원
 - . 공동주택에 자전거보관대(따릉이 포함) 지원
- 자전거 도로의 연계성 및 이용 편리성 향상
 - . 창동역 인근 자전거도로 정비(씨드 큐브 및 서울아레나 주변)를 통한 중랑천 자전거도로와의 연계성 향상(창동 신경제중심지 조성사업과 연계)
 - . 자전거도로 시인성 강화를 위한 픽토그램 설치(도봉로)

○ 총사업비 : 550백만원

- '22년 : 110백만원, '23년 : 110백만원, '24년 : 110백만원, '25년 : 110백만원, '26년 : 110백만원

☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
주택과, 아파트입주자대표회의	공동주택 자전거 시설 수요조사 및 설치 동의	
도로과, 신경제일자리과	창동역 일대 자전거도로 연계 정비	

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
공동주택 자전거 편의시설 지원																
자전거 도로의 연계성 및 편리성 향상																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	550	-	550	110	110	110	110	110	-
구비	550	-	550	110	110	110	110	110	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
공동주택 자전거보관대(따릉이 포함) 지원	개	목표	720	120	150	150	150	150	82.7
		실적	596	310	170	116			
자전거도로 픽토그램 설치 및 창동역 주변 자전거도로 정비	km	목표	8.04	2.74	2.4	2.4	0.5		63.9
		실적	5.14	2.74	2.4				

■ 추진실적

○ 공동주택 자전거보관대(따릉이 포함) 지원

- 2024년 : 116대 설치(3월)

※ 공동주택의 자전거보관대 수요가 줄고 공기주입기 수요가 늘어 당초 2대에서 5대 지원으로 변경

○ 자전거도로 연계성 및 이용 편리성 향상

- 도봉로 동측(평화도봉공원~우이교사거리 2.4km) 픽토그램 설치 예정(4월)

■ 향후 계획

○ 공동주택 자전거보관대(따릉이 포함) 지원

- 2026년까지 매년 150대 지원

※ 공기주입기 지원과 연계해 탄력적으로 지원 계획

38

주차혼잡지역 공영주차장 확충

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●		●		●			●
주관부서	교통지도과장 조미숙 ☎2091-4200 주차장관리팀장 김홍중 ☎4211 담당 장영주 ☎4215													

■ 현황

- 공영주차장 확보 현황 : 51개소 2,040면
 - 지속적인 주차장 확충에도 불구하고 저층주거지역 주차장 확보율 불균형으로 주차혼잡지역 발생

■ 사업목표

- 주차환경이 열악한 주차혼잡지역에 대한 주차장 확충 우선공급대책 수립
 - 주차장 추가 확보면수: 9개소 176면
- 도봉구를 54개 권역으로 세분화하여 권역별 주차장 확보율을 분석하여 연차별 주차장 확충계획 수립

■ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업대상 : 도봉구 관내 주차혼잡지역
- 사업내용
 - 방학동 661-6 공영주차장 건설 사업 추진
 - 창동 657-125 공영주차장 건설 사업 추진
 - 창동 신창초등학교 지하주차장 건설 사업 추진
 - 저층 주거지(단독주택지역) 공영주차장 건설 사업 추진
- 총사업비 : 30,211백만원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
창동 657-125 공영주차장 건설																
방학동 661-6 공영주차장 건설																
창동 신창초등학교 공영주차장 건설																
쌍문동 지역 공영주차장 건설																
방학동 지역 공영주차장 건설																
도봉동 지역 공영주차장 건설																
창동 지역 공영주차장 건설																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 (a+b+c)	기투자 a	임 기 내						장기 c
			소계 b	2022	2023	2024	2025	2026	
계	30,211	989	29,222	3,763	5,245	6,831	6,000	7,383	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	17,522	-	17,522	385	3,076	6,031	3,600	4,430	-
구비	12,689	989	11,700	3,378	2,169	800	2,400	2,953	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
공영주차장 조성면수	면수	목표	176면	-	26면	20면	30면	100면	6.8%
		실적	12면	-	12면				

■ 추진실적

- 창동 657- 125 공영주차장 건설 : 2022. 7. ~ 2023. 12.
 - 취득계약체결 및 보상 : 2022. 8. ~ 2023. 3.
 - 건축물 해체 심의 및 허가 용역실시 : 2023. 2. 27.
 - 주차장 조성공사 실시설계 용역 : 2023. 06. 15.
 - 건축물 철거공사 시행 : 2023. 08. 10.
 - 공영주차장 운영개시 : 2023. 12. 25.

- 쌍문4동 1공영주차장 증축 공사 : 2023. 1. ~ 2024. 11.
 - 주민설명회 개최 : 2023. 2. 1.
 - 시 보조금 교부(541,000천원): 2024. 3. 8.
 - 시 보조금 간주처리: 2024. 3. 13.
 - 계약심사 요청(서울시): 2024. 4. 12.
- 방학동 661-6 공영주차장 건설 : 2023. 2. ~ 2023. 9.
 - 실시설계 : 2023. 2. ~ 2023. 7.
 - 공영주차장 조성공사 : 2023. 8. ~ 9.
 - 공영주차장 운영개시 : 2023. 9. 18.
- 쌍문동 715-2 공영주차장 건설 : 2023. 3. ~ 7.
 - 한국전력 서울본부 토지 추가사용 협의 : 2023. 3. 23.
 - 창동 변전소 부지 추가 사용 협조 요청 : 2023. 3. 28.
 - 주차장 조성공사 : 2023. 6. ~ 7
 - 공영주차장 운영개시 : 2023. 7. 11.
- 쌍문동 471-30 외 1필지 빈집활용 자투리주차장 건설 : 2023. 7. ~ 2024. 6.
 - SH소유 매입빈집 생활SOC조성(주차장 조성) 회신 : 2023. 7. 14.
 - 시 보조금 교부(35,000천원): 2024. 2. 23.
 - 시 보조금 간주처리: 2024. 2. 26.
- 쌍문동 31-27 빈집활용 자투리주차장 건설 : 2023. 8. ~ 2024. 6.
 - SH소유 매입빈집 생활SOC조성(주차장 조성) 회신 : 2023. 8. 21.
 - 시 보조금 교부(32,100천원): 2024. 2. 23.
 - 시 보조금 간주처리: 2024. 2. 26.
- 도봉동 국철고가하부 공영주차장 건설 : 2024. 3. ~ 2024. 6.
 - 구청장 방침(국철고가하부 유희부지 활용계획) : 2024. 3. 25.
 - 국철고가하부 유희부지 사용가능여부 협의(교통지도과→국가철도공단) : 2024. 3. 26
 - 고가하부 사용가능 통보(국가철도공단→교통지도과) : 2024. 4. 2.
 - 사용허가 신청서 제출(교통지도과→국가철도공단) : 2024. 4. 3.
 - 사용허가서 교부(국가철도공단→교통지도과) : 2024. 4. 12.
 - 도봉동 59-1 공영주차장 조성공사 시행계획 : 2024. 4. 15.

■ 향후 계획

- 쌍문4동 1공영주차장 증축 공사 : 2023. 1. ~ 2024. 11.
 - 공사발주 및 공사 : 2024. 6. ~ 2024. 11.
 - 주차장 운영개시 : 2024. 12. 1.
- 창동 신창초등학교 공영주차장 건설(북부교육지원청 추진)
 - 투자심사 상정 : 2022. 8. ~ 10.
 - 공유재산 심의 : 2023. 03. ~
 - 설계공모 및 설계 : 2023. 9. ~ 2024. 9.
 - 공사착공 및 준공 : 2024. 9. ~ 2027. 9.
- 저층 주거지역내 주차혼잡지역 공영주차장 건설
 - 공영주차장 조성사업 연차별 추진계획 수립 : 2022. 8. ~ 12.
 - 연차별 추진계획에 의거 주차장 조성공사 실시 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 쌍문동 471-30 외 1필지 빈집활용 자투리주차장 건설 : 2023. 7. ~ 2024. 6.
 - 실시설계 : 2024. 1.
 - 주차장 조성공사 : 2024. 4. ~ 5.
 - 공영주차장 운영개시 : 2024. 6. 1.
- 쌍문동 31-27 빈집활용 자투리주차장 건설 : 2023. 8. ~ 2024. 6.
 - 실시설계 : 2024. 1.
 - 주차장 조성공사 : 2024. 4. ~ 5.
 - 공영주차장 운영개시 : 2024. 6. 1.
- 도봉동 국철고가하부 공영주차장 건설 : 2024. 3. ~ 2024. 6.
 - 주차장 조성공사 : 2024. 4. ~ 5.
 - 공영주차장 운영개시 : 2024. 6. 1.

□ 위 치 도(쌍문4동 1공영주차장)



위치도



1층 조감도



2층 조감도


☐ 위 치 도(창3동 신창초등학교)




☐ 현장사진



☐ 위 치 도(쌍문동 471-30 외 1필지)

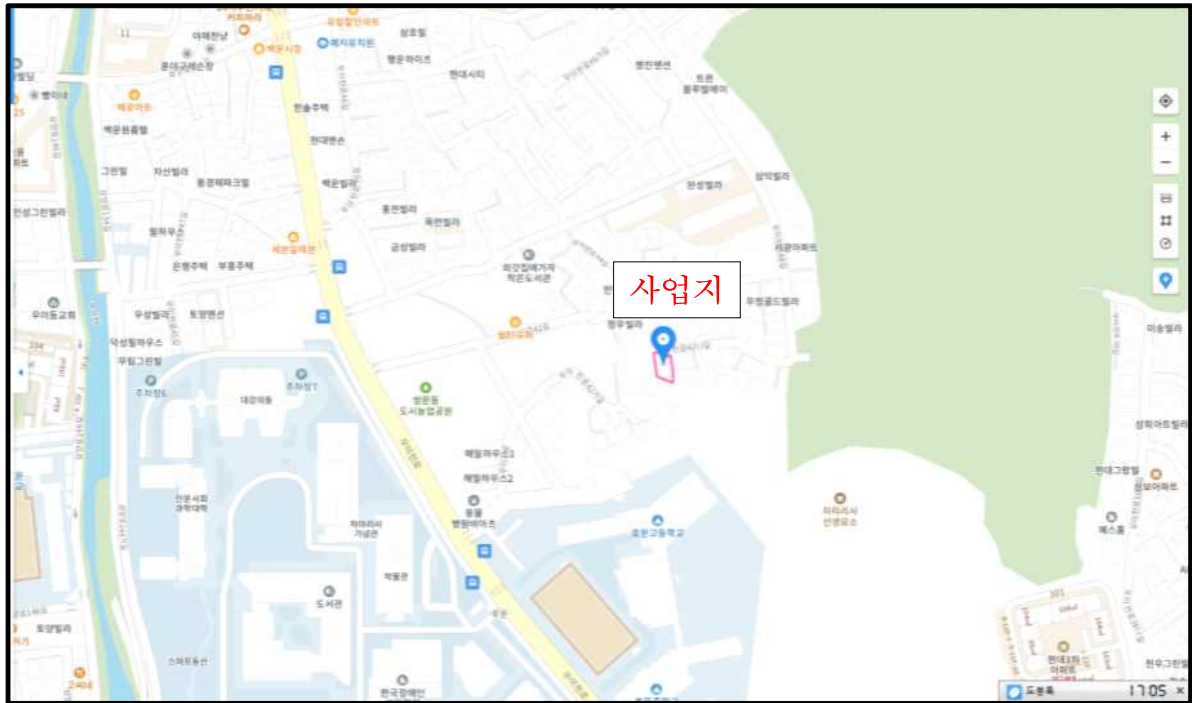

☐ 현장사진

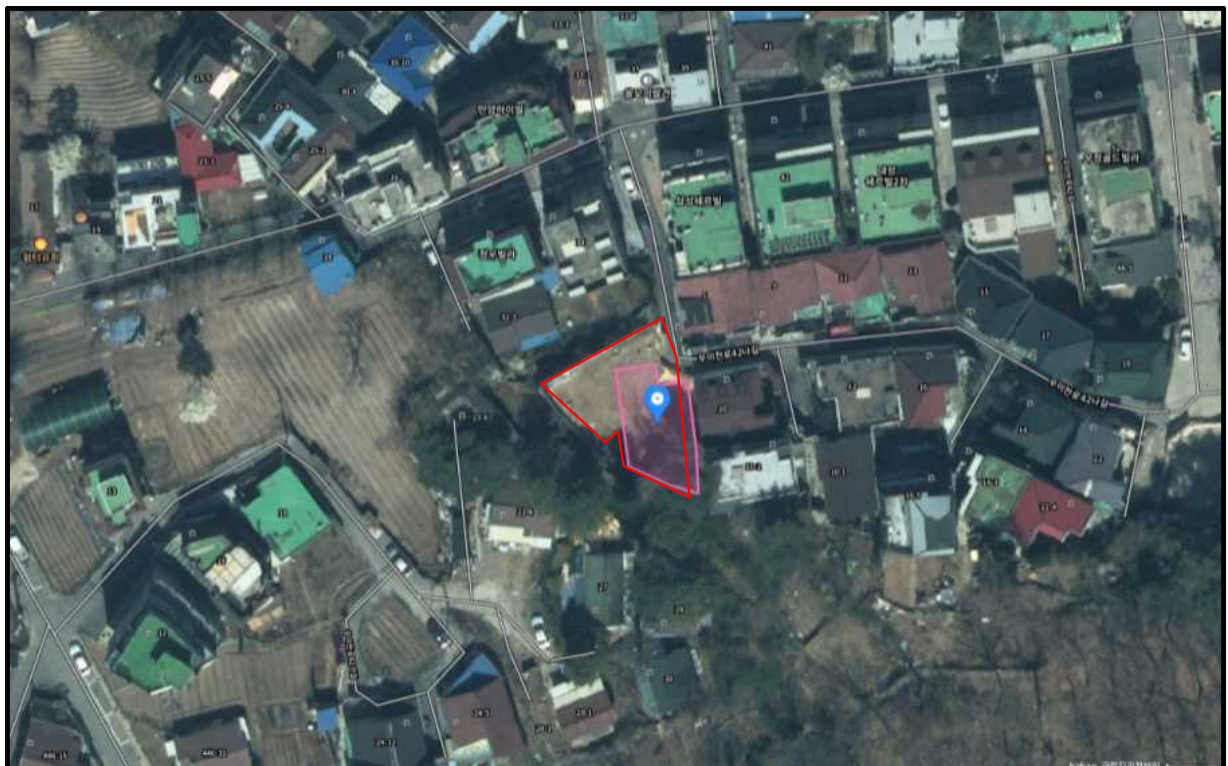

☐ 위치도



☐ 현장사진




위 치 도



현장사진



1번 지점

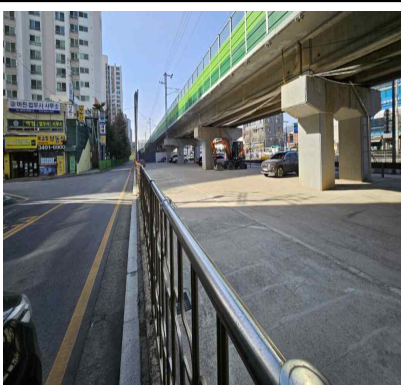

2번 지점



3번 지점

39

동부간선도로 진·출입로 개선

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●		●			●		●			●

주관부서	도로과장 강우영 ☎2091-4050 토목팀장 박현용 ☎4051 담당 최성욱 ☎4057
------	---

■ 현황

- 동부간선도로 확장공사 개통후 기존 진·출입로의 감소로 동부간선도로 전체 차량속도는 개선되었으나 도봉구민의 진·출입 불편

■ 사업목표

- 동부간선도로 진·출입 불편 개선
 - 동부간선도로 진·출입 개선

■ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2025.06.
- 사업규모: 동부간선도로 진·출입 개선
- 주요추진사항
 - 2020.12.30.: 도봉지하차도 개통(동부간선도로 도봉구간)
 - 2021.10.14.: 서울시(도로계획과)와 동부간선도로 협의
 - 출입 개선안(노원교 진출램프, 노곡중학교 진출램프 신설)
 - 2021.11.11.: 동부간선도로 진출·입 의견 제출(도봉구→서울시 도로계획과)
 - 노원교 진출램프 필요, 노곡중학교 진출램프 대신 초안산진입로 개선 대안 제출
 - 2021.12. 7.: 동부간선도로 개선대책 시행(서울시 도로계획과→도봉구)
 - 노원교 진출램프 추진(예산확정), 초안산진출입 개선 검토
 - 2022. 1. 7.: 초안산진출입로 개선 검토 요청(도봉구→서울시 교통운영과)
 - 동부간선도로 속도저하, 과속카메라, 도봉구 U턴, 노원구 별도시설
 - 2022. 3.~ 6.: 초안산지하차도 진출 타당성 검토(용역 시행)
 - 용역 검토결과 용벽 등 구조물로 인해 현 도로 구조상에서는 초안산지하차도 진출로 개설 불가
 - 2022. 8. 3.: 시·구 공동협력을 위한 서울시장-구청장 면담안건 제출
 - 노원교 진출로 예산확보(23년 190억) 및 23년 개통 요청
 - 동부간선도로 진출입 개선을 위한 중장기 개선책 필요

- 2022.11. 2.: 시·구 공동협력을 위한 서울시장-구청장 면담
 - 노원교 진출로 예산확보(23년 220억) 및 23년 개통 요청
 - 동부간선도로(도봉,노원) 진출입 개선을 위한 (타당성)용역비 3억 편성 요청
- 2023. 12.: 노원교 진출연결로 신설 및 확장 공사 시행중
 - 노원교 진출램프 및 노원교 확장구간 기초, 교각, 교대 설치

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
노원교 진출연결로 확장공사																
동부간선도로 진출입 개선 용역 추진																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	28,800	-	28,800	6,000	17,000	5,800	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	28,800	-	28,800	6,000	17,000	5,800	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
동부간선도로 진출입개선 추진율	%	목표	100	30	40	30	-	-	75
		실적	75	30	40	5			

■ 추진실적

- 노원교 진출램프 및 노원교 확장구간 기초, 교각 설치(공정률 34.5%)
 - 풍수해 기간(5.15.~10.15.) 하천공사 중지

■ 향후 계획


- 노원교 진출로: 노원교 진출연결로 신설 및 확장 공사 시행(시 도기본)
 - 2022.10.: 공사착공(22년 예산 60억 확보)
 - 2025.06.: 공사완료(23년 예산 170억 확보, 부족 예산 50억 추가확보예정)
- 동부간선도로 진출입 중장기 개선방안 서울시 용역 추진중(23년 5월~12월)
 - 개선방안 용역안을 검토중으로 준공기한 연장 예정

동부간선도로 노원교 진출램프 신설 및 노원교 확장공사

□ 위치도 및 설치 사진



동부간선도로 개통 전 · 후 진출입 현황

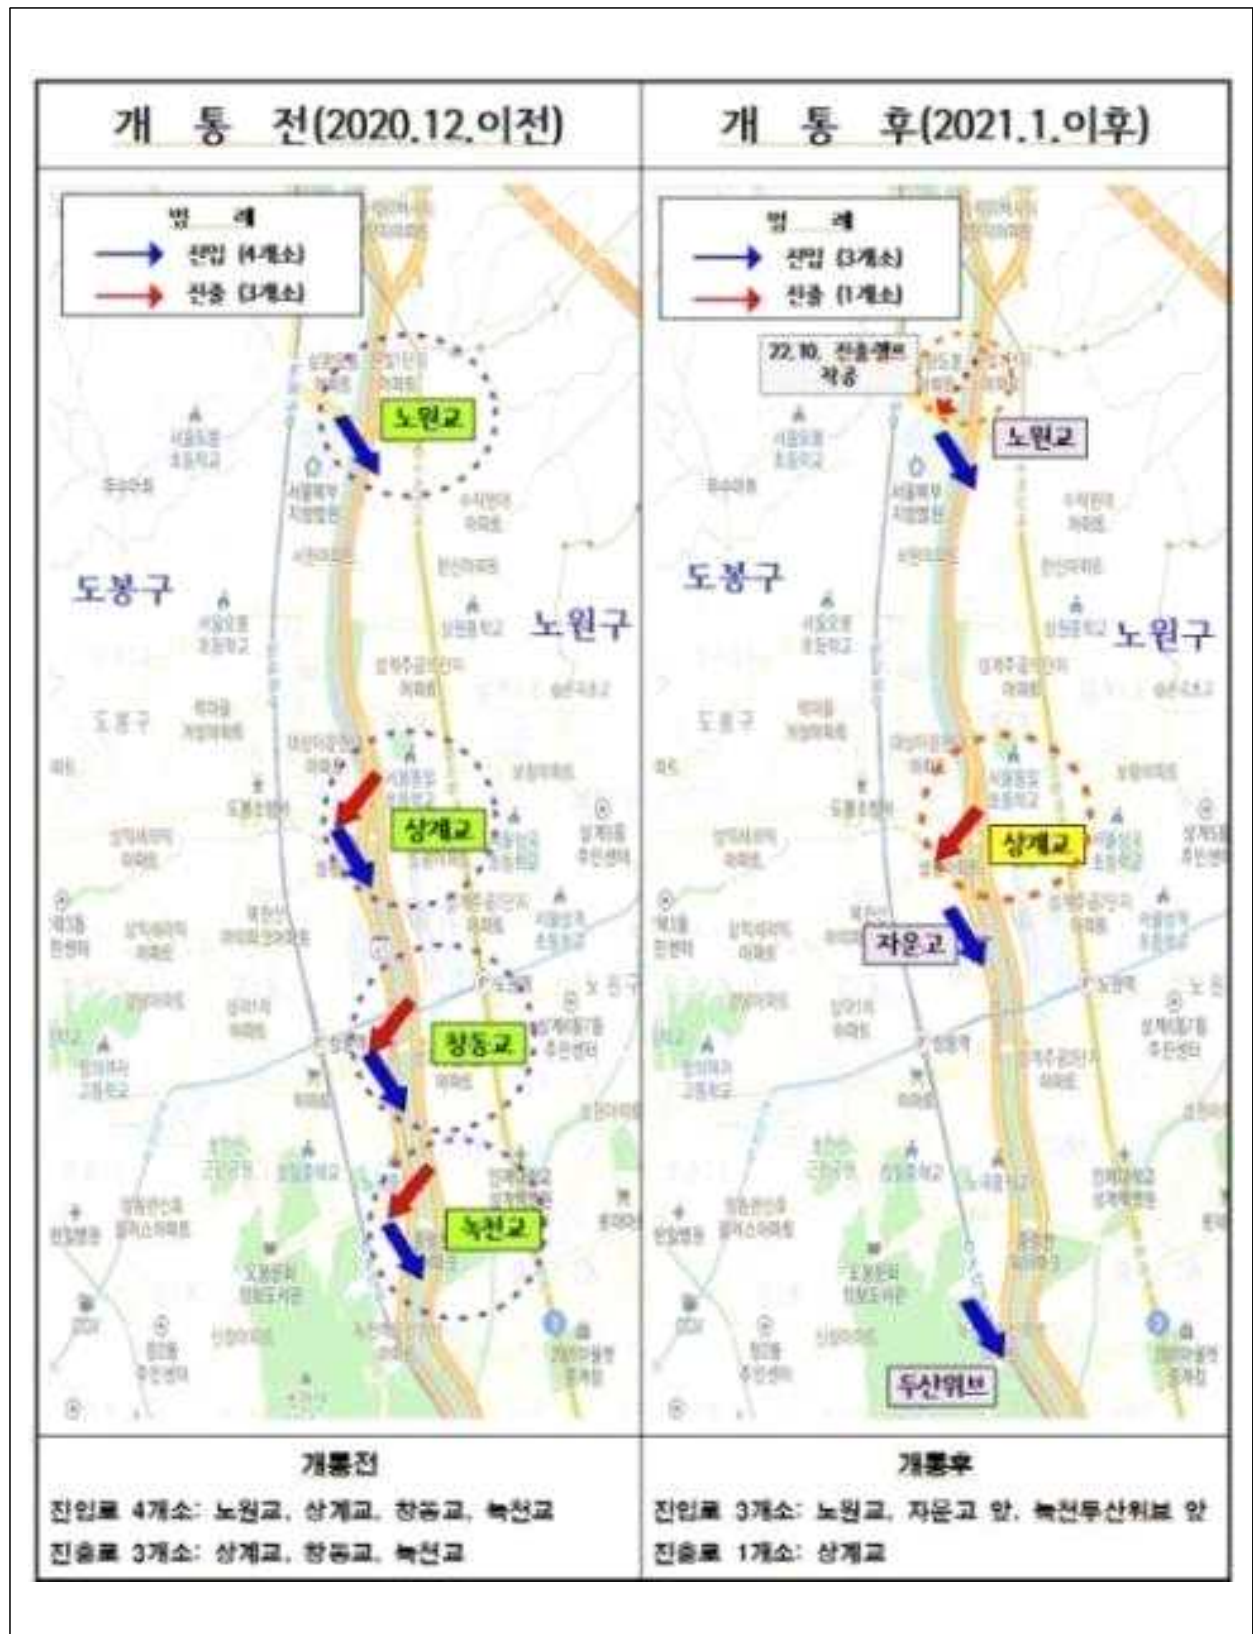

40

유치원 및 학교 환경개선사업 지원 확대

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●		●		●			●
주관부서	교육지원과장 이승희 ☎2091-2300 교육지원팀장 백상목 ☎2311 담당 홍석조 ☎2312													

■ 현황

○ 학교 및 유치원 현황

구분	계	유치원	초등학교	중학교	고등학교					특수 학교
					소계	일반	특성화	특목고	자율고	
계	74	28	23	13	9	5	2	1	1	1
공립	49	11	21	11	5	4	1			1
사립	25	17	2	2	4	1	1	1	1	

○ 2024년 시설환경 개선 관련 교육경비보조금 교부 현황

- 서울가인초 등 39개교 1,179,800천원 교부
- 유화유치원 등 25개원 221,311천원 교부

■ 사업목표

○ 노후하고 위험한 학교 시설을 개선하여 쾌적하고 안전한 교육 환경 제공

■ 사업개요

○ 추진근거

- 지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정(대통령령)
- 서울특별시 도봉구 교육경비 보조에 관한 조례

○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.

○ 사업대상 : 도봉구 관내 74개교(유치원 28, 초 23, 중 13, 고 9, 특수 1)

○ 총사업비 : 7,195,000천원(전액 구비)

○ 심 의 : 교육경비보조금 심의위원회

- 구 성 : 위원장(부구청장) 및 부위원장(행정안전국장) 포함 11명
- 심의기준 : 긴급성, 위험성, 시설 노후 정도 등을 감안하여 선별 지원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
예산편성																
교육경비보조금 신청·접수 및 학교 교부																
교육경비보조금 정산																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	7,195	-	7,195	1,250	1,445	1,450	1,500	1,550	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	7,195	-	7,195	1,250	1,445	1,450	1,500	1,550	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
학교 시설환경개선 관련 편성예산 교부율	%	목표	100	95	96	97	98	100	100
		실적	100	100	100				

■ 추진실적

- 2024. 3. : 2024년 시설환경 개선 관련 교육경비보조금 교부
 - 서울가인초 등 39개교 1,179,800천원, 서울방학유치원 25개원 221,311천원 교부

■ 향후 계획

- 2024. 12. ~ 2025. 2. : 2024년 교육경비보조금 정산
- 2025. 1. : 2025년 교육경비보조금 지원 계획 수립

41

국립공원 도봉산 주차시설 확충

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●			●	●		●		●			●
주관부서	교통지도과장 조미숙 ☎2091-4200 주차장관리팀장 김홍중 ☎4211 담당 장영주 ☎4215													

■ 현황

- 도봉산 주변 공영주차장 운영 현황 및 실태
 - 도봉산 공영주차장 : 135대(승용 130대, 대형 5대)
 - 도봉산역 환승주차장 : 364대(승용 364대)
 - 도봉1동 자투리 공영주차장 : 13대(승용 13대)
- 도봉산 주변 대형버스 주차장 확보 현황
 - 도봉산 공영주차장 승용차 주차면에 대형버스 5면이 주차 가능하도록 설치 운영중

■ 사업목표

- 도봉산 주변 주차장 확보 : 138대(승용 138대, 대형 15대 별도 확보)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사업대상 : 도봉동 282-28 외 2필지(도봉동 287-1, 282-26)
 - 도봉산 공영주차장(도봉동 282-26) : 137대(승용 130대, 대형 7대)
 - 도봉동 자투리 공영주차장(도봉동 287-1) : 13대(승용 13대)
 - 도봉동 282-28 나대지 : 야채 등 경작
 - 도봉동 282-30 외 4필지 : 아진교통차고지
- 사업내용 : 도봉산 입구 주변에 관광버스 이용객을 위한 대형차 주차공간 및 승용차 주차공간 추가 확보
 - 1안) 도봉산 입구 주변 부지매입(입체화 조성) 및 도봉산 주차장을 활용한 공영 주차장 확충
 - 2안) 도봉산 주차장 입체화를 통한 공영주차장 확충
 - 3안) 아진교통차고지의 도봉권역 공영차고지 이전을 통한 공영주차장 확충
- 총사업비 : 10,377백만원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
도봉산 주차시설 확충 사업																

■ 소요예산

○ 1안(부지 매입을 통한 공영주차장 조성)

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	10,377	-	10,377	30	2,174	8,173	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	4,098	-	4,098	-	-	4,098	-	-	-
구비	6,279	-	6,279	30	2,174	4,075	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 2안(도봉산 공영주차장 입체화)

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	7,858	-	7,858	10	-	3,000	4,848	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	7,848	-	7,848	-	-	3,000	4,848	-	-
구비	10	-	10	10	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
주차장 확보	개소 수	목표	1개소	-	-	-	1개소	-	0
		실적	0	-	-				

■ 추진실적

- 공영주차장 조성을 위한 타당성 용역 실시 : 2023. 3. ~ 10.
- 타당성 용역 중간회의 실시 : 2023. 6. 22.

- 국립공원 도봉산 입구 주차시설 확충에 따른 협의 : 2023. 8. 25.
(서울시 주차계획과, 버스정책과, 조경과, 재산관리과, 공원여가과)
- 도봉산 입구 주차시설 확충 관련 의견 회신 : 2023. 8. 30.
 - 버스정책과 : 도봉산 공영차고지는 시내버스 노선 유지를 위하여 존속이 필요한 시설로 대체 차고지가 확보되지 않는다면 타 용도로 전환 검토 불가
- 국립공원 도봉산 입구 주차시설 확충에 따른 협의 회신 : 2023. 9. 14.
 - 공원여가과 : 서울시 관련부서(공원여가정책과) 및 국토교통부 사전 협의 대상이며, 개발제한구역 내 도시계획시설 결정 및 시유지 재산관리관 관련사항은 해당 부서(도시계획과, 조경과)와 별도 협의
- 국립공원 도봉산 입구 주차시설 확충에 따른 회신 : 2023. 11. 8.
 - 서울시 재산관리과 : 도봉구청이 공용 또는 공공용으로 사용하려는 경우에는 수익계약으로 매각 가능
- 국립공원 도봉산 입구 주차시설 확충에 따른 회신 : 2023. 11. 16
 - 서울시 조경과 : 도봉동 282-237번지는 자연녹지지역내 수목이 생육하고 있는 공공용 행정재산으로 매각 불가
- 도봉산 주차시설 확충을 위한 타당성 조사 및 기본 계획 수립 용역 준공 : 2023. 11. 30.
- 국립공원 도봉산 주차시설 확충 추진계획 구청장 보고 : 2024. 2. 7.

■ 향후 계획

- 토지소유주 협의 및 도시계획시설 결정 : 2024. 01. ~ 12.
- 서울시 투자심사 상정 : 2024. 7. ~ 12.
- 주차장 실시설계 및 조성공사 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 공영주차장 운영개시 : 2026. 1. 1. 부터

☐ 위치도



☐ 현장사진



42

도봉산 관광활성화를 위한 중장기 발전계획 수립

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●		●		●			●

주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 문화관광팀장 윤석봉 ☎2261 담당 곽정순 ☎2552
------	---

■ 현황

- 도봉산 관광 활성화를 위한 케이블카 등 관광인프라 설치·운영, 도봉산 관광 특구 지정, 유스호스텔 유치, 숙박시설 확충 방안 등 “도봉산 관광 활성화를 위한 중장기 발전계획” 수립 필요
- 창업 및 문화산업단지('23. 7.), 서울로봇인공지능과학관('24. 10.), 서울사진미술관('24. 5.), 서울아레나('27. 11.) 준공 예정에 따라 창동신경제 조성사업과 연계한 관광산업 활성화 방안 요구

■ 사업목표

- “도봉산 관광 활성화를 위한 중장기 발전계획” 연구용역을 통해 도봉구 관광활력 증진 및 지역경제활성화 도모

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2024. 4.(※ 용역기간: 13개월)
- 사업내용 : 도봉산 관광활성화를 위한 중장기발전 계획 수립
 - 도봉산 케이블카(또는 모노레일 등) 등 관광인프라 시설 설치·운영 방안
 - 관광특구 지정 추진, 유스호스텔 유치, 숙박시설 확충 및 이용 활성화 방안
 - ‘서울아레나’와 K-pop 공연 연계한 한류 관광상품 개발 및 활성화 방안
 - ※ 향후, 서울아레나와 연계한 공연콘텐츠를 활용한 아트테인먼트 상품 개발 방안
 - IoT, AI, AR·VR 등 4차 산업기술 발달에 따라 변화하는 관광환경에 대응하고 관광객의 체험성 강화를 위한 “스마트관광 기반 산업 육성” 방안 등
 - 평화문화진지·올림픽 이용 활성화 방안
 - 도봉산 수제 양조장 추진, 도봉산 주차시설 확충 등과 연계하여 활성화 할 수 있는 방안 수립
- 총사업비 : 132,000천원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
학술연구용역 심의																
도봉산 관광 활성화 방안 연구용역 추진계획 수립 및 과업지시서, 제안요청서 작성																
사업 발주 및 공고, 제안서평가위 개최																
과업수행 및 착수, 중간, 최종보고회, 준공																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 (a)+(b)+(c)	기투자 (a)	임 기 내						장기 (c)
			소계 (b)	2022	2023	2024	2025	2026	
계	132	-	132	-	132	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	132	-	132	-	132	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
도봉산 관광 활성화 중장기 계획 연구용역 시행률	%	목표	100	15	80	100	-	-	75
		실적	75	15	75	-			

■ 추진실적

- 2022. 7.~ 8.: 타· 시도 문화관광 활성화 용역 사례 및 과업내용 검토
- 2022. 9.: 「도봉산 관광진흥 활성화 발전 기본계획」 수립(구청장 방침)
- 2022. 10.: 학술연구용역 심의(원안가결)
- 2022. 11.: 케이블카 시공업체 자문 실시(DL: 대림건설)
- 2022. 11.~12.: 우수 문화관광시설(춘천 삼악산 케이블카 등) 벤치마킹 실시
- 2023. 1.: 「도봉산 관광진흥 중장기 발전계획 용역 추진」(구청장 방침)
- 2023. 2.~3.: 입찰공고 및 제안서평가위원회 개최를 통한 업체 선정
- 2023. 4.: 계약(2023.4.6. ~ 10.31.) 및 착수보고회 개최(2023.4.7.)
- 2023. 5: 노선검토, 시공업체 전문가 자문(대명 등) 및 현장답사
- 2023. 6.~7.: 하부승강장 후보지(5개소) 검토
- 2023. 6: 케이블카 조성 관련 설문조사(모바일, 현장 등)
※ 대상: 서울시민 1,000명(6.21.~ 6.30.)
- 2023. 8: 외국인 관광객 실태조사 관련 관계기관 협의(서울관광재단)
- 2023. 9: 평화올림픽 활성화를 위한 우수시설 벤치마킹(유알컬처파크)
- 2023. 10.: 용역 준공기한 연장(1차)
- 2023. 11.: 관광인프라 조성지 확대 검토(자원순환센터 및 평화올림픽 일대)
- 2023. 12./2024. 2.: 용역 준공기한 연장(2,3차)

■ 향후계획

- 2024. 4.: 최종보고회 개최 및 준공
- 2024. 4.: 도봉산 관광활성화 중장기 발전계획 수립

43

도봉산 맑은 이미지를 활용한 수제 양조장(craft brewery) 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
일부추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●		●		●			●
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 문화관광팀장 윤석봉 ☎2261 담당 성영서 ☎2265													

■ 현황

- 지역특색을 반영한 체험형 관광시설 부재

■ 사업목표

- 관광·체험에서 지역 일자리 창출까지 연계된 복합공간을 조성, 새로운 관광자원 개발
 - 도봉산 맑은 이미지를 활용한 양조장을 건립하여, 관광명소로 개발
 - 수제맥주 등을 브랜드화 하여, 도봉구 관광홍보 자원으로 활용
 - 전문기술을 통한 지역 청년들의 취업, 창업 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 장 소 : 도봉구 관내
- 사업대상 : 2030세대 및 도봉구 방문 관광객
- 사업내용 : 도봉산 맑은 이미지를 활용한 수제 맥주 양조장 건립
 - 지역청년 대상 양조기술 전문교육 지원, 청년 인재 양성
 - 관광공사 등과 협업하여 여행·관광 사이트 정보 제공
 - 도봉구 관광자원과 연계하여 지역 관광코스로 활용
 - 수제맥주를 브랜드화 하여 도봉구 및 도봉산 홍보
- 총사업비 : 593백만원
- 기대효과 : 지역관광 활성화 및 일자리 창출
 - 견학·체험 시설을 조성하여 2030세대 및 관광객들이 즐겨 찾는 관광명소 개발
 - 전문기술교육을 통한 청년들의 취업 및 창업지원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
추진계획 수립 및 벤치마킹																
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역																
양조장 건립 실시설계 용역																
양조장 건립공사 실시 및 준공																
양조장 사업운영자 선정																
양조장 및 직업 전문 과정 운영																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	593	-	593	-	450	89	27	27	-
국비	400	-	400	-	400	-	-	-	-
구비	193	-	193	-	50	89	27	27	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
양조장 건립 공사 공정률	%	목표	100	-	40	100	-	-	25
		실적	25	-	25	-	-	-	

■ 추진실적

- 2023. 1.: 수제 양조장 건립 타당성 조사 용역 추진 계획 수립
- 2023. 3.: 연구 용역 기관 선정 및 용역 시행
- 2023. 4. 1.: 우이천 빛 축제 중 도봉산 브랜드 수제 맥주 시음회 개최
- 2023. 10.30.: 타당성 조사 용역 최종보고회 개최
- 2024. 3.: 수제 양조교육장 조성 기본계획 수립

■ 향후 계획

- 2024. 4. ~ 2024. 6.: 양조교육장 조성 공사 시행 및 준공
- 2024. 7. ~ 12.: 양조교육장 운영개시 및 직업전문과정 운영

44

구민이 체감하고 즐길 수 있는 문화도시 구현

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●	●			●			●
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 문화정책팀장 김연수 ☎2251 담당 김진희 ☎2254													

■ 현황

- 대규모 공연 위주의 행사 추진에서 벗어나 일상 속 문화예술 향유 기회 확대를 위한 사업 추진 필요성 증대
- 기존 거리예술공연에 추가하여 구민이 직접 체감하고 즐길 수 있는 함께하는 문화예술 행사에 대한 수요 증가

■ 사업목표

- 구민이 주체로 참여하는 ‘구민과 함께하는 문화예술행사’ 추진을 통한 문화도시 도봉 구현

■ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업장소 : 도봉구 전역
- 사업내용
 - 구민이 단순한 관람객에 머물지 않고 문화예술의 주체로서 참여할 수 있는 행사 추진
 - 관내 곳곳에서 다양한 분야의 문화예술행사 추진(공연, 전시, 플래시몹, 교육 등)
 - 문화예술 사각지대를 발굴하여 문화적 혜택을 고르게 제공
 - 지역경제 활성화를 위한 브랜드 축제 다양화 및 구민 운영 프로그램 강화
- 총사업비 : 2,319백만원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
함께하는 문화예술사업 계획 수립																
함께하는 문화예술사업 추진																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내					장기	
	㉠+㉢+㉣	㉠	소계 ㉢	2022	2023	2024	2025		2026
계	2,329	-	2,329	280	469	510	520	550	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	2,329	-	2,329	280	469	510	520	550	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
문화예술행사 공연자 중 구민 참여율	%	목표	90	70	75	80	85	90	93
		실적	84	70	77	84	-	-	

■ 추진실적

- 2023. 1.: 함께하는 문화예술행사 추진계획 수립
- 2023. 2.: 정월대보름 달맞이축제 총 공연자 132명 중 지역예술인 90명(68%)
- 2023. 3.: 우이천 빛 축제 총 공연자 70명 중 지역예술인 57명(81%)
- 2023. 6.: KBS 전국노래자랑 도봉구편 총 출연자 28명 중 지역주민 23명(82%)
- 2023. 7.: 서울시향 우리동네음악회 개최 관람객 332명
- 2023.10.: 도봉 그린뮤직 동행 페스타 총 공연자 227명 중 지역예술인 178명(78%)
- 2023.10.: 도봉 등 축제 총 공연자 61명 중 지역예술인 53명(87%)
- 2024. 2.: 정월대보름 달맞이축제 총 공연자 105명 중 지역예술인 95명(90%)
- 2024. 3.: 도봉 벚꽃 축제 총 공연자 129명 중 지역예술인 102명(79%)

■ 향후 계획

- 구민 참여형 브랜드 축제 개최
 - 동행그린뮤직페스타, 도봉 등 축제 등 구 대표 축제 개최 시, 도봉구 지역 예술인이 직접 참여하는 공연 운영 등

45

지역문화예술인 지원 확대

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●		●		●			●
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 문화정책팀장 김연수 ☎2251 담당 이영주 ☎2282													

현황

- 코로나19의 장기화로 대면·집적 특성을 가진 문화예술계에 유례없는 위기 발생
- 소득감소와 고용불안정으로 생계에 타격을 입고 있으나 지속적인 지원체계 미비

사업목표

- 문화 생태계 보호, 고용·복지 사각지대 해소 및 안정적 문화예술 활동 지원
- 예술인 복지증진을 통한 지역문화 예술 진흥

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : ① 관내 거주자(필수) ② 예술인 활동 증명서 보유자(또는 도봉구에서 활동한 경력이 있는 자) ③ 건강보험 가입자 중 기준 중위소득 120%미만에 해당하는 자
- 사업내용 : 공모를 통한 문화예술행사 참여 기회 부여 및 시범사업 진행, 생계 위기 예술인 등 지원
 - 세미트로트, 락, 국악, 퍼포먼스, 미술 등 다양한 분야별 인원을 모집(심사 후 선발)하고 무대 참여 기회를 제공
 - 음향 장비, 무대 디자인, 작품 설치 등 지원 및 사례비 지급
- 총사업비 : 150백만원

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
추진계획 수립																
지원사업 추진																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣	
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025		2026
계	150	-	150	-	30	35	40	45	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	150	-	150	-	30	35	40	45	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
지역문화예술인 지원 확대 사업 참여자	팀	목표	260	-	50	60	70	80	33.8
		실적	88	-	43	45	-	-	

■ 추진실적

- 2023. 2. 9.~ 2.10.: 지역문화 예술인 지원 확대 사업 추진 계획 수립 및 모집 공고 게재
- 2023. 3. 15.~5.15.: 최종 43팀 103명 합격
- 2023. 4.: 우이천 빛 축제 출연(16팀)
- 2023. 4. ~ 12.
 - 상설공연: 도봉극장(총 57팀 18회 출연), 야외(버스킹) 공연(총 25팀 7회 출연)
 - 초청공연: 신년 인사회, 초안산 가드닝센터 개관식, 도봉 책축제, 도봉깨비, 도봉중소기업 양말페스타, 창동역 희망장터 등(총 5회, 10팀 출연)
- 2023. 7.~: 개청 50주년 축하 공연 출연
 - 문화예술로 도봉의 50년을 기념하다II - 찾아라! 우리소리(37팀 68명 참여)
- 2023. 10. 6. ~ 10. 28.: 2023. 도봉 그린뮤직 동행 페스타, 2023. 도봉 등 축제, 제4회 도봉구립교향악단 총 24팀 출연
- 2024. 1. ~ 3.: 2024. 지역문화 예술인 선발 및 운영 계획 수립 및 최종 사업 대상자 45팀, 145명 선발
- 2024. 3.29. ~ 3.30.: 문화경제도시 2024. 도봉 벚꽃 축제 6팀, 22명 참여

■ 향후 계획

- 2024. 4. ~ 12.: 지역문화예술인 홍보 추진 및 문화예술 행사 추진 시 사업 대상자 참여 우선권 부여(야외 공연 및 도봉구 주최 행사 출연 예정)

46

지역예술인이 참여하는 도시재생사업

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
완료	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●	●			●			●
주관부서	재건축재개발과장 나현천 ☎2091-3400 도시재생팀장 김태수 ☎3431 담당 박정아 ☎3433													

현황

- 지역예술인이 참여하여 골목길지도 및 스토리보드 설치 완료(22.12.)

사업목표

- 도시재생사업에 지역예술인을 참여시켜 문화도봉 구현
- 주거환경 개선으로 삶의 질 향상

사업개요

- 사업기간 : 2021.10. ~ 2023.12.(지역예술인 참여기간: '22. 7. ~ ' 22.12.)
- 사업대상 : 쌍문동 414번지 일대, A=20,067m²
- 사업내용 : 노후 지역 개선을 위한 각종 정비 사업 시행
 - 골목경관 조성 : 골목정원(꽃길) 조성, 하천 홍수방호벽 개선 등을 통한 보행환경 및 골목 외관 개선
 - 보행안전 조성 : CCTV, 방범벨, 소화기 설치 등으로 안심골목 조성
 - 주민거점 조성 : 파출소 외부 공간 및 지역 내 나대지 활용 휴게 쉼터 조성 등
 - ※ 지역예술인 참여 분야 : 골목 경관 조성을 위한 디자인 구조물 설치 등
- 총사업비 : 1,100백만원(매칭비율 : 시90%, 구10%)
 - ※ 지역예술인 참여 사업비 : 37백만원

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
실행계획 수립 용역 시행																
기반시설 정비 공사 등 시행																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣	
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025		2026
계	37	-	37	37	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	37	-	37	37	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
참여 지역예술인 수	명	목표	10	10	-	-	-	-	100
		실적	10	10	-	-	-	-	

■ 추진실적

- 2022.08.22. : 「골목길지도 및 스토리보드 디자인 제작 설치 용역」 계약 및 착수
- 2022.09.05. : 서울시 골목길재생 검토위원회 심의 승인
- 2022.10.13. : 도봉구 공공디자인 진흥위원회 심의 승인
- 2022.12.19. : 「골목길지도 및 스토리보드 디자인 제작 설치 용역」 준공

47

다목적 체육시설 확충

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●		●		●		●	
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 체육시설팀장 유상근 ☎2541 담당 김아진 ☎2543													

■ 현황

- 실내체육시설: 3개소
 - 창동문화체육센터, 도봉동 실내스포츠센터, 도봉동 실내스포츠센터 별관
- 실외체육시설
 - 다락원체육공원(축구장, 게이트볼장, 배드민턴장, 테니스장)
 - 초안산근린공원(축구장, 풋살구장, 배드민턴장)
 - 야외운동기구(20개소 159대)

■ 사업목표

- 다목적 체육시설을 확충(건립)하여 구민의 체육활동 수요에 대응하고 지역 주민의 체력증진 및 여가생활 공간을 확보

■ 사업개요

- 쌍문 종합 체육센터 건립
 - 사업기간 : 2018. 9. ~ 2024. 4.
 - 사업위치 : 쌍문동 265, 265-2, 산 79-9 일대
 - 사업규모 : 부지면적 3,748㎡(연면적 4,989㎡), 지하1층/지상3층
 - 사업내용 : 다목적 체육센터 건립(수영장, 실내체육관, 헬스장 등)
 - 총사업비 : 27,085백만원(국비 3,000, 시비 5,451, 구비 18,634)

■ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024
	1	2	3	4	1	2	3	4	1
- 공사 진행 및 준공									

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉡+㉢	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉢	
			소계 ㉡	2022	2023	2024	2025		2026
계	27,085	18,121	8,964	6,964	2,000	-	-	-	-
국비	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-
시비	5,451	2,387	3,064	3,064	-	-	-	-	-
구비	18,634	12,734	5,900	3,900	2,000	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
쌍문 종합 체육센터 건립	추진율(%)	목표	100	50	70	100	-	-	95
		실적	95	20	53	95	-	-	

○ 공사기한 연장사유

- 2022년 하절기 강우로 인한 공사불능
- 선덕고등학교 시험기간 소음자제 요청에 따른 공사중단
- 한양아파트 소음·진동 민원발생에 따른 굴착공사 지연
- 현장여건(진입로 조성, 지반상태 등)에 따른 터파기(토사/풍화암/연암) 작업량 증가
- 주차장 램프 하부 중력식 옹벽 추가공사로 인한 기간 소요

■ 추진실적

○ 추진경과

- 2018. 9.: 쌍문동 다목적체육센터 건립계획 수립
- 2018. 11.: 국민체육센터 공모사업 선정 및 국비 30억 확보
- 2021. 10.~ 2024. 4. : 공사 착공 및 진행
 - ※ 2024. 3. 31.기준 공정률: 95% (내부마감재 공사 중)

■ 향후 계획

○ 2024. 4. : 건립공사 진행 및 공사 준공

48

청소년 복합 체육관 신설 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
정상추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●			●	●		●		●		●	
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 체육시설팀장 유상근 ☎2541 담당 김아진 ☎2543													

현황

- 도봉생활권 내 청소년 전용 체육관 부재 및 청소년·아동복지시설 서울시 평균 미만(2030 서울생활권계획)
- 소방학교 이전부지 개발사업 계획 변경결정 및 지역 필요시설 의견조회
 - 기존 해당부지 내 서울시 청년혁신파크 건립 사업 미추진(사유: 경제적 타당성 및 활용률 저조로 사업 철회)결정 후, 대안으로 지역 필요시설 의견조회
 - 도봉구→서울시: 어린이·청소년 전용 체육관 건립 제안('21. 9. 27.)

사업목표

- 청소년 복합 체육관을 건립하여 아동·청소년의 체육활동 장려 및 생활체육 시설 서비스 사각지대 해소
- 도봉구 4대 권역 중 유일하게 실내 체육관이 없는 방학동 지역 스포츠 인프라 확대

사업개요

- 청소년 복합 체육관 건립
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 2028. 12.(26년 착공, 28년 준공 예정)
 - 사업위치 : 방학동 708(도봉소방학교 이전부지)
 - 사업규모 : 연면적 4,120㎡(지상3~4층)
 - 사업내용 : 실내체육관, 가상현실 스포츠실 등
 - 총사업비 : 25,054백만원(시비 15,107 구비 9,947)

추진일정 (서울시와 협력 추진)

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 서울시 사업계획 변경 관련 실무협의 (市동북권사업과, 체육진흥과↔區 평생학습체육과)																
- (市) 사업계획 변경 검토 및 확정 - (區) 청소년복합체육관 건립계획 수립, 구유재산심의(적정)																
- (市) 설계공모, 기본·실시설계, 심의· 인허가, 투자심사, 공사 착공																
- (市) 공사 진행('26년) 공사 준공('28년) 및 개관																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025	
계	25,054	-	2,129	-	-	-	2,129	22,925
시비	15,107	-	871	-	-	-	871	14,236
구비	9,947	-	1,258	-	-	-	1,258	8,689

※ 2024년 설계공모 예산지원: 키즈카페 예산(시비 24억) 우선 사용

■ 공약달성 확인지표

(단위: %)

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률(%)
청소년 복합 체육관 조성	추진율(%)	목표	100	10	20	50	75	100	20
		실적	20	10	20	-	-	-	

■ 추진실적

- 2021.09.: 시 의견조사에 따라 어린이·청소년 전용체육관 건립 제출
- 2022. 1. ~ 2023. 3.: 관련부서 실무자 협의 및 도입시설 결정
- 2023.05.: 청소년 복합 체육관 건립계획 수립(도봉구)
- 2023.07.: 도봉소방학교 이전부지 내 조성사업 변경 추진계획 수립(서울시)
- 2023.07.: 공유재산 심의의결 결과 조건부 동의(서울시, 도봉구)
- 2023.08.: 서울시 공유재산심의회 심의(조건부 적정)
- 2023.09.: 공유재산관리계획안 서울시의회 원안 가결(조건부 적정)
- 2023.11.: 도봉구 공유재산심의(적정)

■ 향후 계획

- 2024.04.~: 2차 타당성 조사 (서울시)
- 2024.07.: 중앙투자심사 심의(서울시)
- 2024.08.: 설계공모 시행(서울시, 도봉구-예산지원)
- 2024.09.: 도봉구 공유재산관리계획 심의
- 2025.02.: 기본 및 실시설계 용역(도시기반시설본부 건축부)
- 2026.01.: 공사발주 및 착공(도시기반시설본부 건축부, 도봉구)

※ 기술심사담당관의 공기적정성 심의 결과에 따라 변동 예정

- 2028.12.: 준공 및 개관(서울시, 도시기반시설본부 건축부, 도봉구)

49

도봉구체육회 종목별 지원 확대

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●			●			●		●		●			●
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 생활체육팀장 최봉근 ☎2531 담당 이승섭 ☎2532													

■ 현황

- 도봉구체육회 현황
 - 구성: 임원 및 이사(38명), 직원 14명(사무국장 1명, 직원 4명, 지도자 8명)
 - 위치: 도봉구 노해로 279-5(창동)
- 종목별 단체 현황 : 34개 종목, 350개 클럽, 13,190명

■ 사업목표

- 도봉구체육회 종목별 단체 지원을 통한 생활체육 활성화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상 : 도봉구체육회 종목별 단체
- 사업내용
 - 종목별단체 정기대항전 지원 및 동호인단체 육성지원
 - 우수체육인 단체 지원, 학교체육시설 사용료 지원
 - 동호인재능기부활성화 지원
- 총사업비 : 1,624백만원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
정기대항전 및 동호인단체 육성지원																
우수체육인 단체 지원																
학교체육시설 사용료 지원																
동호인재능기부 활성화																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣	
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025		2026
계	1,624	-	1,624	291	310	331	341	351	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	1,624	-	1,624	291	310	331	341	351	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
종목별 단체 지원 예산확보율 ((예산액/지원목표액)*100)	%	목표	1,624	291	310	331	341	351	56
		실적	907	291	310	306	-	-	

■ 추진실적

- 종목별단체 정기대항전 지원 및 동호인단체 육성지원
 - 구청장기(배) 대회: 23건, 136,450천원
 - 협회장기(배) 대회: 12건, 28,000천원
 - 기타 대회 등: 23건, 34,460천원
- 우수체육인 단체 지원: 6개 단체 운동용품 지원 등 22,000천원
- 학교체육시설 사용료 지원: 13개 클럽 23,617천원
- 동호인재능기부 활성화 지원: 태권도시범단 운영경비 37,500천원 (연 25,000천원)

■ 향후 계획

- 2024년~2026년까지 도봉구체육회 종목별단체 지원예산 확보 및 지원확대
- 형평성 있는 보조금 지원을 통한 생활체육 단체 균형발전 도모

50

체계적이고 지속적인 청소년 정책을 위한 청소년지원센터 설립

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중양도움	
완료	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●	●			●			●

주관부서 | 아동청소년과장 김동현 ☎2091-3850 아동청소년친화팀장 박세정 ☎3851 담당 유동오 ☎3855

현황

○ 구립 청소년시설 7개소 위탁운영

시 설 명	소 재 지	운 영 법 인	위·수탁 기간	직원현황
창동 청소년문화의집	덕릉로62길 89	한국청소년지원 네트워크	2021. 6. 1. ~ 2026. 5. 31.	관장 포함 6명
쌍문동 청소년문화의집	시루봉로2길 34	YES21 청소년재단	2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	관장 포함 6명
도봉동 청소년문화의집	도봉로180나길 33-61	YES21 청소년재단	2021. 8. 1. ~ 2026. 7. 31.	관장 포함 6명
쌍문동 청소년랜드	노해로 140	DTS행복들고나	2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	센터장 포함 12명
도봉청소년 누리터워드	덕릉로59길 18	한국청소년지원 네트워크	2021. 6. 1. ~ 2026. 5. 31.	팀장 포함 4명
도봉 청소년상담복지 센터	노해로69길 132	YES21 청소년재단	2021. 7. 1. ~ 2024. 6. 30.	센터장 포함 11명
도봉 청소년독서실	마들로 605	도봉구 시설관리공단	2023. 6. 1. ~ 2028. 5. 31.	관장 포함 4명

사업목표

- 체계적이고 지속적인 청소년 정책 추진
- 청소년시설의 일괄 운영으로 도봉구만의 전문적인 청소년 사업 모델 구축

사업개요

- 추진기간: 2022. 8. 1. ~ 2023. 5.
- 추진방법: 관내 청소년시설 운영의 열악성 해소 및 청소년 정책 전문성 제고를 위한 청소년지원센터 설립
- 사업예산: 65백만원

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
청소년지원센터 설립 및 운영에 관한 조례 제정																
사무공간 조성																
시간선택제임기제공무원 채용																
센터 개소																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ㉠+㉢+㉣	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣	
			소계 ㉢	2022	2023	2024	2025		2026
계	65	-	-	-	65	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	65	-	-	-	65	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
청소년지원센터 설립	개소	목표	1	-	1	-	-	-	100
		실적	1	-	1				

■ 추진실적

- 2023. 3. 도봉구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 개정 위한 법제처 입법 컨설팅 의뢰 및 결과 회신
- 2023. 3. 시간선택제임기제다급 공무원 채용 방침서 수립
- 2023. 6. 시간선택제임기제다급 공무원 1명 채용(청소년지도사 자격증 소지자)
- 2023. 6. 사무공간 조성(아동청소년과 아동청소년친화팀 사무실 내)
- 2023. 7. 도봉구-한국청소년활동진흥원 업무협약 체결
- 2023. 7. 도봉구 청소년시설 지역별 브랜딩 연구용역 실시
- 2023. 8. 『서울특별시 도봉구 청소년활동시설 및 청소년지원센터 설치·운영에 관한 조례』 전부 개정 및 공포
- 2023. 8. 청소년지원센터 개소식 및 청소년시설 간담회

■ 향후 계획

- 청소년지원센터 운영으로 청소년정책 개발 및 청소년시설 통합관리 추진체계 구축
- 청소년시설과의 협력 강화를 위해 청소년 유관기관 협의회 개최

51

재건축·재개발 지원을 위한 전담부서 신설

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
완료	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●	●			●			●
주관부서	행정지원과장 박종우 ☎2091-2100 인사팀장 강기탁 ☎2111 담당 박윤식 ☎2112													

■ 현황

- 재건축·재개발의 속도감 있는 추진을 위해 팀 또는 부서별 분산된 기능을 재구조화하여 해당 지역 현안사업 신속 추진 필요

■ 사업목표

- 민선8기 주요 정책사업인 도시계획 및 재건축·재개발 사업의 체계적이며 주도적인 추진을 위한 전담부서 신설
 - 도시개발지원 TF팀 구성(2022. 7. 11.): 도시계획 및 재건축·재개발사업 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. 11. ~ 12. 31.
- 사업대상 : 재건축·재개발 등 도시개발 분야
- 사업내용 : 재건축·재개발 추진 전담부서 신설(2023. 1. 1.)

※ 도시개발지원 TF팀 추진사항

- 고도지구 관리방안 및 생활권계획 실행방안 수립
- 재개발, 재건축사업 관련 지원 및 소규모 주택정비사업 지원
- 성대야구장 개발 추진 및 준공업지역 관련 업무
- 역세권 활성화사업 관련 업무
- 총사업비 : 33백만원(조직개편 용역비)

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
전담부서 신설 추진 TF팀 운영																
조직개편 용역 추진																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자 ㉠	임 기 내					장기 ㉣	
	㉠+㉢+㉣		소계 ㉢	2022	2023	2024	2025		2026
계	33	-	33	33	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	33	-	33	33	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
재건축·재개발 추진 전담부서 신설	개소	목표	1	-	1	-	-	-	100
		실적	1	-	1				

■ 추진실적

- 2022. 7. 11. ~ 12. 31. : 전담부서 신설 추진 TF팀(조직개편TF) 운영
- 2022. 8. 1. ~ 12. 20. : 조직개편 용역 추진
- 2023. 1. ~ : 재건축재개발과 신설 및 운영

52

청년정책 전담부서 신설

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
완료	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●	●			●			●
주관부서	행정지원과장 박종우 ☎2091-2100 인사팀장 강기탁 ☎2111 담당 박윤식 ☎2112													

현황

- 청년 취업·창업 등 청년정책 사업의 속도감 있는 추진을 위해 청년정책 지원과 전담부서 신설 필요

사업목표

- 민선8기 주요 공약사업인 청년정책 사업의 체계적 지원과 주도적 추진을 위하여 전담부서 신설
 - 청년지원 TF팀 구성(2022. 8. 1.): 청년 취업·창업 등 청년정책 지원

사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. 1. ~ 12. 31.
- 사업대상 : 청년 취업·창업 등 청년정책 분야
- 사업내용 : 청년정책 추진 전담부서 신설(2023. 1. 1.)

※ 청년지원 TF 추진사항

- 공공기관 실무형 청년 인턴십 운영(공약사업)
 - 직무조사 등 부서 협의, 기본계획 수립
- 도봉구 청년 해외 인턴십 지원사업(공약사업)
 - 현황조사 및 벤치마킹, 기본계획 수립
- 서울 캠퍼스타운 조성 사업 운영
- 구 발주사업 지역인재 청년 인턴 채용 운영(공약사업)
 - 발주사업 조사 등 현황조사, 기본계획 수립
 - 청년 지역인재DB 구축
- 청년 창업교육 및 아이디어 경진대회
- 총사업비 : 33백만원(조직개편 용역비)

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
전담부서 신설 추진 TF팀 운영																
조직개편 용역 추진																

■ 소요예산

※ 51번 공약(재건축·재개발 지원을 위한 전담부서 신설) 예산 활용하여 동시 추진

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
청년정책 추진 전담부서 신설	개소	목표	1	-	1	-	-	-	100
		실적	1	-	1				

■ 추진실적

- 2022. 7. 11. ~ 12. 31. : 전담부서 신설 추진 TF팀(조직개편TF) 운영
- 2022. 8. 1. ~ 12. 20. : 조직개편 용역 추진
- 2023. 1. ~ : 청년미래과 신설 및 운영

53

구 산하기관 유사기능 통·폐합

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중양도움	
이행후 계속추진	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
	●		●				●	●			●			●
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 문화정책팀장 김연수 ☎2251 담당 김미정 ☎2253													

현황

- 도봉문화재단, 도봉문화원, 문화예술지원센터 등 각 기관에 나누어져 있는 유사기능 및 중복사업 통·폐합 필요

사업목표

- 유사기능 및 중복사업 통·폐합을 통하여 업무일관성 및 효율성 제고, 예산절감 효과 기대

사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 4.
- 사업대상 : 도봉문화재단, 문화예술지원센터, 도봉문화원
- 사업내용 : 각 문화기관(도봉문화재단, 문화예술지원센터, 도봉문화원) 조직진단 용역추진 통해 유사기능 통·폐합 실시
- 총사업비 : 22,000천원
- 추진내역
 - 2022. 8. : 도봉구 산하기관 조직진단 연구용역 발주
 - 2022. 9. : 산하기관 유사기능 통·폐합 회의 개최(3회)
 - 2022.10. : 조직진단 연구용역 계약 해제
 - 2022.11. : 도봉구 산하기관 조직진단 연구용역 재발주
 - 2022.12. : 구 산하기관 유사기능 통·폐합 추진계획 수립(우선 추진계획)
 - 2023. 1. : 우선 추진계획에 따른 통·폐합 실시

업무 명	변경 전	변경 후
문화공간 가치 운영	문화예술지원센터	도봉문화재단
마을극장 흰고무신 운영		
청소년 예술극장 채움 운영		
지역예술인 발굴, 협력 예술단체 운영		
도봉산페스티벌	도봉문화재단	도봉구(문화체육과)
구민청 운영		도봉구(행정지원과)
문화예술 콘텐츠 및 캐릭터 개발	문화예술지원센터	폐지
부서·동 축제 행사 음향장비 지원		

- 2023. 1. : 행정안전부 주관 「지방공공기관 혁신 보고대회」
우수 자치단체 수상, 특별교부세 10억 확보
- 2023. 1. : 도봉구 산하기관 조직진단 연구용역 중간보고회
- 2023. 4. : 도봉구 산하기관 조직진단 연구용역 준공 및 최종보고회

□ 용역결과(기관간 기능 배분 방향)	
기관명	역할
도봉구청	-문화정책 수립 -재단 사업의 추진실태, 성과 효과성 등의 점검 -재단 및 문화원에 대한 기능 배분을 중재
도봉문화재단	-구청의 문화정책 지원 -문화예술 사업 실무 추진
도봉문화원	-지역(향토)축제 및 행사 -지역민 대상 콘텐츠 개발 및 운영

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
조직진단 연구용역 추진 및 통·폐합																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	22	-	22	22	-	-	-	-	
국비	-		-	-	-	-	-	-	
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	
구비	22	-	22	22	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
유사기능 통·폐합 추진율	%	목표	100	50	80	85	90	100	80
		실적	50	50	80	85	-	-	

■ 향후 계획

- 향후 통·폐합 사안 발생시, 업무조정 및 추가조정 실시
