

# 16

## 동북권 시민안전체험관 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진		●		●		●				●	●			●
주관부서	재난안전과장 박득원 ☎ 2091-4250 생활안전팀장 조창민 ☎ 4281 담당 강태훈 ☎ 4282													

### 현황

- 공유재산관리계획 수립 후 타당성 조사 용역(건설기술진흥법) 완료('21.12.)
- 도입시설 재검토(신규 도입시설 발굴)를 통한 사업계획 변경
- 신규 도입시설에 대한 사전 행정절차 등 이행

### 사업목표

- 시민안전체험관을 건립하여 시민 안전의식 제고 및 학생들에게 체험학습 기회 제공
  - 다양한 재난·재해에 대해 시민들의 대응 요령을 학습할 수 있는 종합안전체험관을 건립하여 유사시 시민의 재난 대처 능력 향상

### 사업개요

- 사업기간 : 2017. 7. ~ 2028. 12.
- 사업위치 : 도봉구 방학동 708 (소방학교 이전부지 내)
- 건립규모 : 연면적 9,900㎡ (지하2층/ 지상5층)
- 총사업비 : 74,336백만원

구분	층수	연면적	용도	소관부서
소방체험시설	지하2/지상5	9,900㎡	소방안전체험관	서울시 소방재난본부
		2,400㎡	통합정비센터	

### 추진일정

세부 추진사항	2023				2024				2025				2026~27				2028			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공유재산 재심의, 공유재산 관리계획 수립	■																			
설계공모, 기본·실시설계					■															
기본·실시설계, 중앙투자심사, 인허가									■											
공사발주 및 착공, 공사진행													■							
준공 및 개관																	■			

## ■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내			임 기 후		장기 ④	
			소계 ②	2024	2025	2026	2027		2028
계	146,571	-	146,571	5,507	6,515	39,678	39,678	55,193	-
국비	11,500	-	11,500	-	-	3,500	3,500	4,500	-
시비	116,666	-	116,666	5,507	6,515	30,043	30,043	44,558	-
구비	18,405	-	18,405	-	-	6,135	6,135	6,135	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	이행률 (%)
시민안전체험관 조성	추진율 (%)	목표	100	10	30	40	50	70	90	100	30
		실적	30	10	30						


## ■ 추진실적

- 2020. 6. 공유재산관리계획 수립(원안의결)
- 2021. 11. 타당성조사용역 최종보고 및 자문회의(변경계획(안) 수립)
- 2022. 1. 소방재난본부(안전지원과) 협의(사업추진관련 의견조회)
- 2023. 7. 조성사업 변경 추진계획(행정2부시장 방침)
- 2023. 7. 공유재산 심의회(변경안) 통과
- 2023. 9. 공유재산관리계획(변경안) 수립

## ■ 향후 계획

- '24. 설계공모, 기본·실시설계(설계공모 6개월)
- '25. 기본·실시설계, 중앙투자심사, 인허가(기본·실시설계 18개월)
- '26. 공사발주 및 착공(공기 36개월)
- '28. 준공 및 개관

□ 위치도(안)

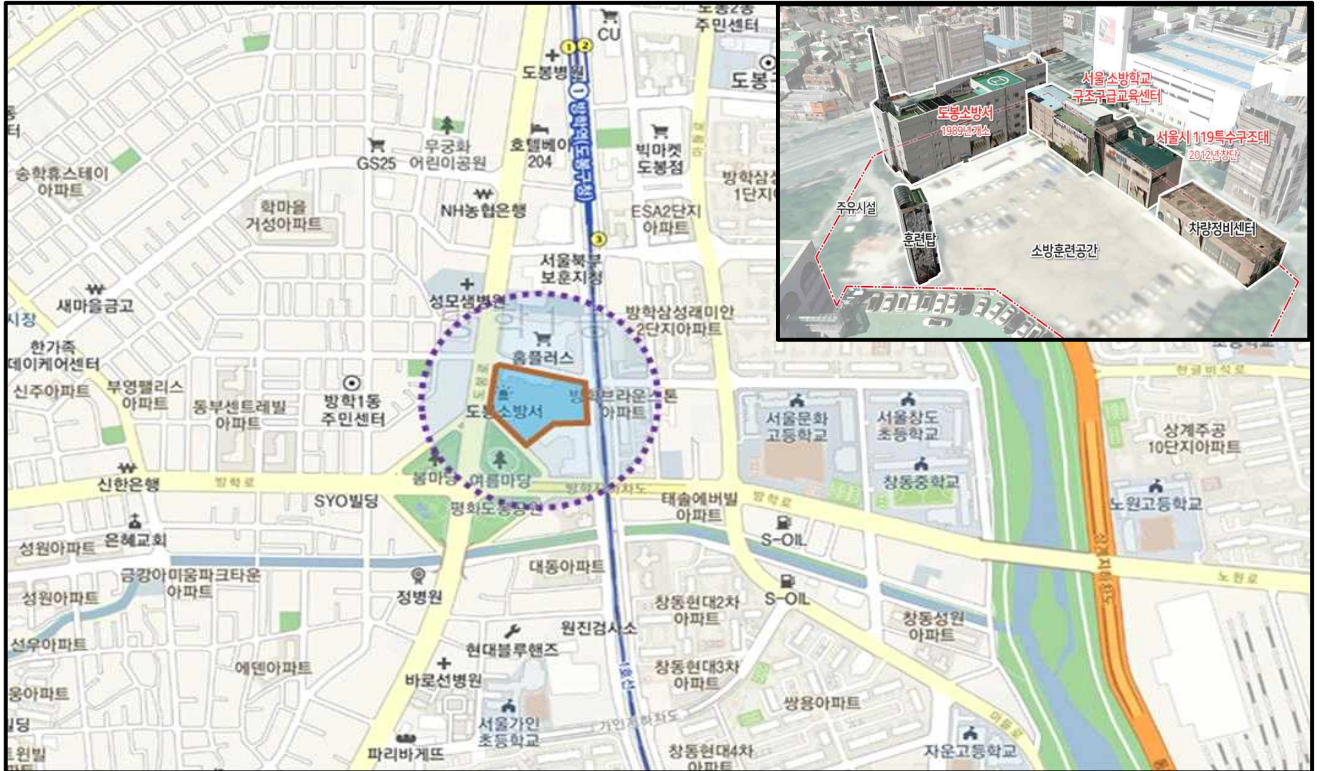

□ 조감도(안)

